

# **REPORT**

## **UFFICIO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI TECNICI E SERVIZI CONNESSI**

**dati al 30/04/2026**

# Indice

## **Sezione 1 – L’organizzazione dell’Ufficio Appalti di lavori, servizi tecnici e servizi connessi**

## **Sezione 2 – Convenzioni**

## **Sezione 3 – Stato di attuazione degli interventi e procedure delegate**

3.1 U.S.R.C. delegato nel ruolo di Soggetto Attuatore

3.2 U.S.R.C. delegato nel ruolo di ente preposto alla selezione del contraente

3.3 Focus - Rocca Calascio luce d’Abruzzo – Convenzione Comune di Calascio – U.S.R.C.

## **Sezione 4 – Conferimento di incarichi**

4.1 Gli incarichi di R.U.P./RdP e Supporti

4.2 Altri incarichi

## **Sezione 5 – Albo Fornitori U.S.R.C.**

## **Sezione 6 – B.I.M. – Stato di attuazione della transizione digitale dei processi**

## **Sezione 1: L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI TECNICI E SERVIZI CONNESSI**

In materia di appalti pubblici, **dall'estate 2021, l'USRC può esercitare il ruolo di soggetto attuatore**, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con Determinazione n. 1104 del 10/07/2025 si è proceduto all'istituzione dell'**Ufficio Appalti Lavori e Delegati (U.A.D.)** ed alla nomina dei dipendenti ad esso assegnati.

L'assetto organizzativo dell'U.S.R.C. è stato ridefinito poi con il **PIAO 2026 – 2028** (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) approvato con Determina n.116/2026 andando a modificare l'Ufficio Appalti Delegati (U.A.D.) nell'**Ufficio Appalti di lavori, servizi tecnici e servizi connessi**, con lo scopo di definire una più efficiente organizzazione deputata esclusivamente alla gestione degli appalti di lavori e servizi connessi e della consistente attività tecnico amministrativa ad essa correlata.

Il funzionigramma dell'U.S.R.C. descrive in forma sintetica le attività dei dipendenti e le ulteriori assegnazioni di personale all'Ufficio Appalti resesi necessarie a seguito del notevole incremento delle deleghe effettuate in favore dell'Ufficio.

### **USRC STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ANAC**

L'Art. 62 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 prevede il **ricorso alla Stazione Appaltante qualificata** o alla centrale di committenza qualificata. L'U.S.R.C. nel 2024 ha ottenuto la **QUALIFICAZIONE ANAC** ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs.36/2023.

Nel **2025** U.S.R.C. ha effettuato l'**aggiornamento della QUALIFICAZIONE ANAC** ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs.36/2023 ottenuta nel 2024, come previsto dalla norma, ottenendo le seguenti:


- **L1 per appalti lavori:** possibilità di effettuare procedure di affidamento lavori senza limiti di importo
- **SF3 per appalti servizi:** possibilità di effettuare procedure di affidamento servizi e forniture fino a 750.000 €

## Sezione 2 – CONVENZIONI


Al fine di dare supporto alle Amministrazioni titolari dei finanziamenti per interventi pubblici, dal 2022 l'U.S.R.C. procede alla sottoscrizione di Convenzioni ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 che stabilisce che “*le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune .....*”.

**al 30/04/2026 sono 20 le CONVENZIONI ATTIVE**

relative a interventi e procedure di gara **in corso d'attuazione**

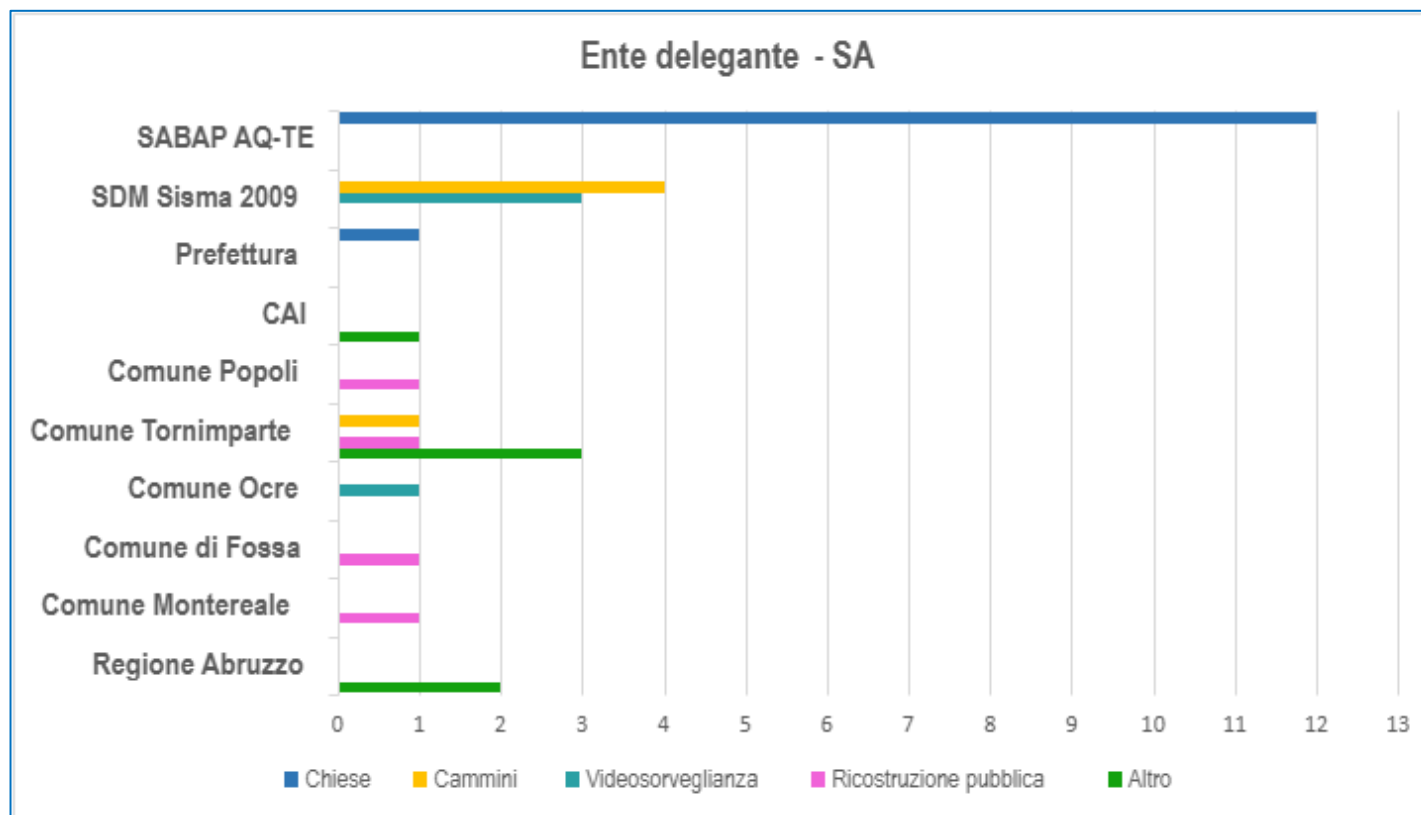

**Figura 1:** Convenzioni di delega a USRC come S.A. con dettaglio delle Amministrazioni deleganti, numero e tipologia di interventi

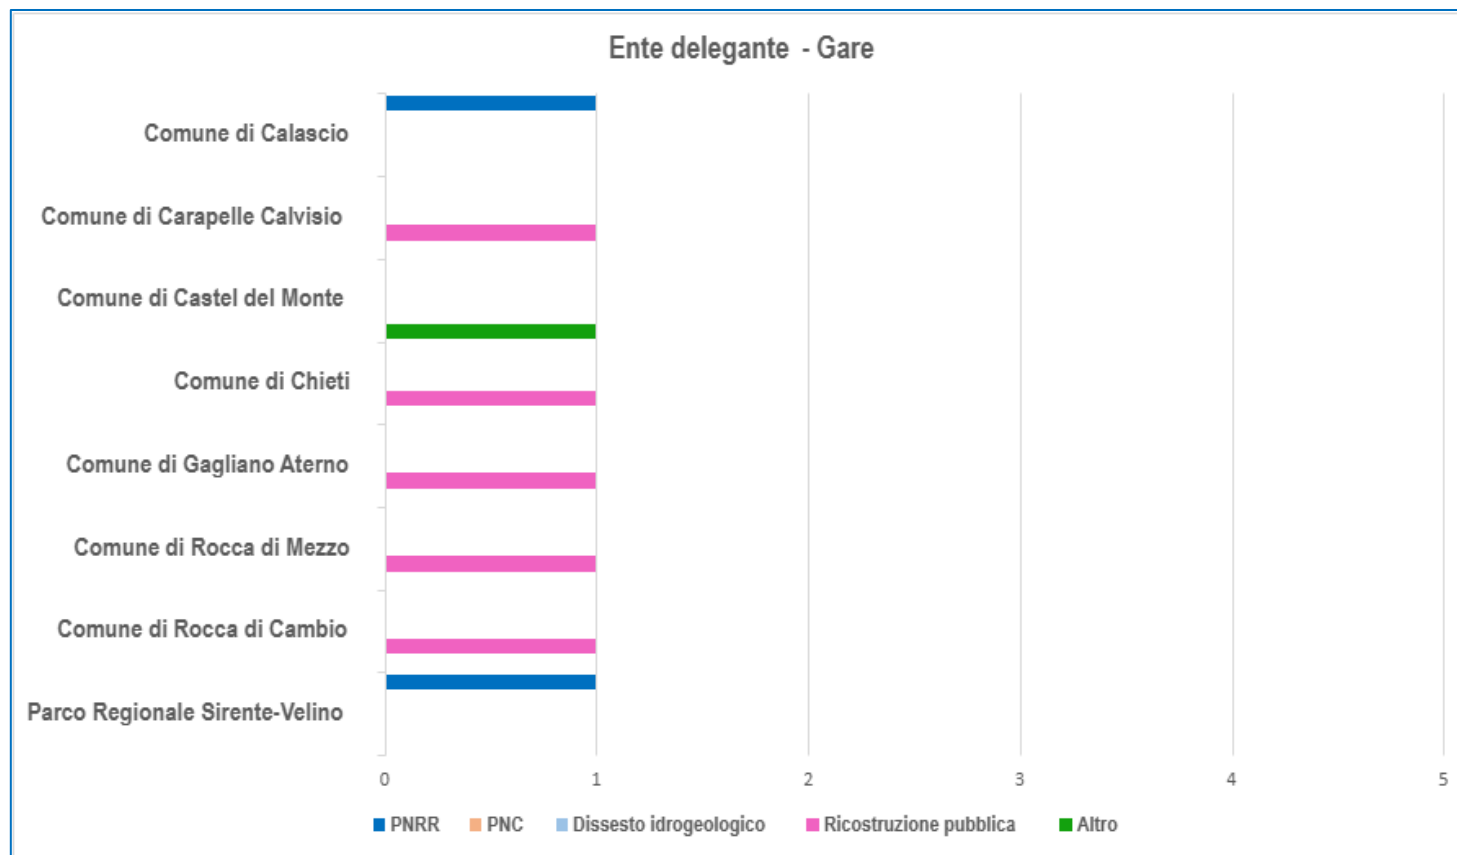

*Figura 2: Convenzioni di delega a USRC per gestione GARE con dettaglio delle Amministrazioni deleganti, numero e tipologia di interventi*

## Sezione 3 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROCEDURE DELEGATI

### 3.1 U.S.R.C. DELEGATO NEL RUOLO DI SOGGETTO ATTUATORE


al **30/04/2026** sono complessivamente delegati ad U.S.R.C.

**30 INTERVENTI per 45,23 Mln €**

**tutti in corso di attuazione**

di cui: **13** Chiese, **4** Videosorveglianza, **5** Cammini, **4** Ricostruzione Pubblica, **4** Altro

Oltre questi si segnala l'intervento di restauro della Chiesa Santa Maria in Panthanis nel Comune di Montereale, per cui le attività delegate finanziate con CIPESS 52/2021 relative alla progettazione sono state completate in data 20/08/2024. Le attività relative al nuovo finanziamento stanziato a gennaio 2026, ed ancora in fase di pubblicazione attraverso la relativa delibera CIPESS, saranno formalmente prese in carico dall'U.S.R.C. a seguito di sottoscrizione della nuova convenzione in corso di finalizzazione.

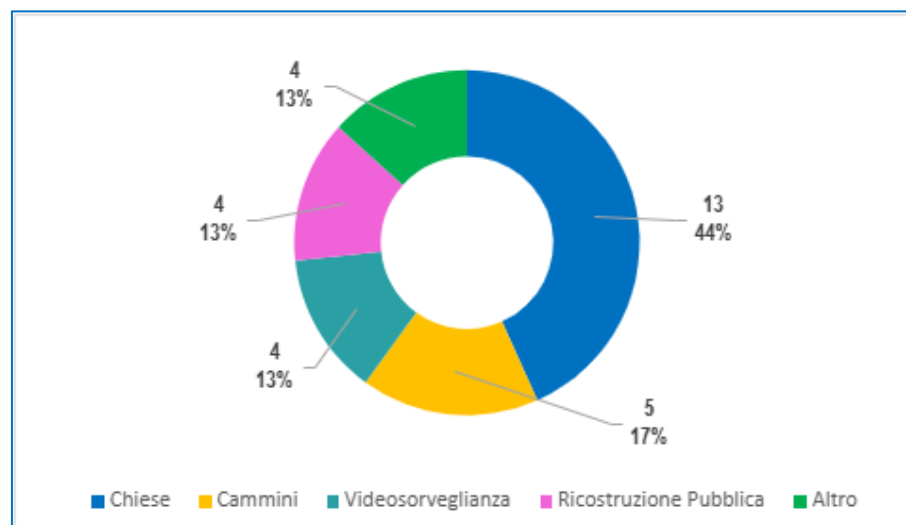

*Figura 3: Interventi in gestione come Soggetto Attuatore con percentuale di dettaglio delle tipologie*


INTERVENTO	IMPORTO	COMUNE	RUP	ATTIVITA' CONCLUSA	ENTE DELEGANTE	ATTIVITA' IN CORSO
CHIESA MADONNA DEI RACCOMANDATI	6.200.000,00 €	SAN DEMETRIO NV	CALOCERO	1. PROGRAMMAZIONE	SABAP AQ-TE	Procedura di gara aperta per affidamento servizi tecnici
BIVACCHI CAI	600.000,00 €	COMUNI VARI	BIANCHI	1. PROGRAMMAZIONE	Club Alpino Italiano	In attesa di documentazione dal Delegante per affidamento progettazione
CHIESA S. FLAVIANO	2.000.000,00 €	BARISCIANO	SABABA	3. PFTE/PROVE/INDAGINI	SABAP AQ-TE	Predisposizione documentazione per attivazione conferenza dei servizi permanente su PE
RIPARAZIONE SEDE MUNICIPALE E CHIESA BEATO ANDREA	3.520.427,00 €	MONTEREALE	FERRINI	2. DIP/DOCFAP	Comune di Montereale	Esecuzione indagini GeoStru
CHIESA S. GIORGIO	1.500.000,00 €	TIONE DEGLI ABRUZZI	DI CRISTOFARO	5. ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO LAVORI	Prefettura	Lavori in corso
VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA A08	830.000,00 €	COMUNI VARI	FICO	7. INIZIO LAVORI	Comune di Ocre	Lavori in corso
VDS - LOTTO 3	2.000.000,00 €	COMUNI VARI	BIANCHI	7. INIZIO LAVORI	SDM 2009	Lavori in corso
VDS - LOTTO 2	2.000.000,00 €	COMUNI VARI	BIANCHI	7. INIZIO LAVORI	SDM 2009	Lavori in corso
VDS - LOTTO 1	2.000.000,00 €	COMUNI VARI	BIANCHI	8. AVANZAMENTO LAVORI 50%	SDM 2009	Lavori in corso
CAMMINO DEI FRANCESCANI	400.000,00 €	COMUNI VARI	COLABIANCHI	7. INIZIO LAVORI	SDM 2009	Lavori in corso
CAMMINO DEI VESTINI	400.000,00 €	COMUNI VARI	SCARIZZA	8. AVANZAMENTO LAVORI 50%	SDM 2009	Lavori in corso
CAMMINO DI CELESTINO	1.000.000,00 €	COMUNI VARI	FERRINI	7. INIZIO LAVORI	SDM 2009	Lavori in corso
CAMMINO DELLA BARONIA	400.000,00 €	COMUNI VARI	CALOCERO	8. AVANZAMENTO LAVORI 50%	SDM 2009	Lavori in corso
CHIESA S. MARTINO	800.000,00 €	OCRE	CALOCERO	2. DIP/DOCFAP	SABAP AQ-TE	In approvazione PFTE
CHIESA S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	600.000,00 €	BARISCIANO	CALOCERO	1. PROGRAMMAZIONE	SABAP AQ-TE	Redazione PFTE e piano indagini
CHIESA S. M. DELLE GRAZIE	700.000,00 €	COLLARMELE	COLABIANCHI	5. ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO LAVORI	SABAP AQ-TE	Lavori in corso
POLO SCOLASTICO	3.220.000,00 €	TORNIMPARTE	DI CRISTOFARO	2. DIP/DOCFAP	Comune di Tornimparte	In corso predisposizione atti di gara per affidamento progettazione
EX CONVENTO S. DOMENICO	6.420.957,00 €	POPOLI	PROSPERINI	2. DIP/DOCFAP	Comune di Popoli	In corso contrattualizzazione progettisti aggiudicatari della procedura aperta
CHIESA S. M. ARCANGELO	1.200.000,00 €	CITTA' S. ANGELO	PROSPERINI	3. PFTE/PROVE/INDAGINI	SABAP AQ-TE	Affidamento del piano indagini
CHIESA S. LORENZO DI BEFFI	1.500.000,00 €	ACCIANO	DI NATALE	2. DIP/DOCFAP	SABAP AQ-TE	Contrattualizzazione professionisti aggiudicatari della procedura aperta
CHIESA S. FRANCESCO	3.000.000,00 €	CHIETI	FERRINI	7. INIZIO LAVORI	SABAP AQ-TE	Installazione ponteggi interni ed esterni
CHIESA DI S. GIOVANNI AD INSULAM	1.000.000,00 €	ISOLA DEL GRAN SASSO	PROSPERINI	2. DIP/DOCFAP	SABAP AQ-TE	Esecuzione piano indagini
CHIESA S. SALVATORE	1.393.868,16 €	NAVELLI	CALOCERO	4. PROGETTO ESECUTIVO	SABAP AQ-TE	Adempimenti preliminari all'inizio lavori
CHIESA S. ANTONIO	300.000,00 €	NOCCIANO	MARTINELLI	4. PROGETTO ESECUTIVO	SABAP AQ-TE	Procedura di gara affidamento lavori (soccorso istruttorio)
CHIESA S. MARIA DI VALLEVERDE	130.000,00 €	BARISCIANO	CALOCERO	1. PROGRAMMAZIONE	SABAP AQ-TE	Affidato PFTE, problematiche su messa in sicurezza
PIT N.2 - OP 1 "IL CAMMINO DEI NORMANNI"	729.184,77 €	COMUNI VARI	DI CRISTOFARO	1. PROGRAMMAZIONE	Comune di Tornimparte	Programmazione dell'intervento e redazione DIP
PIT N.2 - OP 2 "LA MONTAGNA VIVA" - PISTE CICLABILI	922.495,01 €	COMUNI VARI	DI CRISTOFARO	1. PROGRAMMAZIONE	Comune di Tornimparte	Programmazione dell'intervento e redazione DIP
PIT N.2 - OP 2 "LA MONTAGNA VIVA" - SITO ARCHEOLOGICO	182.362,02 €	COMUNI VARI	DI CRISTOFARO	1. PROGRAMMAZIONE	Comune di Tornimparte	Programmazione dell'intervento e redazione DIP
PIT n.2 - OP 2 "LA MONTAGNA VIVA" - AREA CAMPER	40.154,83 €	COMUNI VARI	DI CRISTOFARO	1. PROGRAMMAZIONE	Comune di Tornimparte	Programmazione dell'intervento e redazione DIP
OPERE DI DIFESA DA CROLLI ROCCIOSI DAL MONTE CIRCOLO	238.862,10 €	FOSSA	CALOCERO	3. PFTE/PROVE/INDAGINI	Comune di Fossa	In affidamento servizio di aggiornamento PFTE

**Legenda Step di Avanzamento – attività concluse:** 1. Programmazione - 2. DIP/DOCFAP - 3. PFTE/Prove/Indagini - 4. Progetto Esecutivo - 5. Espletamento Gara Affidamento Lavori - 6. Controlli - Aggiudicazione Lavori - 7. Inizio Lavori - 8. Avanzamento Lavori 50% - 9. Fine Lavori - 10. Collaudo - 11. Procedimento Concluso

### 3.2 U.S.R.C. DELEGATO NEL RUOLO DI ENTE PREPOSTO ALLA SELEZIONE DEL CONTRAENTE

al **30/04/2026** sono **9** le **PROCEDURE in CORSO** per **14,70 Mln €**

di cui: **2** PNRR, **5** Ricostruzione Pubblica, **2** Altro

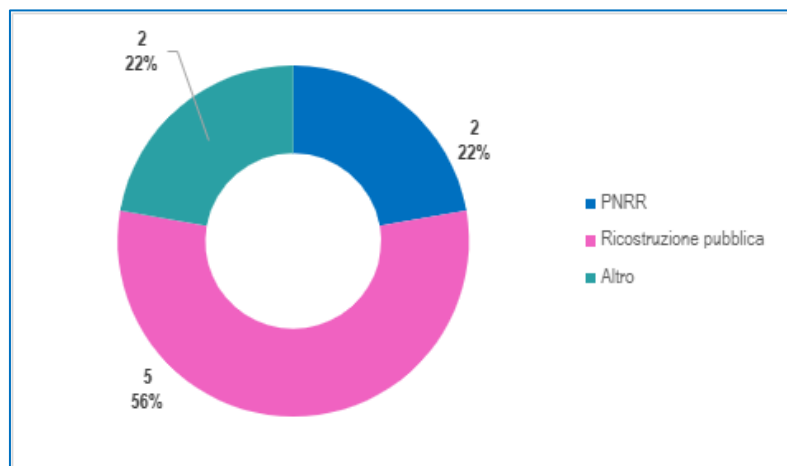

*Figura 4: Interventi delegati a U.S.R.C. con percentuale di dettaglio delle tipologie*

INTERVENTO	IMPORTO	COMUNE/ENTE DELEGANTE	RUP	ATTIVITA' CONCLUSA	ATTIVITA' IN CORSO
Affidamento progettazione per ristrutturazione e messa in sicurezza ex Convento di Santa Chiara	653.672,41 €	Comune di Gagliano Aterno	CALOCERO LORENZA	3. Approvazione atti di gara	In corso valutazione tecnica da parte della commissione di gara
Miglioramento sismico Palazzo d'Achille	5.300.000,00 €	Comune di Chieti	DA NOMINARE	1. Convenzione - Nomina GDL	In attesa di documentazione da parte del Comune
Realizzazione Polo Scolastico Italo D'eramo	400.000,00 €	Comune di Rocca di Mezzo	DI NATALE ANTONELLA	1. Convenzione - Nomina GDL	In fase di redazione atti di gara
Pista ciclabile naturale del Gran Sasso	1.209.353,76 €	Comune di Calascio	CALOCERO LORENZA	3. Approvazione atti di gara	Controlli in corso
Intervento su reti e sottoservizi	849.340,79 €	Comune di Calascio	DI NATALE ANTONELLA	1. Convenzione - Nomina GDL	In attesa di documentazione da parte del Comune per espletamento gara
Progetto ICE PARK - "Interaction and Experiential Culture in the Park"	936.000,00 €	Comune di Fossa	CALOCERO LORENZA	4. Espletamento gara	Controlli in corso
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione della Sede Comunale	2.164.888,00 €	Comune di Rocca di Mezzo	CICIONI MAURIZIO	1. Convenzione - Nomina GDL	In attesa di documentazione da parte del Comune per espletamento gara
Opere di regimazione idraulica e mitigazione rischio idrogeologico località Santa Maria	572.250,00 €	Comune di Chieti	CALOCERO LORENZA	1. Convenzione - Nomina GDL	In attesa di documentazione da parte del Comune per espletamento gara

**Legenda Step di Avanzamento – attività concluse:** 1. Convenzione - Nomina GDL - 2. Trasmissione documentazione dal delegante - 3. Approvazione atti di gara - 4. Espletamento gara - 5. Controlli - 6. Procedimento concluso

### **3.3 FOCUS – “ROCCA CALASCIO LUCE D’ABRUZZO” CONVENZIONE COMUNE DI CALASCIO – U.S.R.C.**

Tra le procedure di gara delegate ad U.S.R.C. si evidenzia l’attività svolta in attuazione della Convenzione sottoscritta a Marzo 2025 tra il Comune di Calascio (AQ) e l’U.S.R.C. per la delega, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 e dell’art. 54 co. 2 bis del decreto-legge 77/2021 convertito in legge 108 del 29/07/2021, delle procedure di gara relative agli interventi afferenti al progetto “Rocca Calascio luce d’Abruzzo PNRR” Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 - Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale - Intervento 2.1 Attrattività dei borghi - Linea di azione A.

La delega ad U.S.R.C. ha avuto origine dalla necessità di accelerare le procedure di realizzazione degli interventi finanziati, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle tempistiche dettate dalle milestones PNRR.

Sono complessivamente



**29 le procedure di affidamento lavori, servizi e servizi di ingegneria e architettura delegate ad U.S.R.C.**

per circa **11,6 Mln €**

**tutte completate al 30/04/2026**

di cui:

- 9 affidamenti di servizi per 1,15 Mln€
- 6 affidamenti di servizi di ing. e arch. per 0,50 Mln€
- 14 procedure di affidamento lavori per 10 Mln€ (tra cui 11 procedure negoziate e 3 affidamenti diretti)


## Sezione 4 – CONFERIMENTO DI INCARICHI

### 4.1 GLI INCARICHI DI R.U.P./RdP e SUPPORTI


A seguito della sottoscrizione di ciascuna Convenzione l'Ufficio procede alla Nomina del R.U.P./RdP e relativi Gruppi di Lavoro (Supporti al R.U.P./RdP) selezionando dipendenti U.S.R.C. in possesso di idonei requisiti, con priorità tra quelli assegnati all'Ufficio Appalti di lavori, servizi tecnici e servizi connessi o che abbiano manifestato la volontà di svolgere tale ruolo attraverso l'apposita Manifestazione di Interesse svolta nel 2023.

Al **30/04/2026** per interventi gestiti come **SOGGETTO ATTUATORE** in corso di attuazione sono nominati:

- ❖ **11 R.U.P. U.S.R.C.** di cui 6 esterni all' Ufficio Appalti
- ❖ **26 Supporti al R.U.P. U.S.R.C.**, di cui 19 esterni all' Uffici Appalti




*Figura 5: RUP e numero di incarichi. In celeste i RUP esterni all'Ufficio Appalti*




*Figura 6: Supporti al RUP e numero di incarichi. In celeste i Supporti al RUP esterni all' Ufficio Appalti*

al **30/04/2026** per **PROCEDURE DELEGATE in corso di attuazione** sono nominati:

- ❖ **3 RdP** di cui 1 esterno all' Ufficio Appalti
- ❖ **10 Supporti al RdP** di cui 4 esterni all' Ufficio Appalti

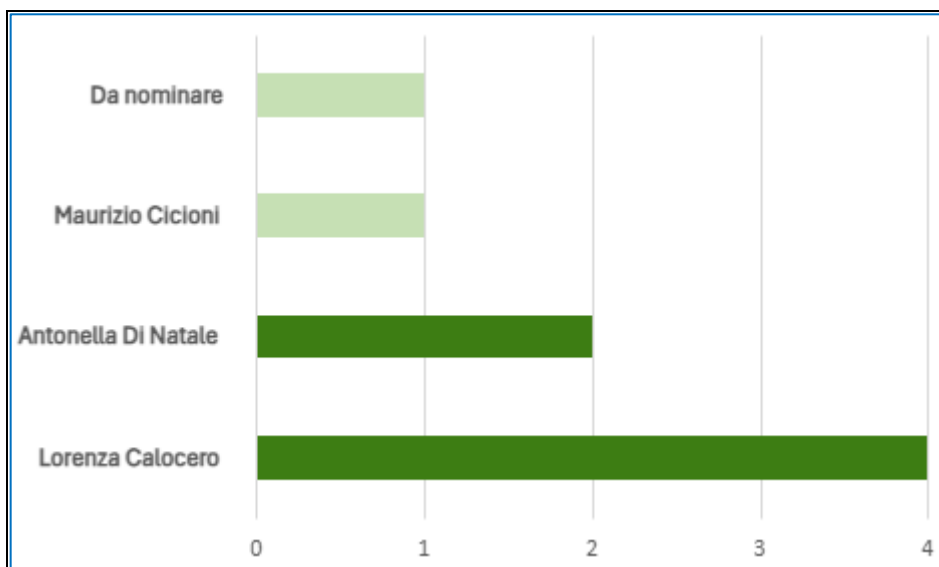

*Figura 7: RdP di procedure in corso e numero di incarichi. In verde chiaro i RdP esterni all' Ufficio Appalti*



*Figura 8: Supporti al RdP per interventi in corso e numero di incarichi. In verde chiaro i RdP esterni all' Ufficio Appalti*

## **4.2 ALTRI INCARICHI**

### **Direzione Lavori**

Al fine di reperire figure professionali per il conferimento di incarichi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito degli interventi gestiti dall'U.S.R.C. con il ruolo di Soggetto Attuatore, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs.36/23, l' Ufficio Appalti di lavori, servizi tecnici e servizi connessi procede alla pubblicazione di appositi "Avvisi di interpellati interni riservati ai dipendenti in servizio presso l'U.S.R.C. per il conferimento di incarichi nell'ambito degli appalti pubblici" e altrettante "Manifestazione di interesse indirizzata a funzionari di amministrazioni pubbliche per il conferimento di incarichi nell'ambito degli appalti pubblici".

**In esito ai suddetti procedimenti a Settembre 2025 è stato perfezionato il primo conferimento di incarico di Direzione Lavori ad un dipendente dell'U.S.R.C.**

### **Verifica dei progetti**

Per ottemperare a quanto previsto all'art. 18 dell'All. II.18 del Codice dei Contratti "[...] per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la S.A. provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi [...] nei casi di interventi su beni culturali immobili [...] di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento [...]" e di valorizzare la professionalità dei dipendenti U.S.R.C., a Settembre 2023 e poi a Settembre 2025 si è proceduto **a incaricare un funzionario U.S.R.C. con qualifica di Architetto per l'incarico di Verifica della progettazione Esecutiva** relativa ad interventi su Immobili ecclesiastici sottoposti a vincolo delegati a U.S.R.C. come S.A.

## Sezione 5 - ALBO FORNITORI U.S.R.C.

L'Ufficio Appalti di lavori, servizi tecnici e servizi connessi, in attuazione di quanto previsto dall'apposito "Regolamento per la formazione e la gestione dell'albo fornitori telematico per l'affidamento di contratti pubblici sotto soglia o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" si occupa della gestione e aggiornamento dell'Albo Fornitori della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD) denominata "Tutto Gare".

L'Albo Fornitori è articolato in 5 sezioni che rispecchiano le principali esigenze di approvvigionamento dell'U.S.R.C. e in conformità al funzionamento e all'uso della piattaforma stessa:



- I. ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI
- II. FORNITORI DI BENI E SERVIZI
- III. TECNICI PROGETTISTI E ASSIMILATI (Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Agronomi, Periti)
- IV. RESTAURATORI DI BENI CULTURALI
- V. ARCHEOLOGI

Il personale dell'Ufficio Appalti di lavori, servizi tecnici e servizi connessi si occupa della gestione delle iscrizioni di nuovi operatori economici e della verifica del possesso dei requisiti generali di quelli già ammessi, utili ai fini della permanenza nell'Albo.

Si riporta di seguito lo stato delle iscrizioni all'Albo al 30/04/2026:

ALBO FORNITORI U.S.R.C.	Partecipanti	Ammessi	Respinti	In lavorazione
ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI	429	370	31	28
FORNITORI DI BENI E SERVIZI	107	61	43	3
TECNICI PROGETTISTI E ASSIMILATI	229	205	23	1
ARCHEOLOGI	7	7	0	0
RESTAURATORI DI BENI CULTURALI	15	12	3	0

È attualmente in corso la **revisione delle procedure** di gestione e implementazione dell'Albo Fornitori, unitamente al **perfezionamento delle modalità di iscrizione all'Albo USRC**. Tali interventi sono volti a snellire i processi e a renderli maggiormente rispondenti alle esigenze operative dell'Ufficio nella gestione delle procedure di selezione dei contraenti.

## Sezione 6: B.I.M. – Stato di attuazione della transizione digitale dei processi

L'Ufficio, in attuazione delle disposizioni dell'Allegato I.9 al D.Lgs. 36/2023, integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024, in materia di obbligo di applicazione dei **metodi e strumenti di gestione informativa digitale**, ha avviato un percorso strutturato di transizione digitale dei processi applicando **le misure, modalità di introduzione e gli adempimenti preliminari a carico delle S.A.**

In coerenza con il quadro normativo vigente, le attività poste in essere si articolano nei seguenti ambiti principali:

### 1. Piano di formazione specifica del personale:

L'USRC nel 2024 e 2025 ha dato avvio a **programmi di formazione e aggiornamento del personale interno**, mirati a sviluppare le competenze richieste per le P.A., nonché ad acquisire le **certificazioni professionali di “Esperto BIM – UNI 11337 7 / PdR 78:2020”** da parte di n. 7 dipendenti dell'USRC, nello specifico di n. 3 **BIM Manager**, n. 2 **BIM Coordinator** e n. 2 **CDE Manager**.

### 2. Strumenti hardware e software:

È stato definito un piano per l'acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti necessari all'adozione del BIM. A seguito di un'analisi delle soluzioni offerte dal mercato, l'USRC ha individuato un **Ambiente di Condivisione dei Dati** conforme alla normativa e alle esigenze dell'Ufficio, attualmente in fase di acquisizione e messa in esercizio, nel rispetto dei principi di **concorrenza e interoperabilità**.

### 3. Atto Organizzativo interno:

L'introduzione dei processi di digitalizzazione comporta una **trasformazione organizzativa e procedurale** dell'Ente, con effetti trasversali sui flussi decisionali e operativi. In tale contesto, al termine della prima fase di formazione, l'USRC ha approvato con **Determinazione n. 329 del 10/03/2026** l'Atto Organizzativo “**OIR – Organizational Information Requirements**”, quale riferimento interno per la gestione dei requisiti informativi e l'adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale lungo l'intero ciclo di vita delle opere.

L'Ufficio è attualmente impegnato nella **redazione degli atti di gara BIM** per la pubblicazione delle prossime procedure di selezione del contraente con l'applicazione della metodologia BIM:

- Polo Scolastico Italo D'Eramo - Rocca di Mezzo: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ing. e arch. per redazione PFTE con applicazione BIM;
- Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico A. Gigante G. Porto - Tornimparte: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ing. e arch. per redazione PFTE e Prog. Esecutiva con applicazione BIM;
- Opere di difesa da crolli rocciosi del Monte Circolo – Fossa: Affidamento diretto servizi di ing. e arch. per aggiornamento PFTE con applicazione BIM;
- Opere di regimazione idraulica e mitigazione rischio idrogeologico località S. Maria - Chieti: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ing. e arch. per redazione PFTE e Prog. Esecutiva con applicazione BIM.

