



GIORNATA DI STUDIO SULLA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N.8

Fossa (AQ), Villaggio San Lorenzo, Sala polivalente,
10 dicembre 2019

Ing. Raffaello Fico

Titolare USRC – Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

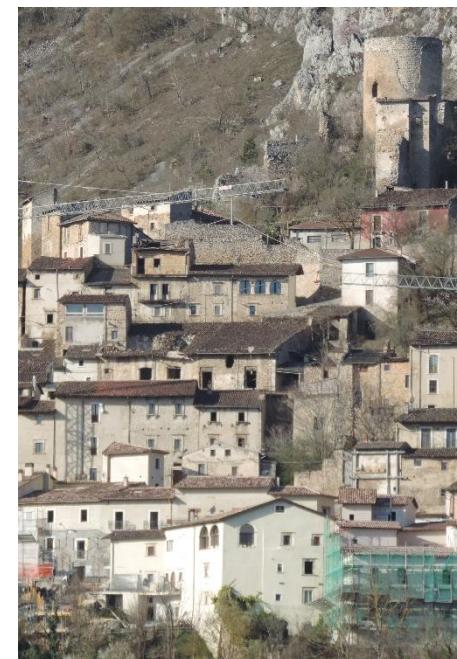

Fuori cratere: **121** Comuni Province: **4** Km2: **7.400**
 Cratere: **56** Comuni Popolazione: **80.000** (Cratere)

USRC – Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

L'USRC nell'ambito dei processi di ricostruzione, sia pubblica e privata, effettua il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi.


Nello specifico, le competenze di USRC riguardano:

- Piani di Ricostruzione
- Ricostruzione Privata
- Ricostruzione Pubblica
- Edilizia scolastica
- Contabilità
- Rimozione macerie
- Espropri
- Gestione fondi Privata
- Sviluppo

USRC/SP

Sportelli Decentrati per la Ricostruzione

La *mission* degli Sportelli è quella di esaminare le richieste di contributo per il ripristino dell'agibilità degli immobili privati situati nei centri storici dei Comuni del Cratere.

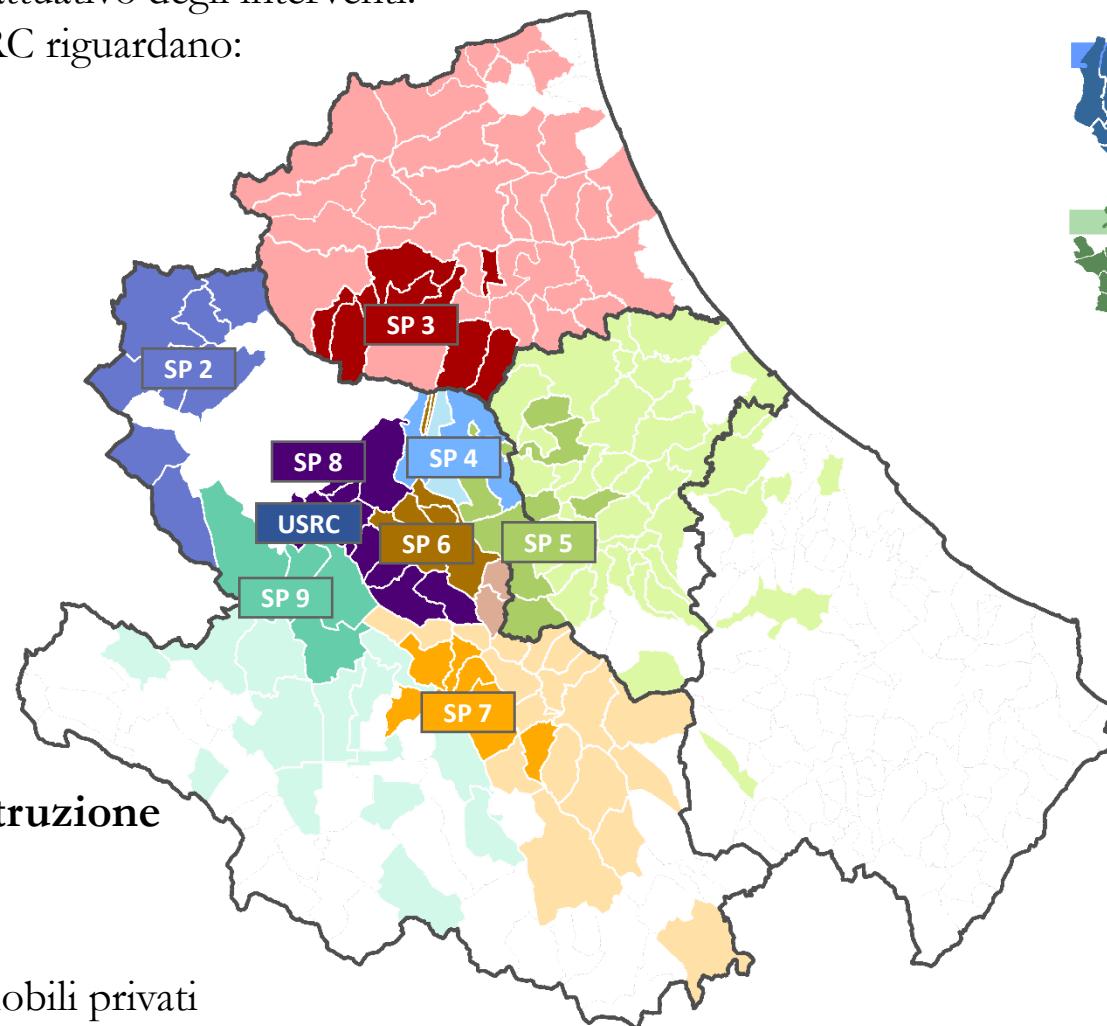

Area Omogenea 2
 Barete
 Cagnano Amiterno
 Campotosto
 Capitignano
 Montereale
 Pizzoli
 Scoppito
 Tornimparte

Area Omogenea 6
 Caporciano
 Navelli
 Prata D'Ansidonia
 San Pio delle Camere
 Carapelle Calvisio
 Castelvecchio Calvisio

Area Omogenea 3
 Arsita
 Castelli
 Colledara
 Fano Adriano
 Montorio al Vomano
 Penna Sant'Andrea
 Pietracamela
 Tossicia

Area Omogenea 7
 Bugnara
 Castel di Ieri
 Castelvecchio Subequo
 Cocullo
 Collarmele
 Gagliano Aterno
 Goriano Sicoli

Area Omogenea 4
 Castel del Monte
 Santo Stefano di Sessanio
 Villa Santa Lucia degli Abruzzi

Area Omogenea 8
 Acciano
 Barisciano
 Fagnano Alto
 Fontecchio
 Fossa
 Ocre
 Poggio Picenze
 San Demetrio ne' Vestini
 Sant'Eusanio Forconese
 Tione degli Abruzzi
 Villa Sant'Angelo

Area Omogenea 5
 Brittili
 Bussi sul Tirino
 Capestrano
 Civitella Casanova
 Cugnoli
 Montebello di Bertona
 Ofena
 Popoli
 Torre de' Passeri

Area Omogenea 9
 Lucoli
 Ovindoli
 Rocca di Cambio
 Rocca di Mezzo

Attualmente sono in servizio presso l'USRC e gli Sportelli n. 90 UNITA' DI PERSONALE:


65 TECNICI

17 AMMINISTRATIVI-CONTABILI

8 ALTRO

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'USRC

Legge 134/2012
Intesa Istituzione Ufficio Speciale

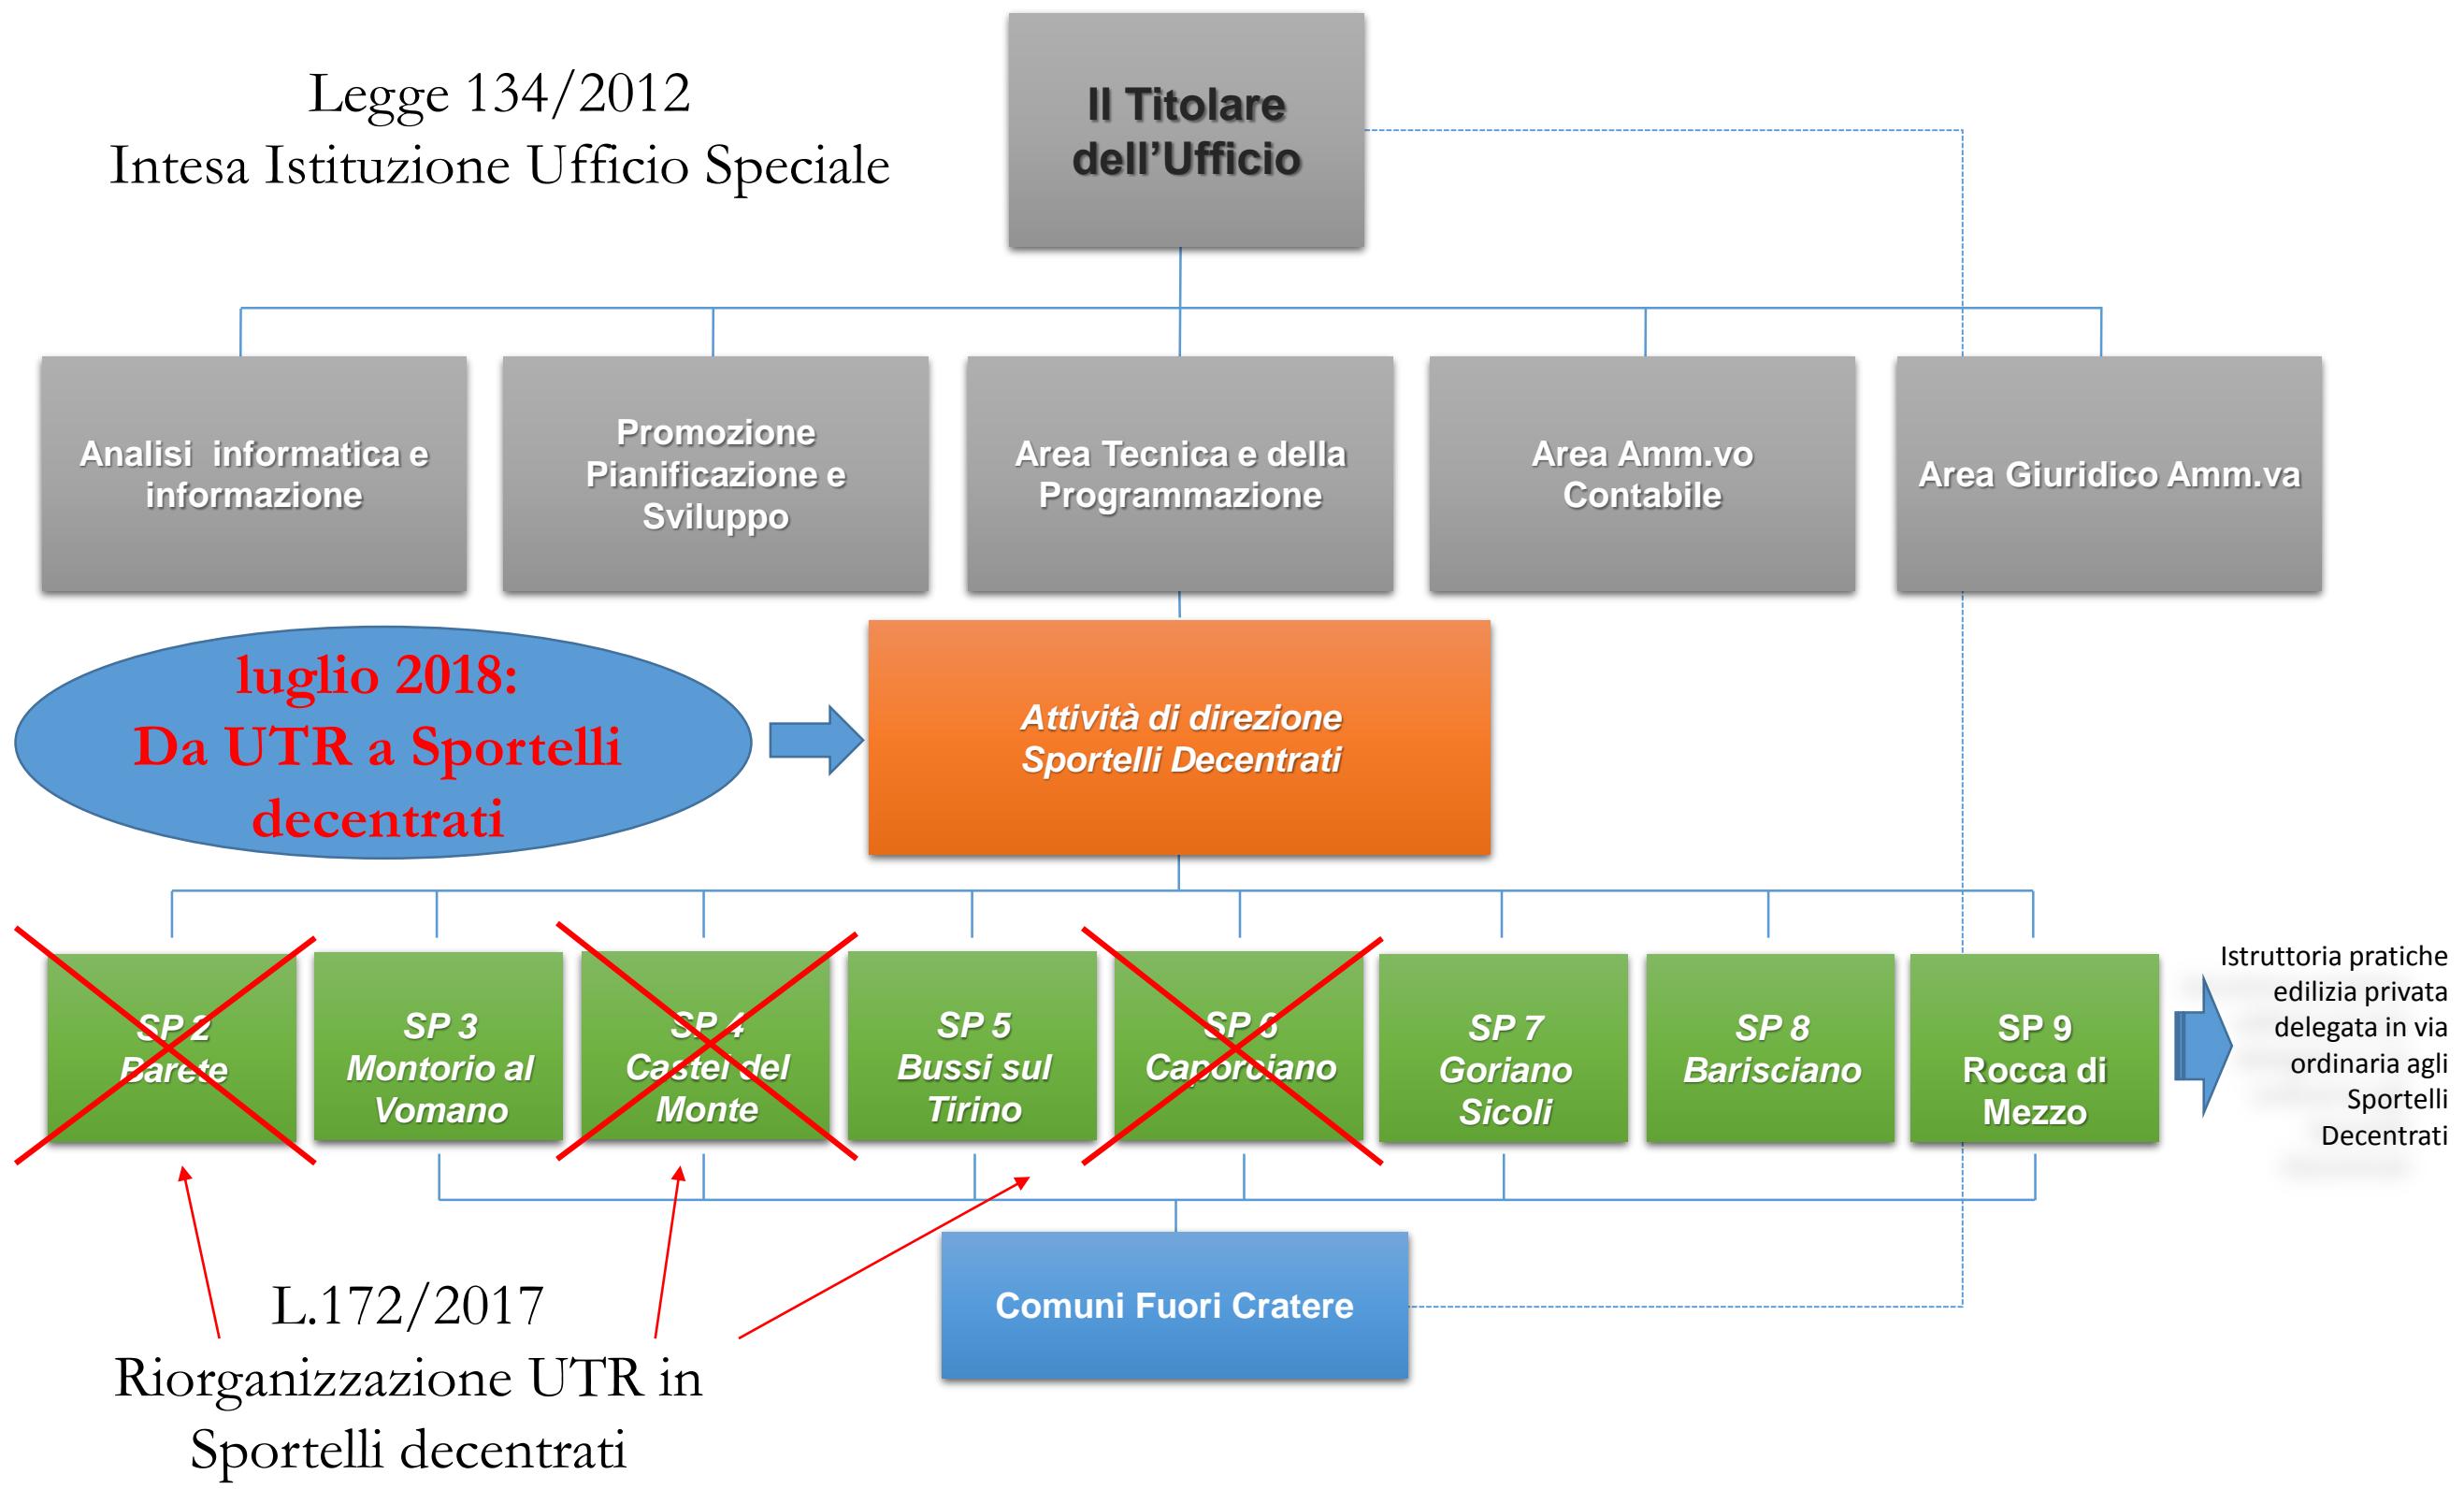



PdR – Piani di Ricostruzione dei centri storici



55

Comuni dotati di PdR

+



1

Comune con Programmazione finanziaria

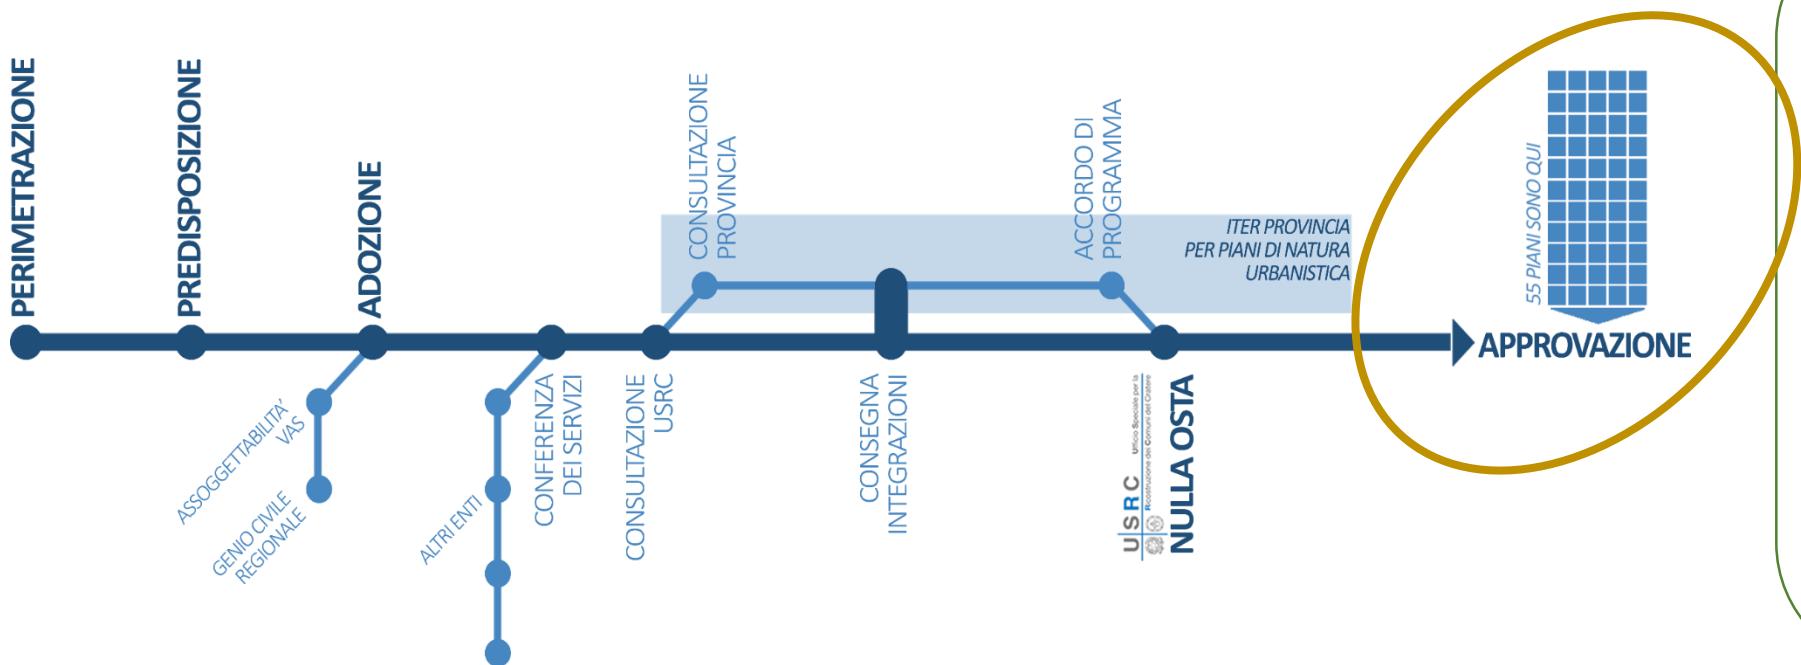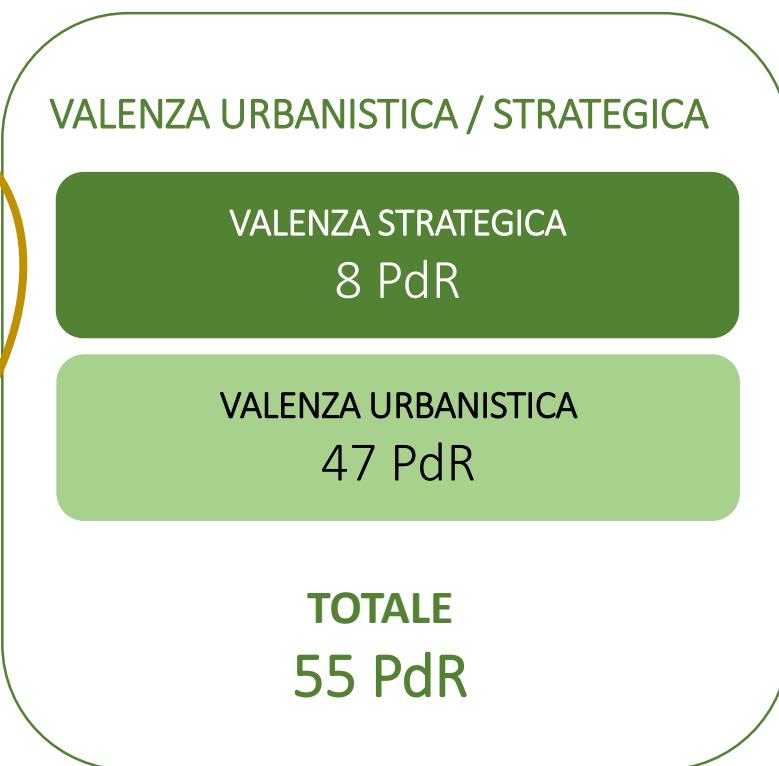



Costo Stimato Ricostruzione Privata Cratere

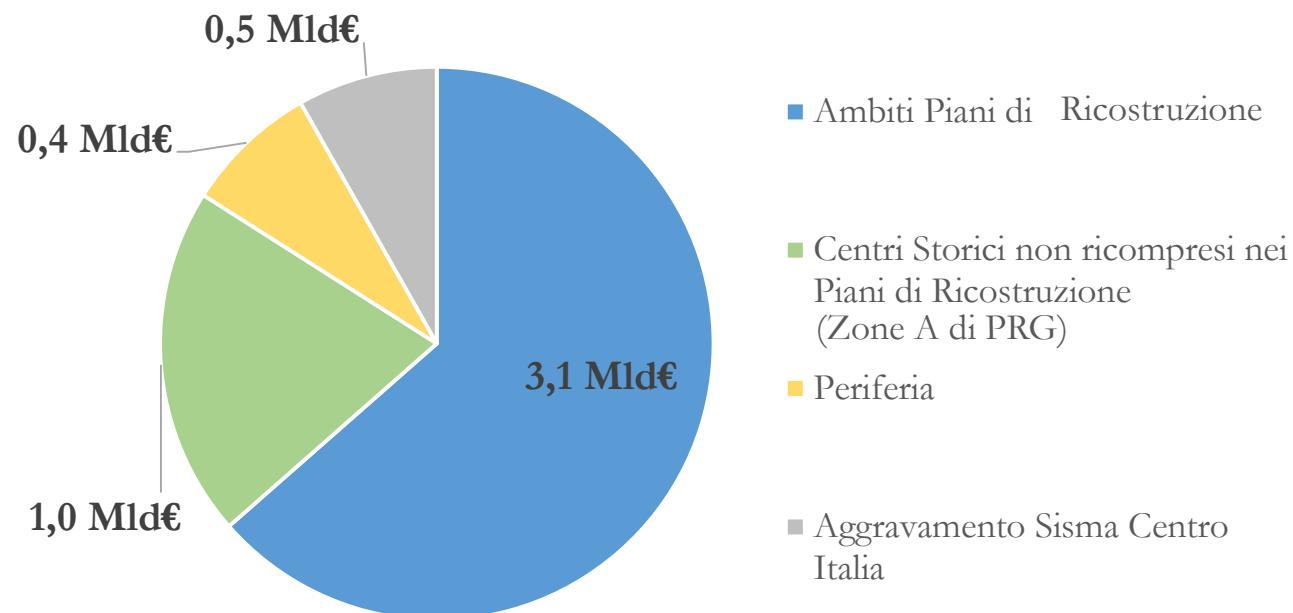

Situazione ad oggi




Totale persone residenti con forme assistenziali (C.A.S., M.A.P., Aff. Concordato): circa **4.800**



RICOSTRUZIONE PRIVATA CRATERE

Accentramento istruttoria pratiche «ereditate» da USRC

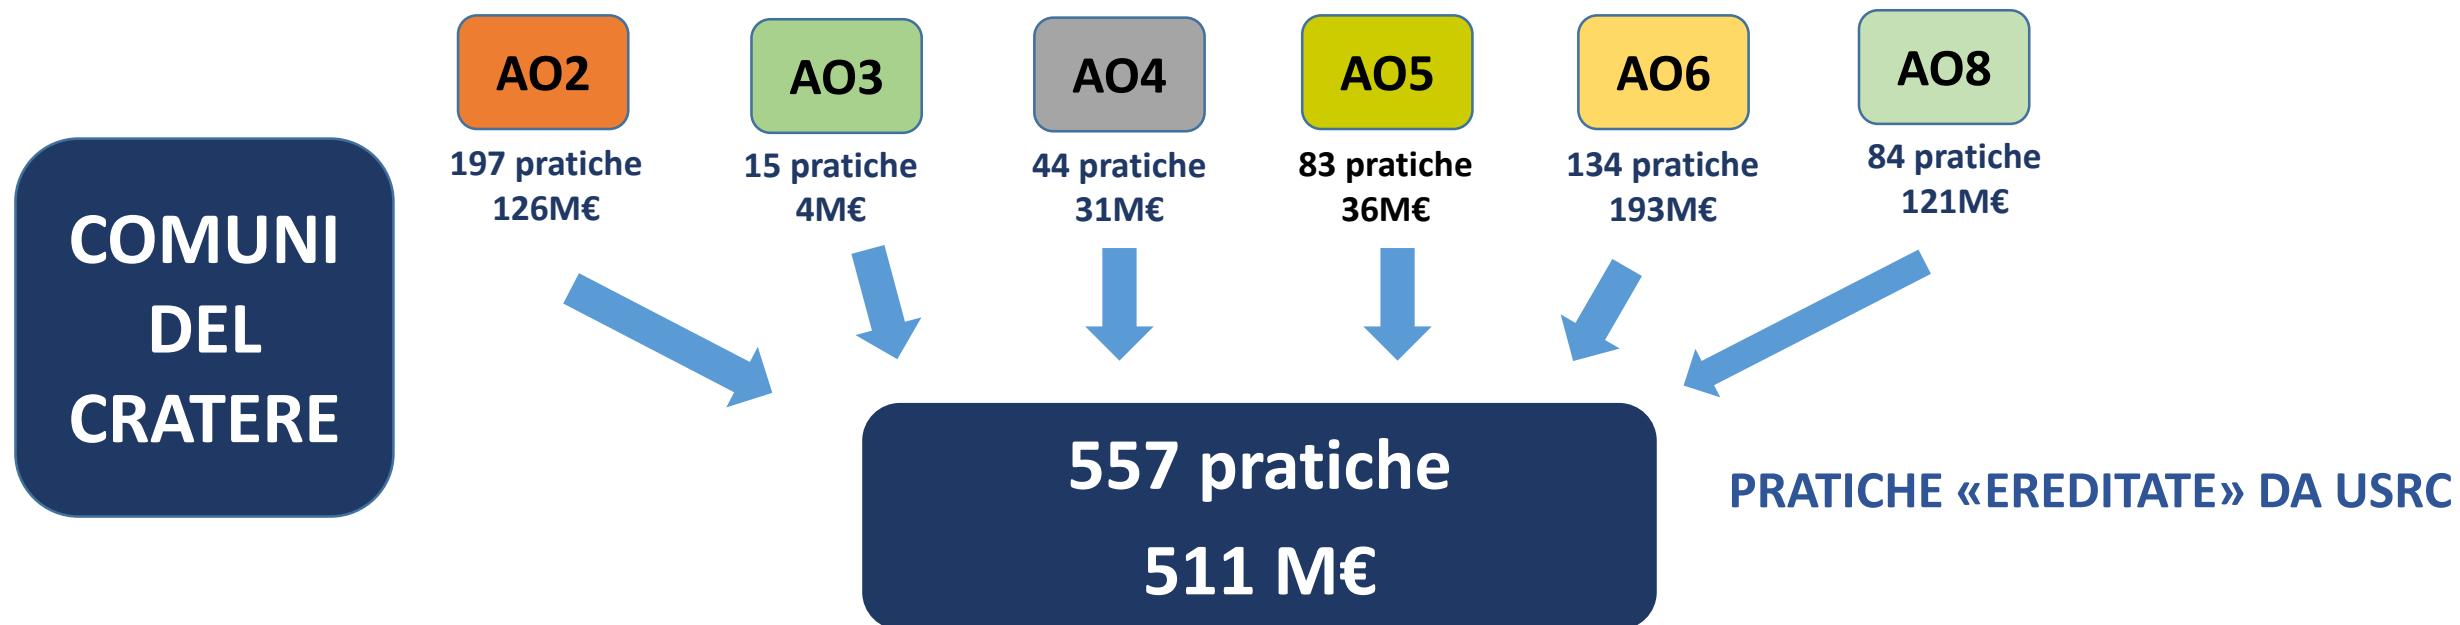

Pratiche assegnate a tecnici USRC

**438 pratiche
410 M€**



Avvio del procedimento

**127 pratiche
130 M€**

Pratiche ammesse da USRC

**9 pratiche
16 M€**

RP

17 Responsabili del procedimento

SHORT LIST

11 consulenti tecnici per l'istruttoria delle richieste di contributo

VERIFICA LO STATO DELLA PRATICA SUL SITO www.usrc.it

<http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-della-pratica/istruttoria-delle-richieste-di-contributo-presso-gli-sportelli-decentrali>


VERIFICA LO STATO DEL SAL SUL SITO www.usrc.it

<http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-della-pratica/istruttoria-degli-stati-avanzamento-lavori-presso-gli-sportelli-decentrali>



RICOSTRUZIONE PRIVATA CRATERE

Importi contributi concessi ed avanzamento progressivo della ricostruzione (dato periferia + centro storico)

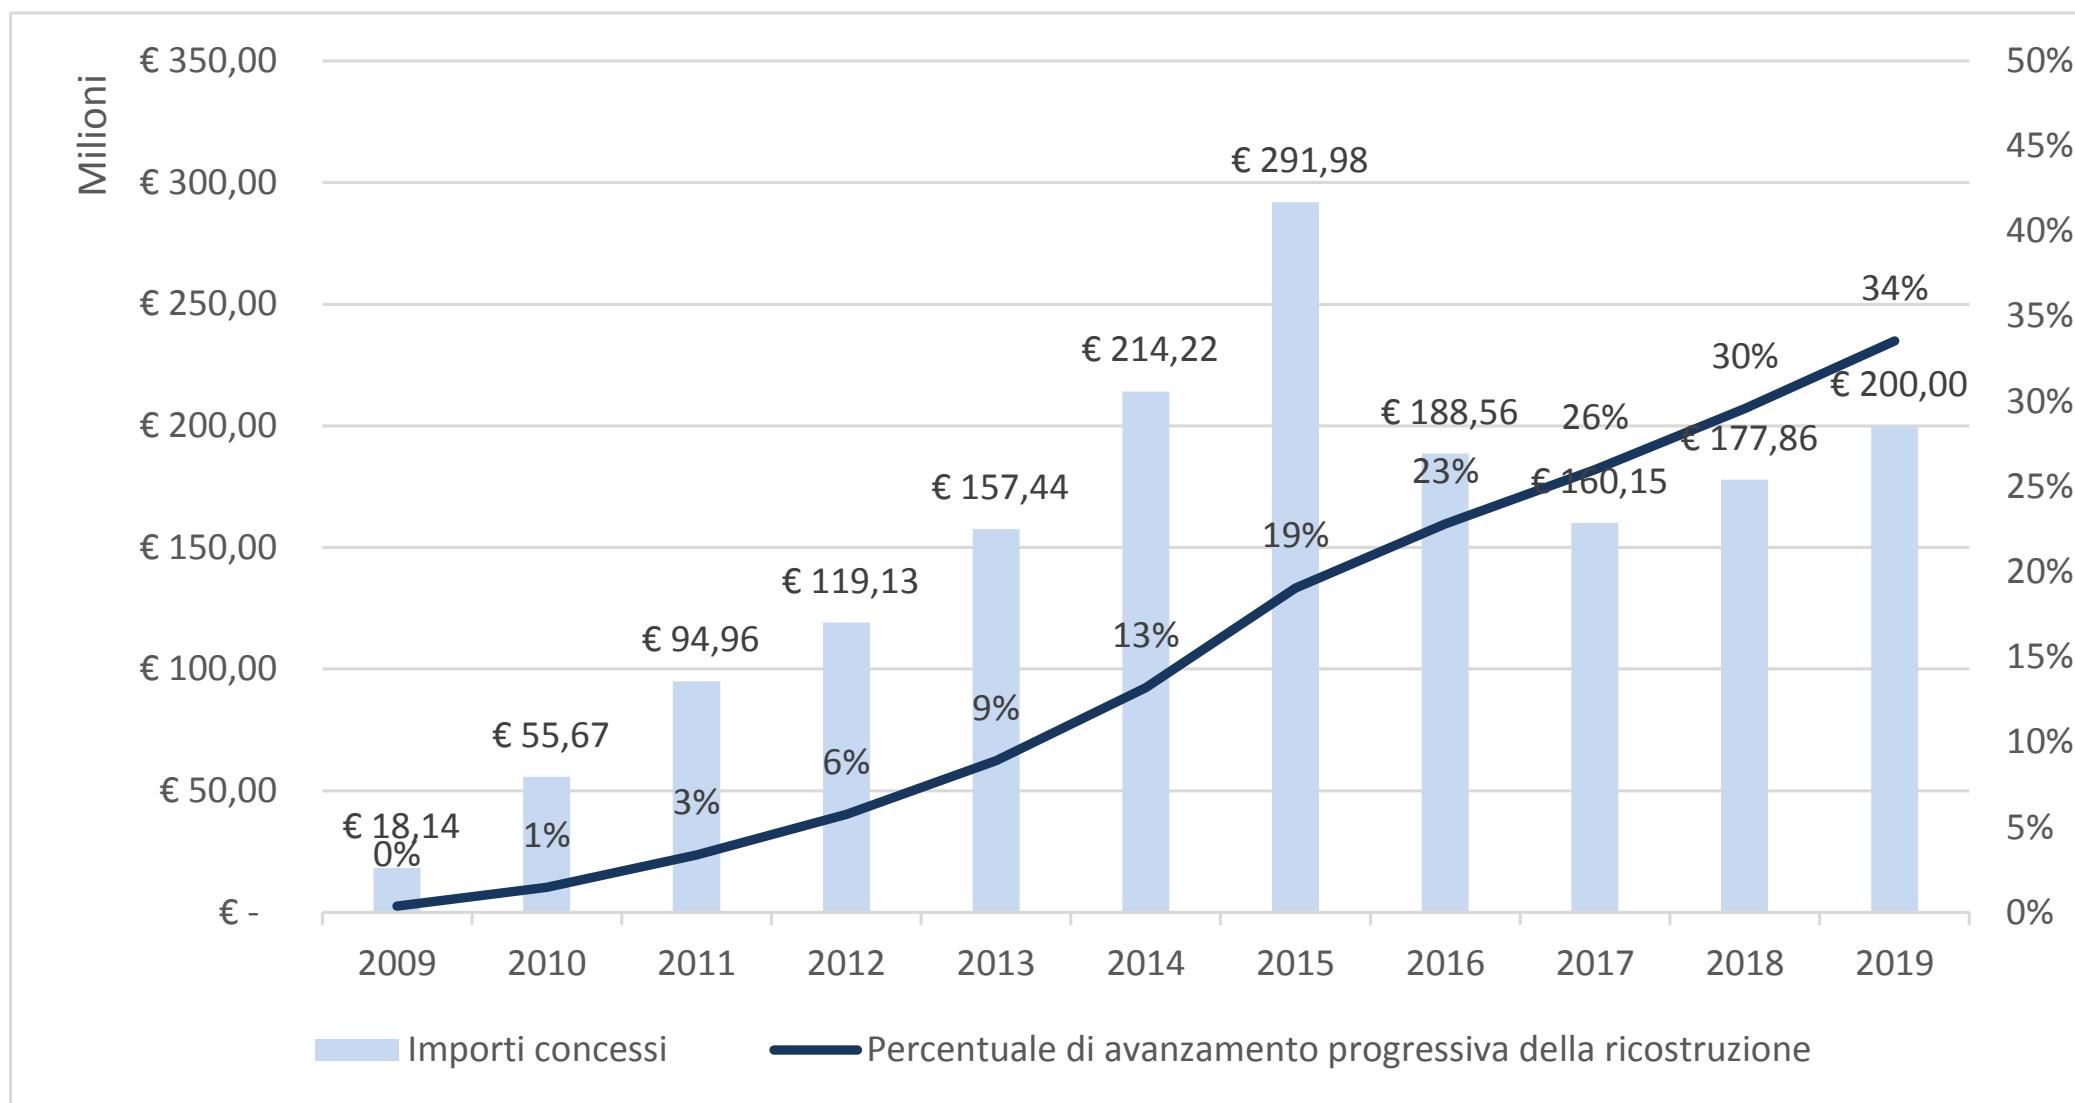

RICOSTRUZIONE PRIVATA CRATERE



Importi contributi concessi ed avanzamento progressivo della ricostruzione (dato periferia + centro storico)



**AREE OMOGENEE
INTERESSATE DALLA
SOVRAPPOSIZIONE
SISMA 2009 - 2016**

12 Comuni del **Cratere sisma 2009**, situati nelle AO n.2 e n.3, appartengono anche al **Cratere sisma 2016**.


**RESTANTI
AREE OMOGENEE
CRATERE SISMA 2009**

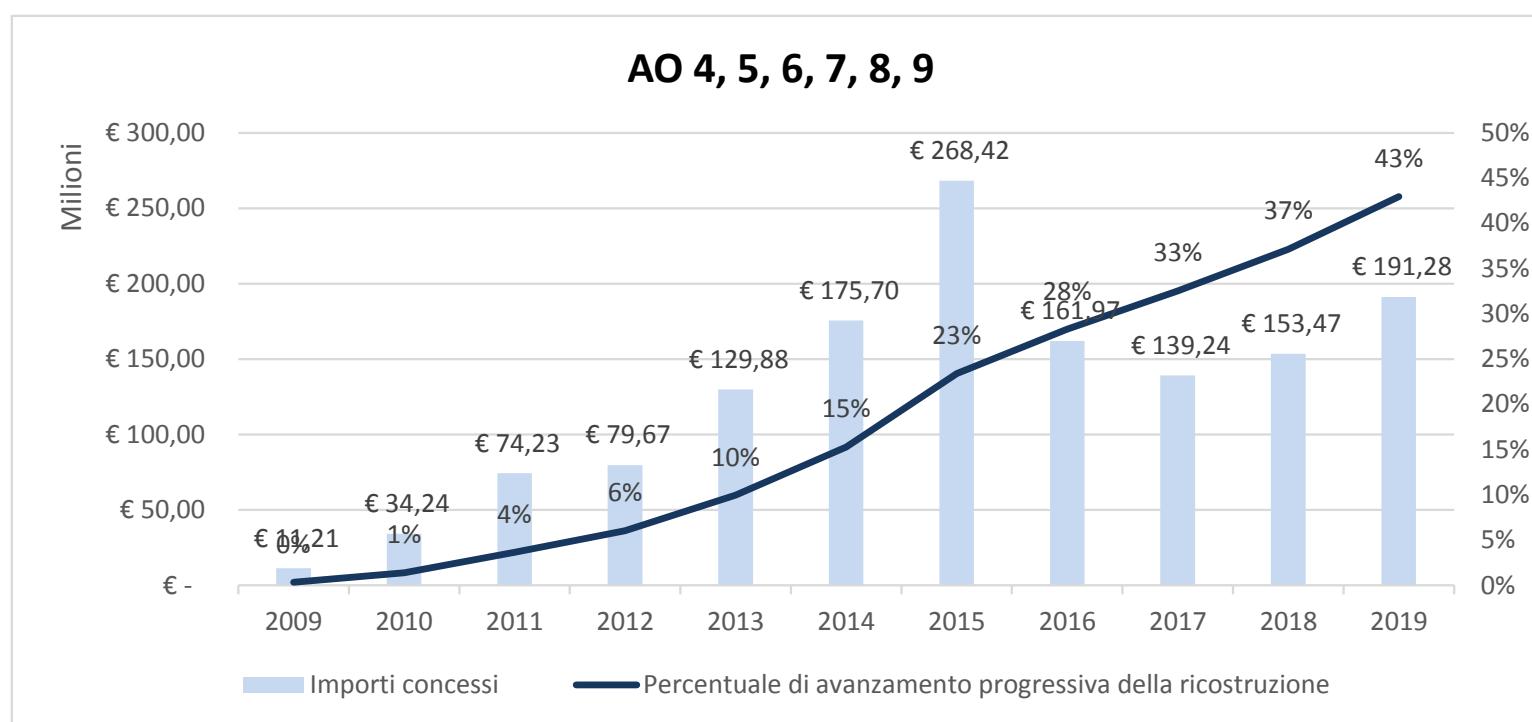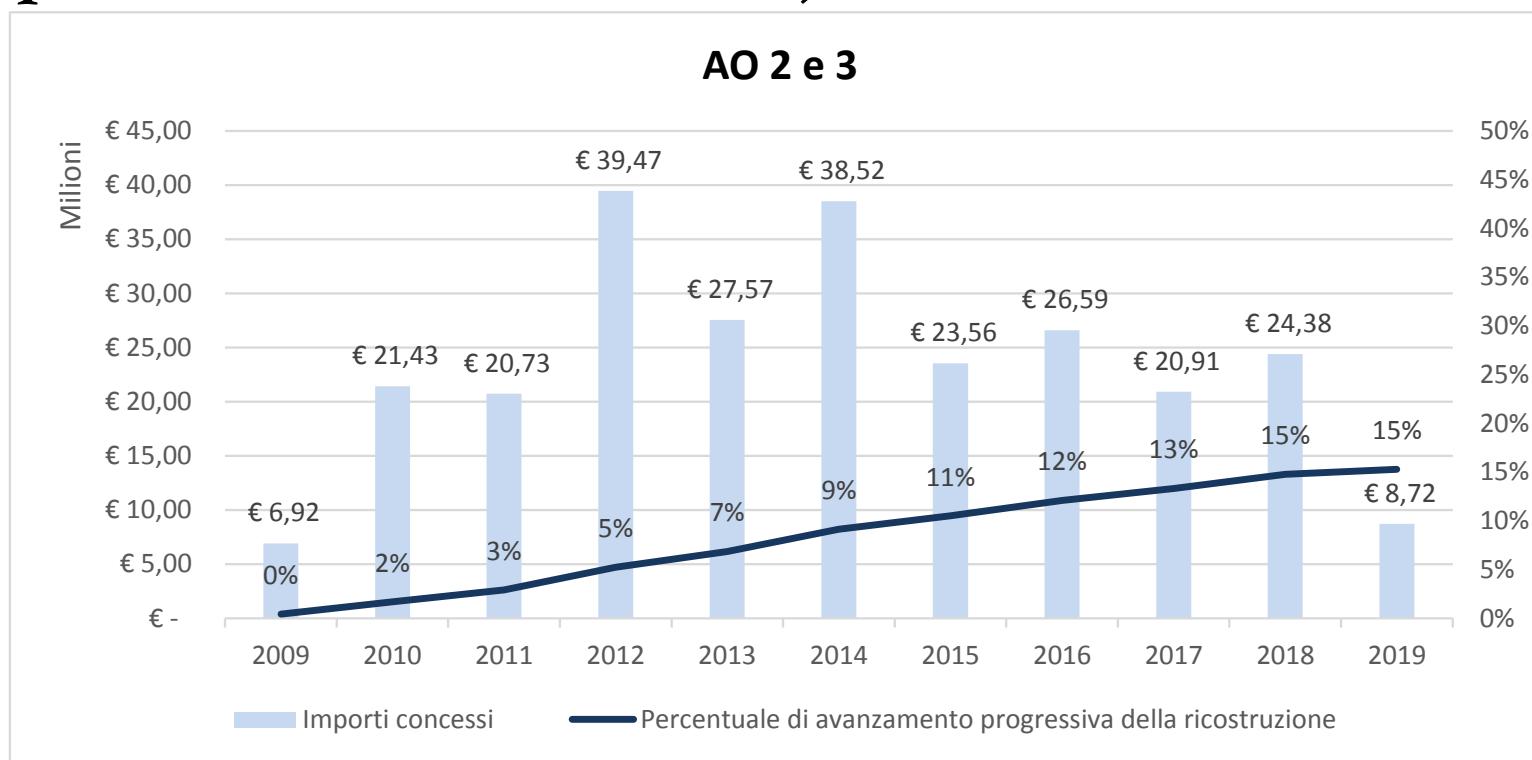



RICOSTRUZIONE PRIVATA CRATERE

Importi contributi liquidati (dato periferia + centro storico)

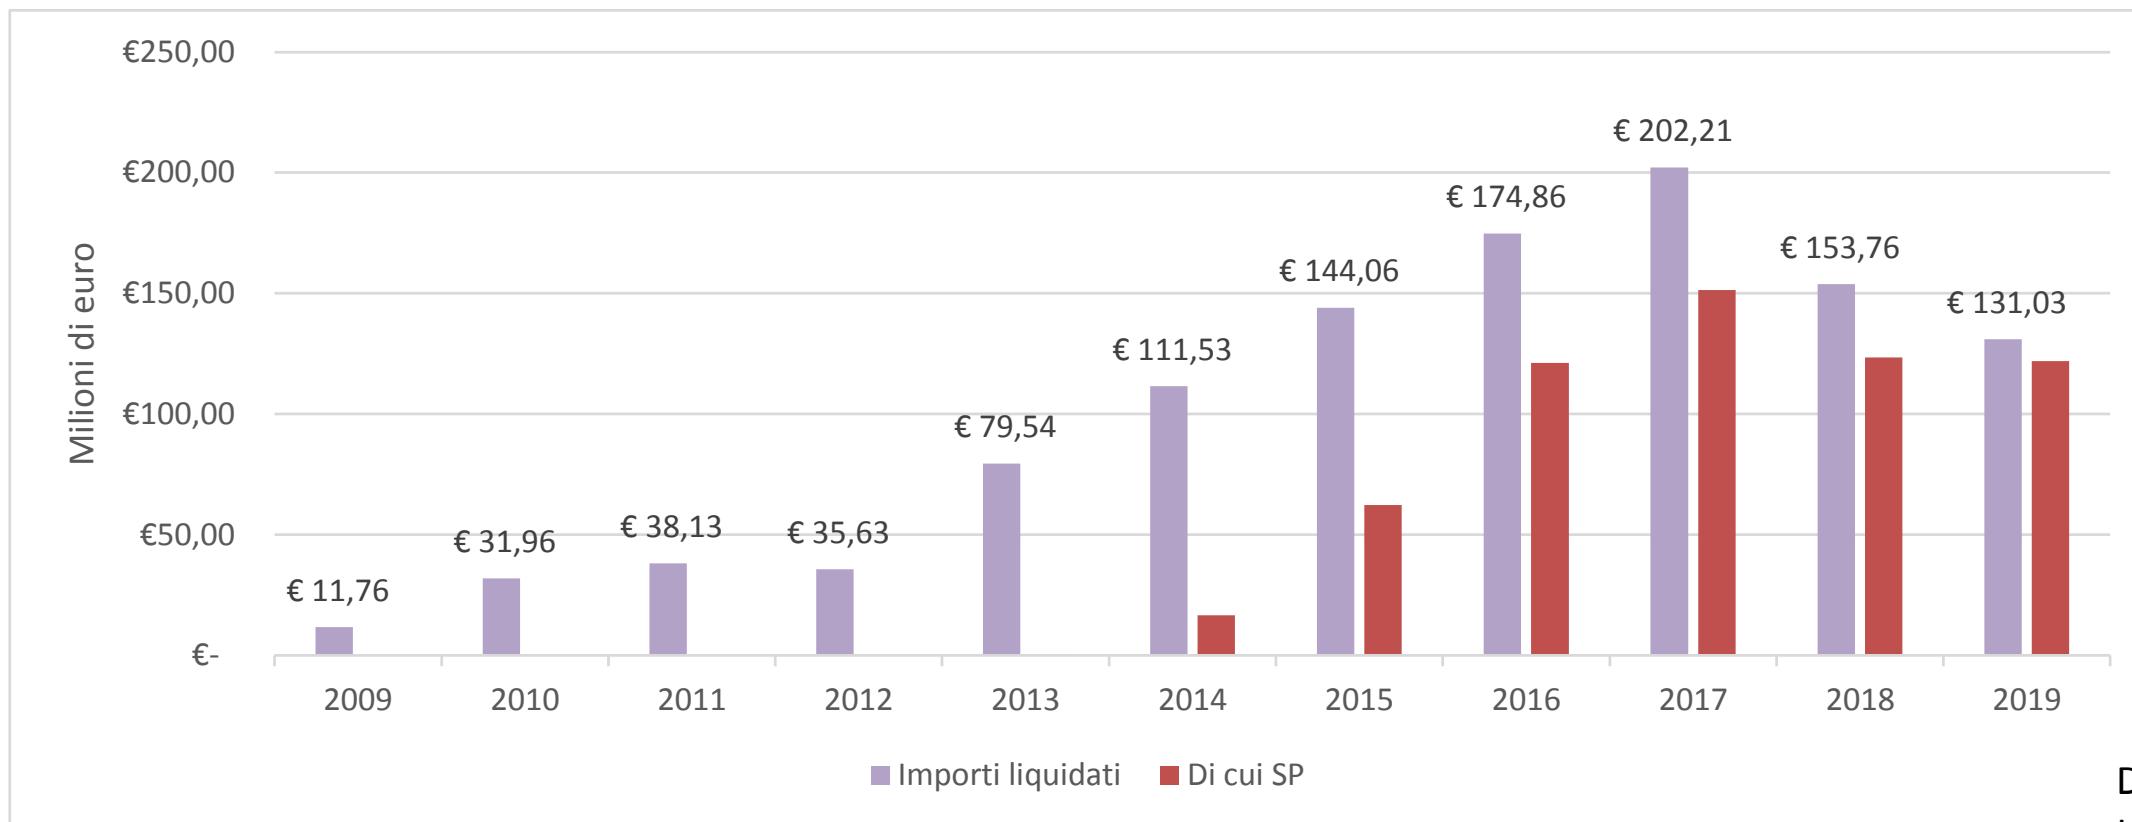

Distribuzione degli importi tra le aree omogenee


LA MAGGIOR PARTE DELLE EROGAZIONI HANNO INTERESSATO L'AREA 8 PIU' DANNEGGIATA



Area	Perc.	Importo	Di cui SP
2	14,13%	€ 157.510.573,11	€ 50.498.670,70
3	7,48%	€ 83.360.269,01	€ 10.262.413,06
4	3,48%	€ 38.758.654,09	€ 36.920.833,64
5	13,78%	€ 153.599.153,44	€ 105.487.385,07
6	9,47%	€ 105.524.947,95	€ 73.620.789,53
7	7,75%	€ 86.327.309,09	€ 45.900.851,03
8	34,25%	€ 381.697.880,25	€ 195.298.643,06
9	9,66%	€ 107.690.931,32	€ 60.994.691,54

RICOSTRUZIONE PRIVATA AREA OMOGENEA 8

Importi contributi concessi ed avanzamento progressivo della ricostruzione AO8 (dato periferia + centro storico)

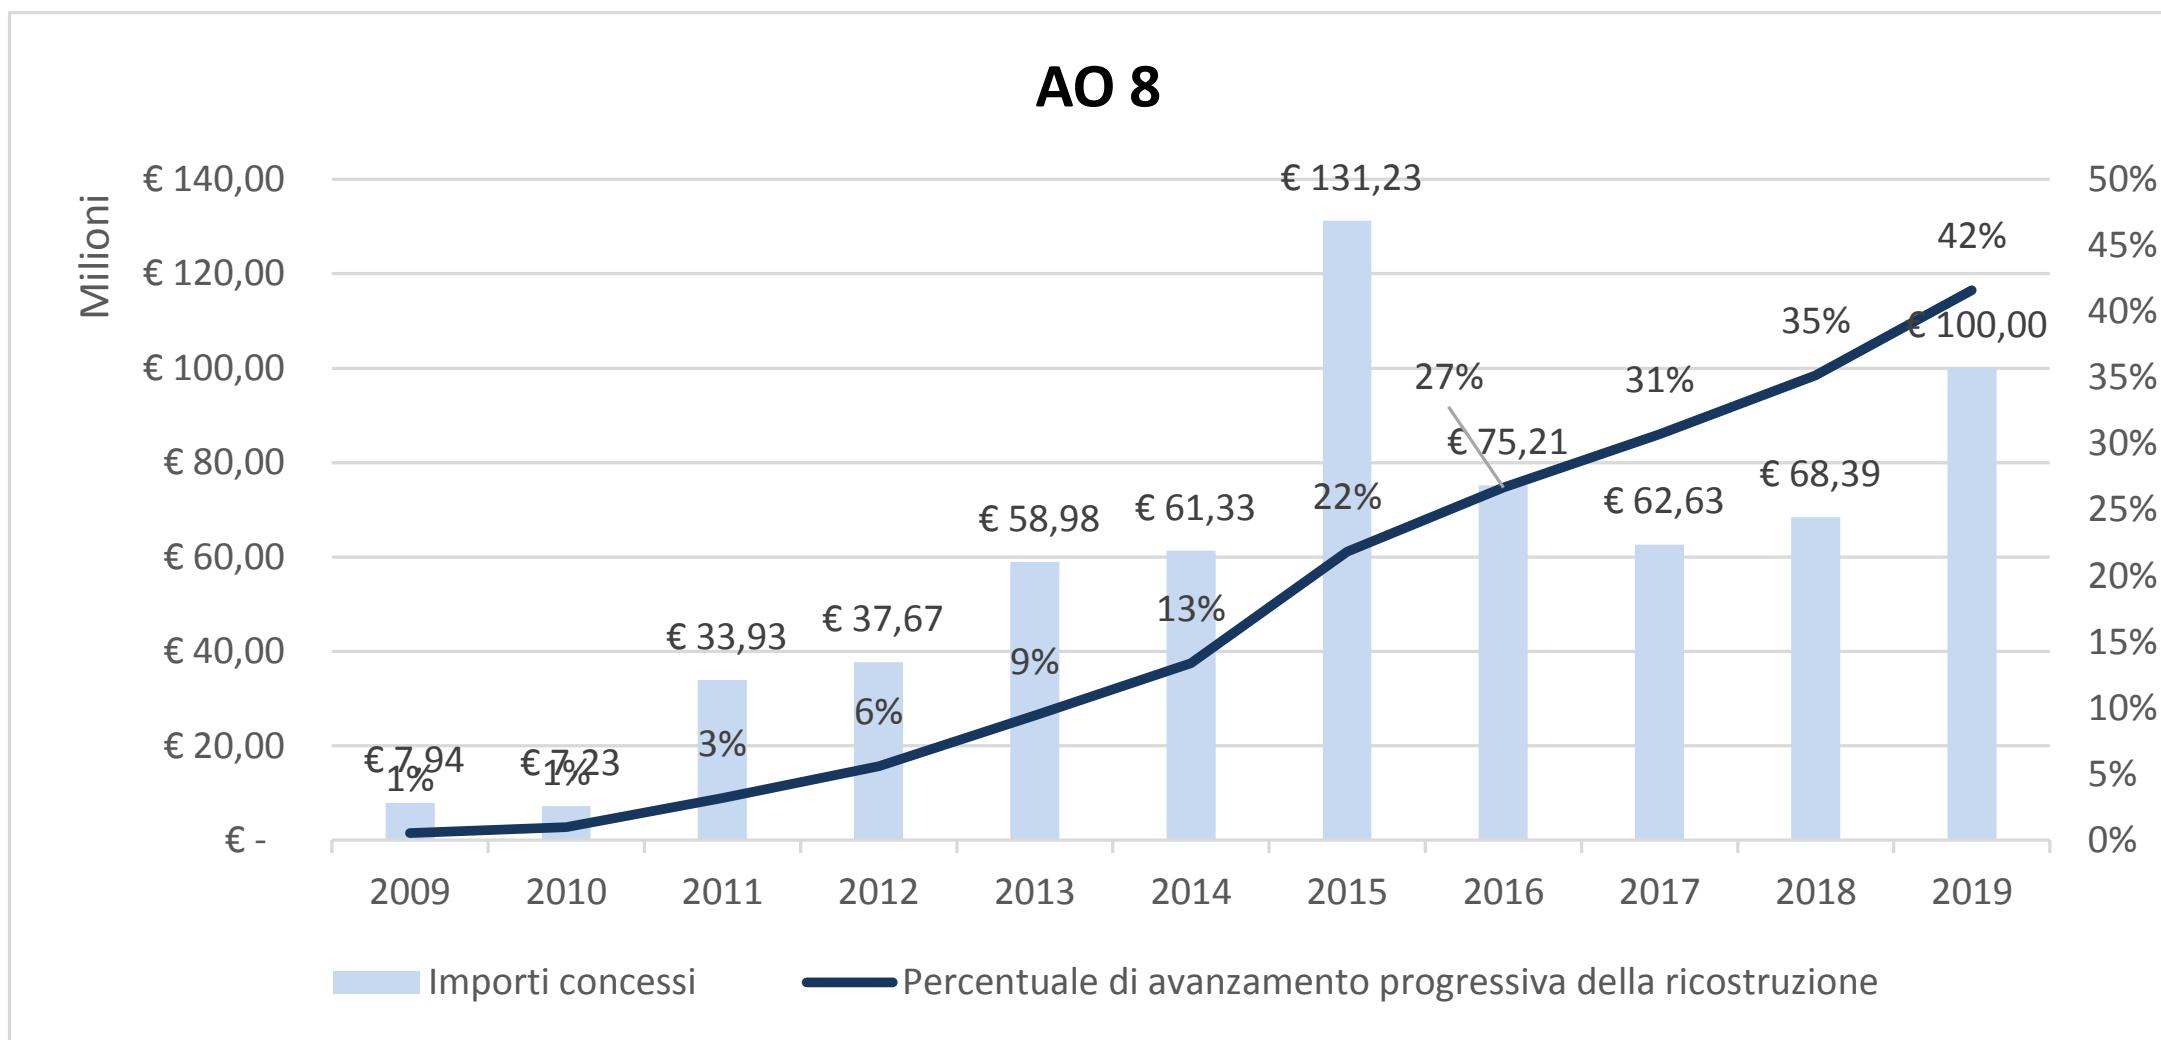




Avanzamento Ricostruzione Privata nei Piani di Ricostruzione dei Comuni del Cratere

AO	importi da PdR	importi presentati (richiesti)	% presentato	importi ammessi	% ammesso
AO2	€ 655.506.043,86	€ 240.356.372,75	37%	€ 209.412.316,54	32%
AO3	€ 208.051.492,09	€ 68.041.623,38	33%	€ 54.332.535,21	26%
AO4	€ 175.974.910,27	€ 128.336.606,48	73%	€ 103.047.128,17	59%
AO5	€ 193.091.158,67	€ 144.020.098,30	75%	€ 102.260.522,88	53%
AO6	€ 388.604.119,90	€ 247.003.920,49	64%	€ 146.869.870,45	38%
AO7	€ 169.557.133,42	€ 120.461.319,28	71%	€ 96.317.116,20	57%
AO8	€ 1.088.834.911,41	€ 786.468.021,20	72%	€ 419.113.120,32	38%
AO9	€ 258.211.743,01	€ 128.581.536,11	50%	€ 97.059.762,95	38%
TOTALE	€ 3.137.831.512,63	€ 1.863.269.497,99	59%	€ 1.228.412.372,72	39%

AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEGLI AMBITI DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE (PDR) RISPETTO AL FABBISOGNO FINANZIARIO STIMATO



Attuazione delle previsioni di tutela e conservazione del patrimonio storico contenute nei PdR attraverso il modello parametrico che ne disciplina le maggiorazioni.

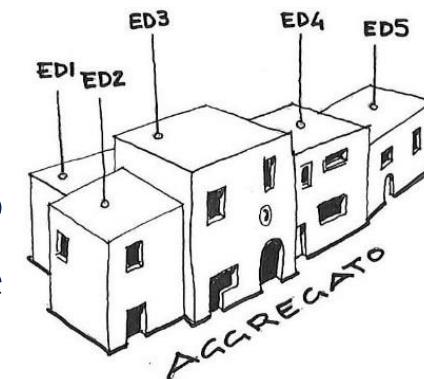


IL CONTRIBUTO PARAMETRICO (Scheda MIC): *Il contributo concedibile per lavori.*

Maggiorazioni per la conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio storico-architettonico.

Descrizione	Percentuale di incremento
Conservazione e restauro di cornici in pietra	Fino al 5%
Conservazione e restauro delle finiture esterne (faccia vista)	Fino al 5%
Conservazione e restauro di volte, solai in legno	Fino al 17%
Conservazione e restauro della copertura in legno	Fino al 3%
Conservazione e restauro del manto di copertura originale	Fino al 2%
Conservazione e restauro di porticati	Fino al 2%
Presenza di interpiano di altezza > 3,2m	7%
Conservazione e restauro di balconi storici in pietra	1%
Conservazione e restauro di infissi della tradizione	1%
Eliminazione superfetazioni	Fino al 10%
Interventi su case fortezza o case mura	5%
Sostituzione copertura in ca con copertura lignea	Fino al 2%
...	
Difficoltà di cantierizzazione	Fino al 16%

Le maggiorazioni risentono molto delle caratteristiche dell'edilizia, del territorio quale ambito di applicazione della parametrica e delle premialità che si sceglie di adottare.

Analoga scheda si ritrova nella Ricostruzione Sisma Centro Italia 2016/17

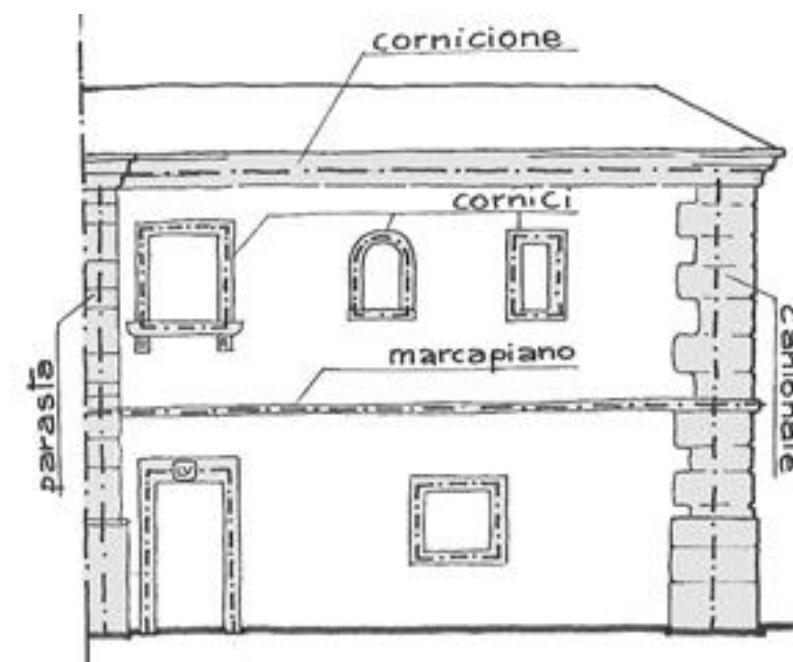

IL CONTRIBUTO PARAMETRICO

Il contributo concedibile per lavori - Le maggiorazioni

Scheda MIC (Abruzzo 2009)

Maggiorazioni per la conservazione di:

- caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
- elementi di pregio architettonico,
- elementi di complessità strutturale.



Conservazione e restauro delle finiture esterne originali del paramento murario: lapidee (faccia vista) o con intonaci storici oppure interventi che riconducono le facciate alle caratteristiche materiche e morfologiche della tradizione.



IL CONTRIBUTO PARAMETRICO

Il contributo concedibile per lavori - Le maggiorazioni

Scheda MIC (Abruzzo 2009)

Maggiorazioni per la conservazione di:

- caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
- elementi di pregio architettonico,
- elementi di complessità strutturale.



Conservazione e restauro di orizzontamenti a volta, in legno o in travi di ferro e voltine.



IL CONTRIBUTO PARAMETRICO

Il contributo concedibile per lavori - Le maggiorazioni

Scheda MIC (Abruzzo 2009)

Maggiorazioni per la conservazione di:

- caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
- elementi di pregio architettonico,
- elementi di complessità strutturale.



Recupero del manto di copertura originale con reintegrazione con coppi di recupero o realizzati a mano.



IL CONTRIBUTO PARAMETRICO

Il contributo concedibile per lavori - Le maggiorazioni

Scheda MIC (Abruzzo 2009)

Maggiorazioni per la conservazione di:

- caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
- elementi di pregio architettonico,
- elementi di complessità strutturale.



Conservazione o restauro della struttura di copertura in legno.



IL CONTRIBUTO PARAMETRICO

Il contributo concedibile per lavori - Le maggiorazioni

Scheda MIC (Abruzzo 2009)

Maggiorazioni per la conservazione di:

- caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
- elementi di pregio architettonico,
- elementi di complessità strutturale.



Restauro/conservazione di elementi pertinenti caratterizzanti il tessuto urbano dei centri storici dei Comuni del Cratere.



IL CONTRIBUTO PARAMETRICO

Il contributo concedibile per lavori - Le maggiorazioni

Scheda MIC (Abruzzo 2009)

Maggiorazioni per la conservazione di:

- caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
- elementi di pregio architettonico,
- elementi di complessità strutturale.





Interventi su case fortezza, case-torre e case-mura riconoscibili come parte integrante degli antichi recinti fortificati.

IL CONTRIBUTO PARAMETRICO

Il contributo concedibile per lavori - Le maggiorazioni


Incidenza delle maggiorazioni per pregio e complessità strutturale:

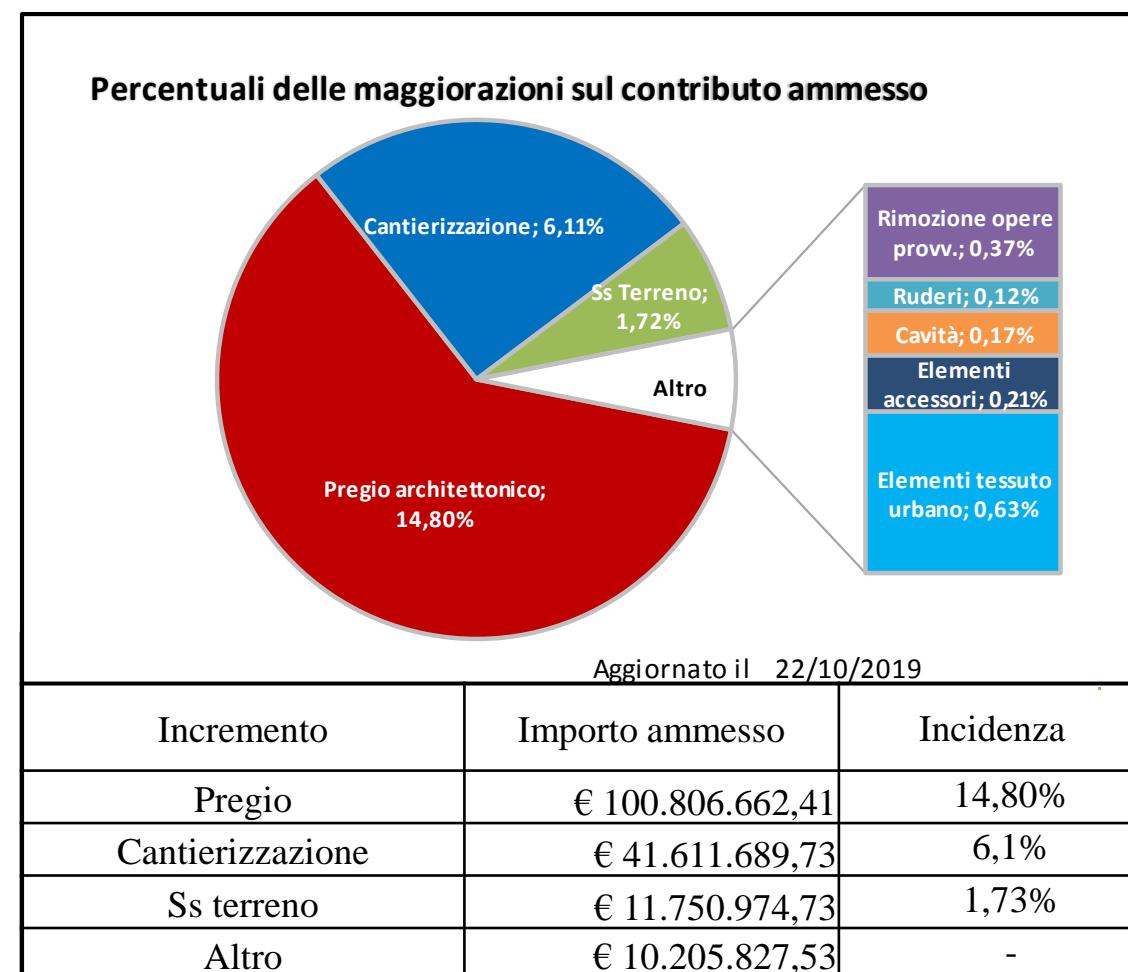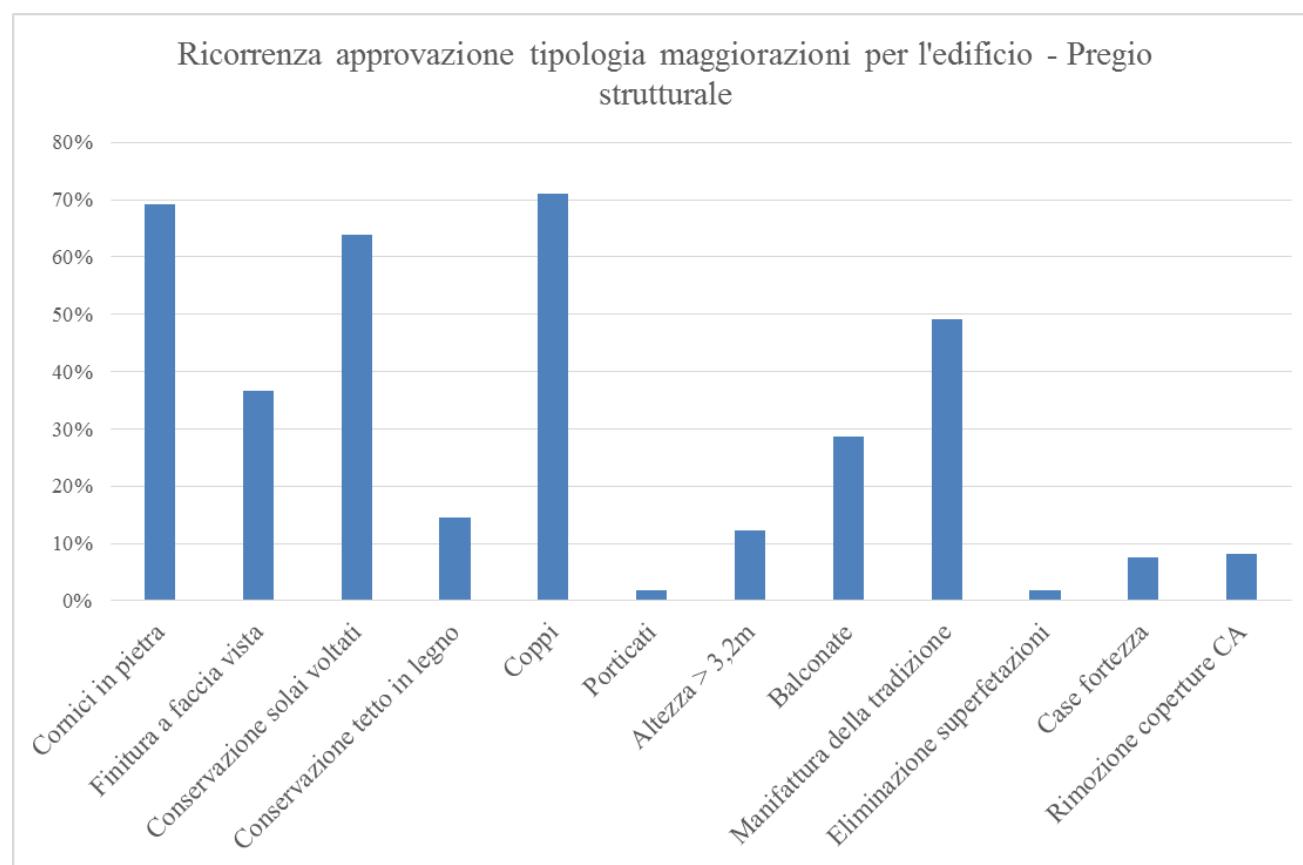

**Maggiorazioni ammesse:
164 Mln€ su 681 Mln€ ammessi lavori (24%)**



Ricorrenza dell'accesso alle maggiorazioni per la conservazione degli elementi di pregio negli interventi di ricostruzione privata effettuati nei centri storici dei Comuni dell'Area Omogenea n.8.

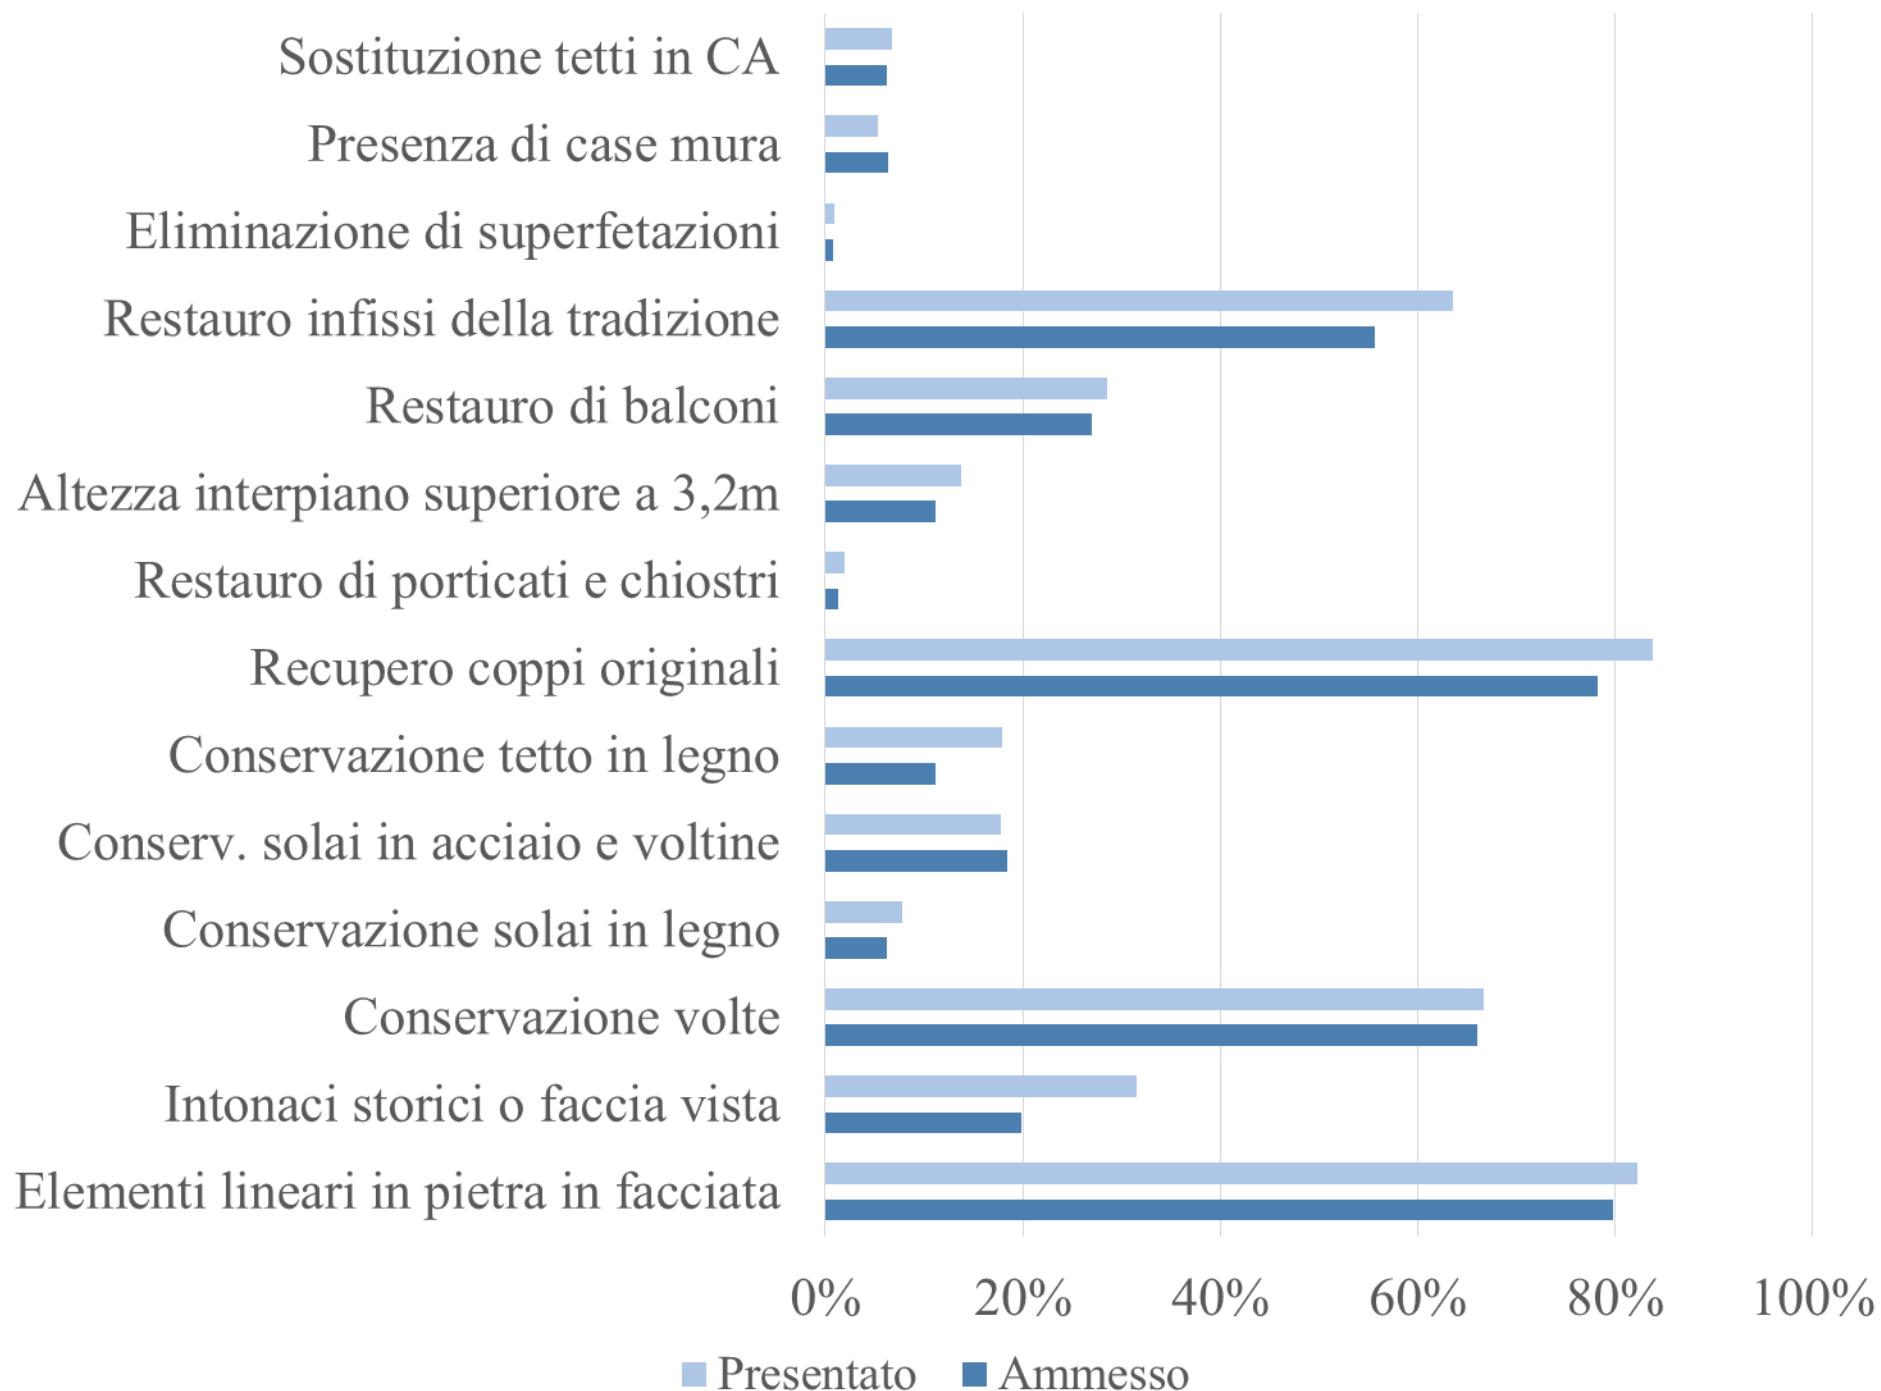


Fonte: Database USRC – MIC. Campione di **1123 edifici** con progetto **ammesso** a contributo e **2767 edifici** con progetto **presentato** con procedura parametrica nei centri storici dei Comuni dell'AO8.

ANALISI INTERVENTI STRUTTURALI

Interventi strutturali previsti su un campione di 491 schede approvate e suddivisi in:

- Interventi sulle coperture
- Interventi sulle murature
- Interventi sugli impalcati

Gli interventi sono più eterogenei sulle murature mentre per quanto riguarda le coperture si tende tipicamente alla totale sostituzione

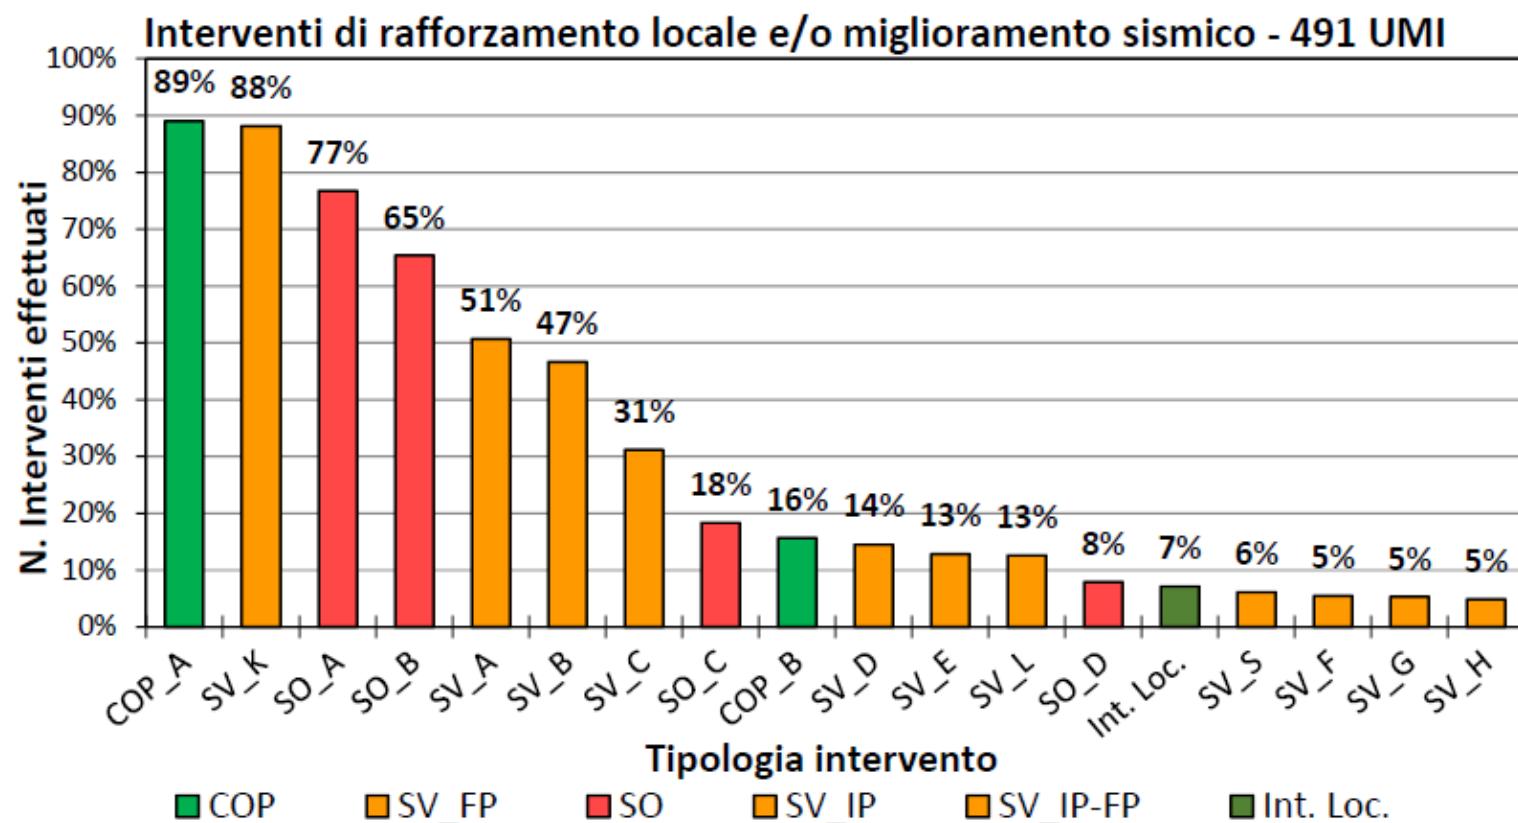

Interventi più ricorrenti

89%	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE (ANCHE PARZIALE)	COP_A
88%	CORDOLI DI PIANO	SV_K
77%	CONSOLIDAMENTO VOLTE	SO_A
65%	CONSOLIDAMENTO SOLAI	SO_B
51%	INTONACO ARMATO (CON FIBRE O ACCIAIO)	SV_A
47%	INIEZIONE MISCELE LEGANTI	SV_B
31%	SARCITURA LESIONI/RIPRESE DI MURATURA/CUCI E SCUCI	SV_C



Interventi sulle pareti murarie

Consolidamento Pareti Esterne – Intonato Armato



Interventi su orizzontamenti voltati





Interventi su elementi strutturali verticali

Consolidamento opere murarie - iniezioni

Scelta Punti e Realizzazione Fori



Inserimento becco per iniezioni



Iniezione Malta



Iniezione Completa





Interventi su elementi strutturali verticali

Consolidamento opere murarie – Intonaco Armato

Parete armata con sistema C.A.M.



Parete armata con fibra di vetro



Interventi sulle Coperture


Sostituzione delle coperture



IL CONTRIBUTO PARAMETRICO


Il livello di sicurezza raggiunto

Tipologia di intervento

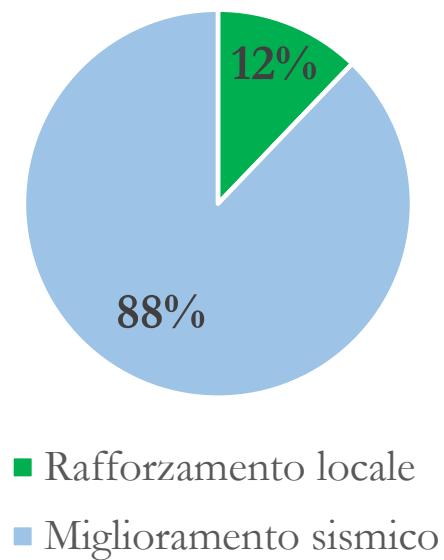

Campione: 707 schede

Distribuzione del livello di sicurezza SLV post

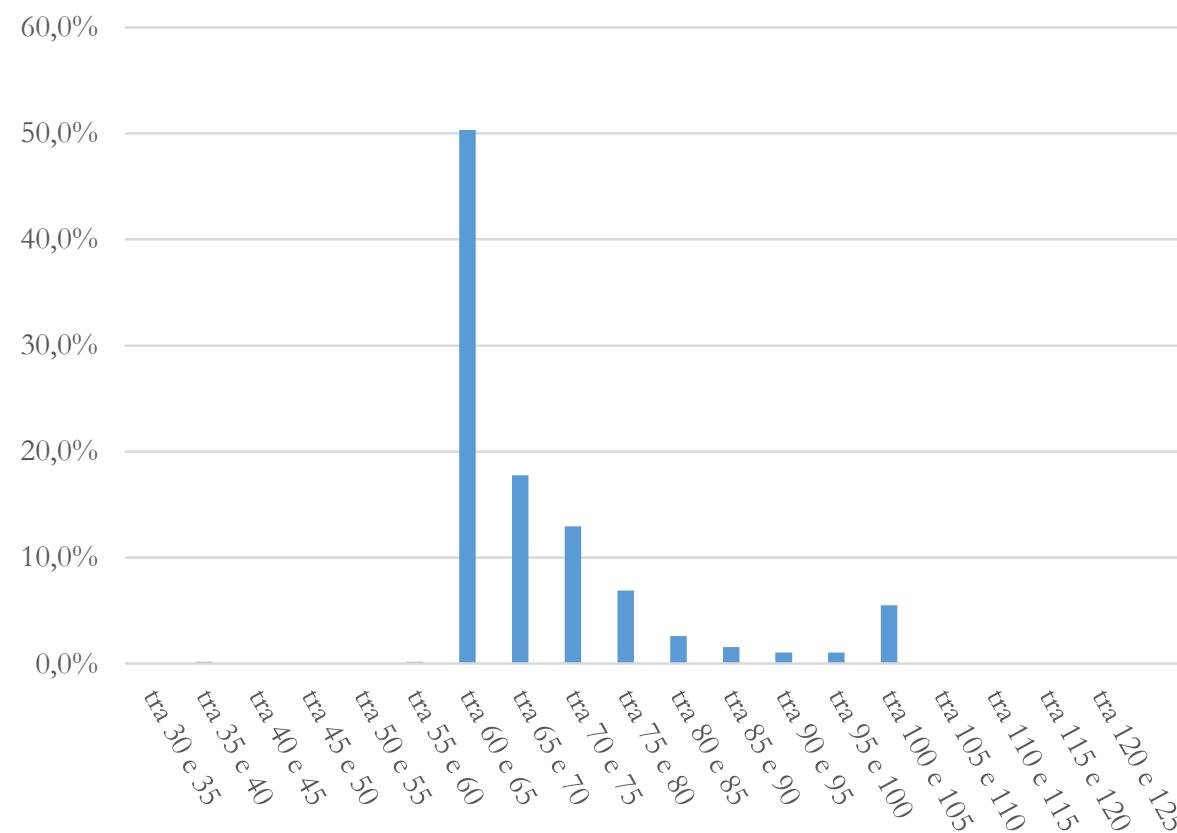


Campione: 580 schede con miglioramento sismico di cui 32 con livello superiore al 100%

Campione di 580 schede	Ante	Post
Media	27%	69%
Varianza	229	113

ANALISI DEI COSTI – ANTICIPAZIONE SU UMI MONOESITO

COSTI CENTRI STORICI vs COSTI FUORI CENTRI STORICI

EDIFICI IN MURATURA



CENTRI STORICI COMUNI DEL CRATERE


Esito di agibilità	N° UMI [-]	N° edifici [-]	Sup. Lorda [m ²]	Costo medio di rip.+retrofit [€/m ²]	Costo medio totale voci [€/m ²]
UMI con esito B-C Rafforzamento locale	33			317	325
UMI con esito E Miglioramento sismico	121			901	965
Demolite (Esito E)	11			-	915

+29%

+37%



PERIFERIE DI L'AQUILA

Esito di agibilità	N° edifici [-]	Sup. Lorda [m ²]	Costo medio di riparazione+retrofit [€/m ²]	Costo medio totale voci [€/m ²]
Rafforzamento locale (Esito B-C)	899	368	245	245
Miglioramento sismico (Esito E)	357	609	659	720
Demolite (Esito E)	248	542	-	1353





Monitoraggio processo istruttorio ricostruzione privata nei Comuni dell'Area Omogenea n.8

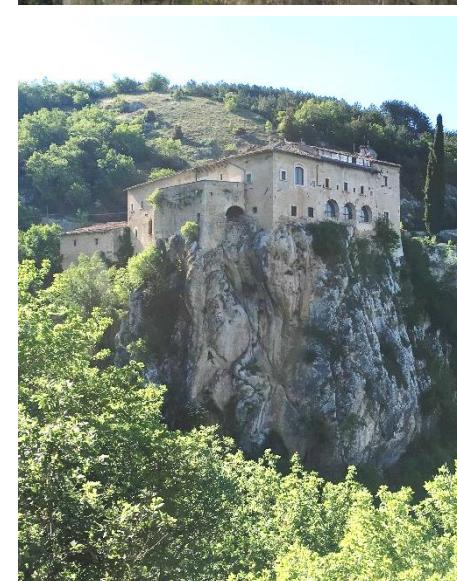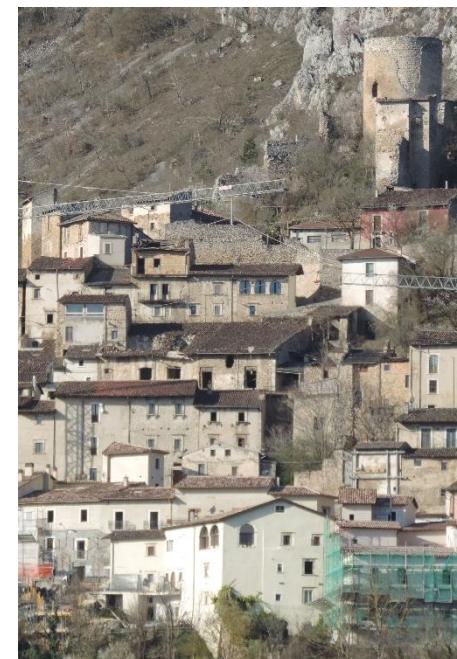

Ricostruzione Privata

Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8

AO 8

**ISTANZE DI
CONTRIBUTO**

	Presentate [n.]	Presentate [€]	Ammesse[n.]	Ammesse [€]	Archiviazione e dinieghi [n.]	Archiviazione e dinieghi [€]	Pratiche in attesa di ammissione [n.]	Pratiche in attesa di ammissione [€]
ACCIANO	68	€ 53.695.284	25	€ 21.437.456	5	€ 2.168.562	38	€ 26.496.958
BARISCIANO	210	€ 205.229.250	108	€ 88.705.875	30	€ 24.292.853	72	€ 76.603.508
FAGNANO ALTO	78	€ 82.506.780	40	€ 37.073.611	7	€ 2.288.261	31	€ 37.605.286
FONTECCHIO	55	€ 73.001.873	28	€ 35.254.373	9	€ 4.772.963	18	€ 27.052.099
FOSSA	110	€ 118.364.314	46	€ 30.694.094	28	€ 10.560.979	36	€ 76.264.417
OCRE	81	€ 102.045.910	21	€ 15.638.102	25	€ 39.372.958	35	€ 45.383.060
POGGIO PICENZE	48	€ 62.984.226	18	€ 17.529.528	3	€ 2.162.756	27	€ 41.347.121
SAN DEMETRIO	155	€ 192.211.183	71	€ 81.181.647	17	€ 6.808.288	67	€ 78.760.892
SANT'EUSANIO	49	€ 97.533.030	24	€ 50.441.793	3	€ 3.671.235	22	€ 39.339.542
TIONE DEGLI ABRUZZI	88	€ 55.446.804	49	€ 27.803.413	17	€ 6.512.922	22	€ 17.956.425
VILLA SANT'ANGELO	66	€ 72.797.572	45	€ 54.999.772	14	€ 4.767.690	7	€ 6.439.510
TOT AO8	1008	€ 1.115.816.226	475	€ 460.759.662	158	€ 107.379.467	375	€ 473.248.819

Ricostruzione Privata

Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8

AO 8

**ISTANZE DI
CONTRIBUTO**

Ai fini di una più completa valutazione dell'attività istruttorio, si dettaglia maggiormente con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione, distinte in:

- Pratiche da istruire;
- Pratiche in istruttoria;
- Pratiche in integrazione presso i tecnici.

		Da Istruire [n.]	Da Istruire [€]	In istruttoria [n.]	In istruttoria [€]	In integrazione presso i tecnici [n.]	In integrazione presso i tecnici [€]
ISTRUITE DA SP8	ACCIANO	21	€ 14.869.963	3	€ 1.307.942	5	€ 3.949.734
	BARISCIANO	31	€ 30.704.902	1	€ 2.726.636	12	€ 13.609.346
	FAGNANO ALTO	17	€ 20.337.847	1	€ 1.567.715	3	€ 5.782.018
	FORTECCHIO	10	€ 16.873.841	3	€ 3.125.972	0	€ -
	FOSSA	20	€ 31.213.926	7	€ 9.175.466	3	€ 8.067.999
	OCRE	16	€ 21.761.811	1	€ 815.737	7	€ 7.384.962
	POGGIO PICENZE	7	€ 14.885.905	1	€ 522.054	9	€ 10.683.896
	SAN DEMETRIO	40	€ 46.561.333	2	€ 5.631.591	4	€ 5.193.987
	SANT'EUSANIO	9	€ 7.479.177	0	€ -	7	€ 14.687.000
	TIONE DEGLI ABRUZZI	11	€ 10.327.266	1	€ 671.647	6	€ 1.932.978
	VILLA SANT'ANGELO	3	€ 1.468.958	1	€ 1.363.598	1	€ 2.704.265
	TOTALI SP8	185	€ 216.484.928	21	€ 26.908.358	57	€ 73.996.185
	-	-	-	-	-	-	
ISTRUITE DA USRC	ACCIANO	4	€ 1.962.180	2	€ 1.265.982	0	€ -
	BARISCIANO	13	€ 11.534.573	4	€ 3.854.463	5	€ 7.046.780
	FAGNANO ALTO	4	€ 3.033.971	1	€ 1.456.847	1	€ 1.470.002
	FORTECCHIO	1	€ 451.559	0	€ -	2	€ 4.002.731
	FOSSA	5	€ 24.892.445	0	€ -	0	€ -
	OCRE	5	€ 7.672.291	0	€ -	0	€ -
	POGGIO PICENZE	3	€ 5.256.005	2	€ 1.917.737	1	€ 1.396.170
	SAN DEMETRIO	13	€ 10.209.885	2	€ 2.613.078	1	€ 638.511
	SANT'EUSANIO	3	€ 3.933.807	1	€ 7.862.562	0	€ -
	TIONE DEGLI ABRUZZI	2	€ 2.655.658	0	€ -	1	€ 858.581
	VILLA SANT'ANGELO	1	€ 521.791	1	€ 380.899	0	€ -
	TOTALI USRC	54	€ 72.124.164	13	€ 19.351.569	11	€ 15.412.775
	-	-	-	-	-	-	

Ricostruzione Privata

Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8

AO 8

**ISTANZE DI
CONTRIBUTO**

Ai fini di una più completa valutazione dell'attività istruttorio, si dettaglia maggiormente con riferimento alle pratiche in attesa di ammissione, distinte in:

- Pratiche da istruire;
- Pratiche in istruttoria;
- Pratiche in integrazione presso i tecnici.

		Da Istruire [n.]	Da Istruire [€]	In istruttoria [n.]	In istruttoria [€]	In integrazione presso i tecnici [n.]	In integrazione presso i tecnici [€]
ISTRUITE DA SP3	ACCIANO	0	€ -	1	€ 1.418.811	0	€ -
	BARISCIANO	0	€ -	0	€ -	2	€ 1.184.217
	FAGNANO ALTO	0	€ -	0	€ -	1	€ 1.561.935
	OCRE	0	€ -	1	€ 2.150.366	2	€ 928.070
	POGGIO PICENZE	0	€ -	0	€ -	1	€ 1.583.990
	SAN DEMETRIO	0	€ -	0	€ -	2	€ 4.097.218
	SANT'EUSANIO	1	€ 3.024.283	0	€ -	0	€ -
	TOTALI SP3	1	€ 3.024.283	2	€ 3.569.176	8	€ 9.355.429
	-	-	-	-	-	-	
ISTRUITE DA SP7	ACCIANO	0	€ -	0	€ -	1	€ 572.223
	BARISCIANO	0	€ -	0	€ -	4	€ 5.942.591
	FAGNANO ALTO	0	€ -	2	€ 1.591.913	0	€ -
	FONTECCHIO	0	€ -	0	€ -	2	€ 2.597.996
	FOSSA	0	€ -	0	€ -	0	€ -
	OCRE	0	€ -	1	€ 1.523.910	2	€ 3.145.914
	POGGIO PICENZE	0	€ -	0	€ -	3	€ 5.101.363
	SAN DEMETRIO	0	€ -	0	€ -	3	€ 3.815.289
	SANT'EUSANIO	0	€ -	0	€ -	1	€ 2.352.713
	TIONE DEGLI ABRUZZI	0	€ -	0	€ -	0	€ -
	VILLA SANT'ANGELO	0	€ -	0	€ -	0	€ -
	TOTALI SP7	0	€ -	3	€ 3.115.823	16	€ 23.528.088
	-	-	-	-	-	-	
ISTRUITE DA SP9	ACCIANO	1	€ 1.150.124	0	€ -	0	€ -
	FAGNANO ALTO	1	€ 803.040	0	€ -	0	€ -
	FOSSA	1	€ 2.914.581	0	€ -	0	€ -
	TIONE DEGLI ABRUZZI	0	€ -	1	€ 1.510.295	0	€ -
	VILLA SANT'ANGELO	0	€ -	0	€ -	0	€ -
	TOTALI SP9	3	€ 4.867.745	1	€ 1.510.295	0	€ -
	-	-	-	-	-	-	
TOT AO8	243	€ 296.501.120	40	€ 54.455.222	92	€ 122.292.477	

* Il dato non comprende le pratiche istruite dal Comune

Ricostruzione Privata

Monitoraggio processo istruttorio Area Omogenea 8

AO 8

SAL

	Presentate [n.]	Presentate [€]	Nulla Osta [n.]	Nulla Osta [€]	Archivate [n.]	Archivate [€]	In attesa di nulla osta [n.]	In attesa di nulla osta [€]
ACCIANO	85	€ 15.009.363	76	€ 14.187.141	0	€ -	9	€ 1.014.968
BARISCIANO	348	€ 60.647.982	306	€ 54.368.885	5	€ 125.344	37	€ 6.033.747
FAGNANO ALTO	99	€ 13.838.527	81	€ 13.568.050	1	€ 16.906	17	€ 1.155.624
FONTECCHIO	94	€ 17.026.149	81	€ 13.544.294	2	€ 58.104	11	€ 1.250.098
FOSSA	70	€ 11.775.857	61	€ 11.603.232	0	€ -	9	€ 908.978
OCRE	32	€ 3.966.562	31	€ 4.389.287	1	€ -	0	€ -
POGGIO PICENZE	59	€ 6.516.597	49	€ 4.825.438	0	€ -	10	€ 1.713.930
SAN DEMETRIO	136	€ 27.139.774	107	€ 20.319.129	2	€ 67.380	27	€ 6.453.625
SANT'EUSANIO	64	€ 19.067.744	48	€ 14.644.051	1	€ -	15	€ 3.315.690
TIONE DEGLI ABRUZZI	128	€ 19.593.775	107	€ 16.791.209	0	€ -	21	€ 2.669.123
VILLA SANT'ANGELO	144	€ 39.836.083	130	€ 32.364.632	1	€ 22.437	13	€ 3.587.450
TOT AO8	1259	€ 234.418.412	1077	€ 200.605.349	13	€ 290.171	169	€ 28.103.233

Ai fini di una più completa valutazione dell'attività istruttorio, si dettaglia maggiormente con riferimento ai SAL in attesa di ammissione:

- SAL in istruttoria;
- SAL in integrazione presso i tecnici.


	In istruttoria [n.]	In istruttoria [€]	In integrazione presso i tecnici [n.]	In integrazione presso i tecnici [€]
ACCIANO	6	€ 701.892	3	€ 313.076
BARISCIANO	22	€ 5.128.398	15	€ 905.349
FAGNANO ALTO	10	€ 937.052	7	€ 218.572
FONTECCHIO	7	€ 695.197	4	€ 554.901
FOSSA	7	€ 815.725	2	€ 93.253
OCRE	0	€ -	0	€ -
POGGIO PICENZE	9	€ 1.616.684	1	€ 97.245
SAN DEMETRIO	18	€ 4.831.205	9	€ 1.622.420
SANT'EUSANIO	11	€ 2.077.031	4	€ 1.238.659
TIONE DEGLI ABRUZZI	14	€ 1.714.819	7	€ 954.304
VILLA SANT'ANGELO	8	€ 2.578.696	5	€ 1.008.754
TOT AO8	112	€ 21.096.699	57	€ 7.006.534




Stato di avanzamento della ricostruzione nei centri storici.

La mappatura dello stato di attuazione degli interventi:


✓ Villa Sant'Angelo

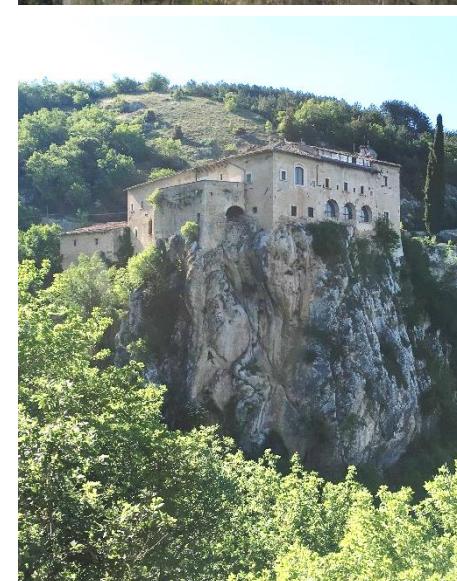

Villa Sant'Angelo, frazione Tussillo

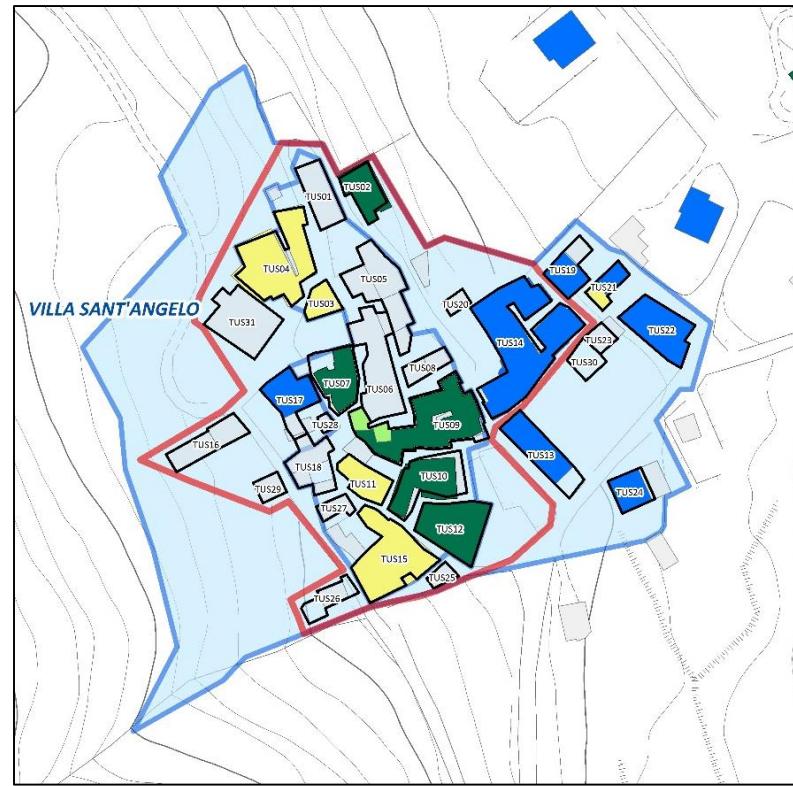

Villa Sant'Angelo, capoluogo

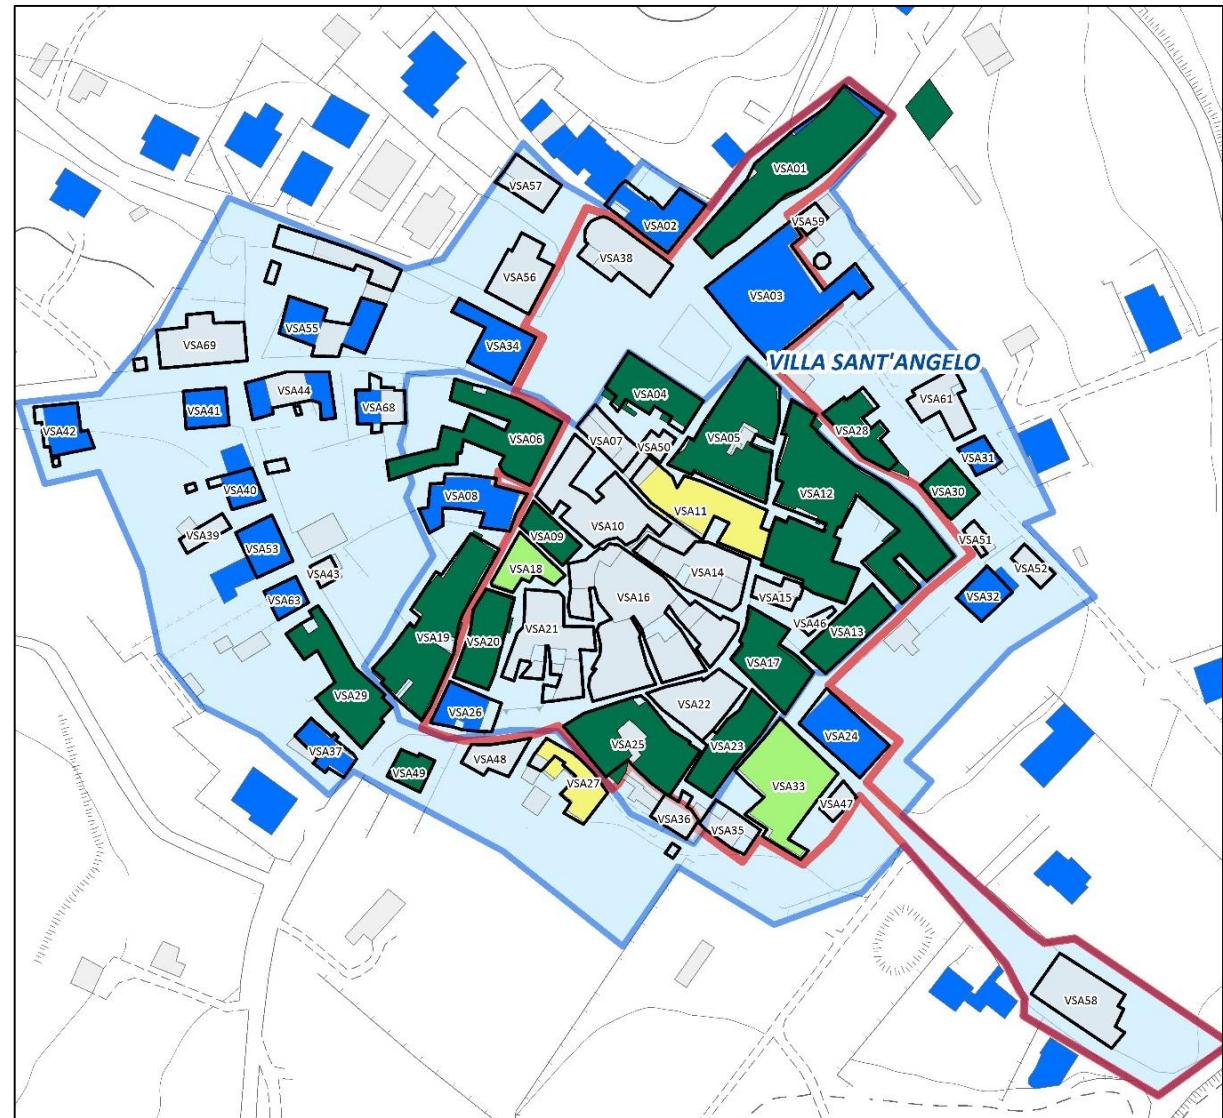

Comune di
Villa Sant'Angelo
Villa Sant'Angelo
Tussillo

Elaborato:
STATO DI AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE
(aggiornamento dati 21/01/2019)

LEGENDA

- aggregati / ed. singoli
- lavori conclusi
- lavori in corso
- istruttoria conclusa
- in istruttoria / da istruire

AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI CENTRI STORICI DI VILLA SANT'ANGELO RISPETTO AL FABBISOGNO FINANZIARIO STIMATO NEL PIANO DI RICOSTRUZIONE (PDR)

AO	COMUNE	PREVISIONE FINANZIARIA PDR	NUMERO RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE	IMPORTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE	% PRESENTATO	NUMERO INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO	IMPORTO INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO	% AMMESSO
8	VILLA SANT'ANGELO	€ 76.549.038	32	€ 56.149.876	73%	23	€ 43.930.397	57%



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

