

LE ATTIVITÀ DI USRC AD OGGI

NOTA INFORMATIVA
PRIMO SEMESTRE ANNO 2021



SOMMARIO

SOMMARIO

USRC: PRINCIPALI RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2021

1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE

2. PIANI DI RICOSTRUZIONE

3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE

3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

3.2 MIC – MODELLO INTEGRATO CRATERE

3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE

5. GESTIONE FONDI

5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

6. TRASPARENZA

6.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

6.2 WEB-GIS

6.3 CONTRATTI

7. RICOSTRUZIONE PUBBLICA

8. EDILIZIA SCOLASTICA

9. SVILUPPO DEL TERRITORIO

10. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

USRC: PRINCIPALI RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2021



Il primo semestre 2021 ha visto concreti risultati in ogni settore di attività dell'USRC, con una continua innovazione e digitalizzazione nella gestione dei processi interni ed esterni. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti salienti.

RIORGANIZZAZIONE DELL'USRC

E' pienamente avviata l'intera riorganizzazione dell'USRC.

La **nuova macro-struttura** prevede la nomina di un dirigente di Area Tecnica, e 6 posizioni organizzative: 3 tecniche per la ricostruzione privata, 1 amministrativa, 1 contabile ed 1 per il personale.

La riorganizzazione e la certificazione del fondo apposto per l'incentivo al personale servirà a garantire una gestione più efficace e performante. Alla nomina di un magistrato della Corte dei Conti che certificherà il fondo USRC, avvenuta a fine dicembre 2020, sono in fase conclusiva gli atti propedeutici alla piena attuazione delle strategie organizzative dell'Ufficio.

RISORSE UMANE

E' in fase di risoluzione il problema della stabilizzazione delle ca 20 unità con contratto a tempo indeterminato. Resta da risolvere il problema delle evidenti disparità di trattamento tra figure analoghe per mansioni ma con contratti diversi (MIT; RIPAM EELL; Tempi Determinati; Interinali), che determinano disomogeneità che non aiutano una gestione fluida del personale. Sarà necessario puntare a dare parità di trattamento a chi presta servizio presso gli Uffici Speciali per poter garantire la migliore gestione delle risorse umane nella ricostruzione 2009.

DIGITALIZZAZIONE

La gestione a distanza del lavoro a causa della pandemia da Covid-19 è diventata una grande opportunità per far viaggiare le pratiche del cratere e fuori cratere in via esclusivamente digitale, eliminando completamente la carta attraverso **l'ulteriore implementazione della piattaforma digitale USRC**, già creata negli anni precedenti per l'acquisizione dei contratti tra privati per la ricostruzione privata; analogo sviluppo è partito per l'acquisizione della documentazione tecnico contabile da parte dei Comuni, per le rendicontazioni obbligatorie da consegnare annualmente alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

RICOSTRUZIONE PRIVATA

Questi alcuni dei **principali risultati raggiunti nel primo semestre 2021** (dati relativi a comuni del Cratere e Fuori del Cratere):

- **374 milioni di euro** di nuovi finanziamenti per Cratere e Fuori Cratere;
- **240 ulteriori istruttorie avviate nel 2021** di progetti di riparazione con miglioramento sismico di aggregati/edifici, relative a 1900 immobili;
- **830 pratiche con cantieri in corso** di cui **65 avviati nel 2021** relativi a 3500 immobili per un valore di **490 Mln €**;
- lavori conclusi per 400 immobili nel primo semestre 2021.

A partire da aprile 2021 e ogni bimestre, l'USRC pubblica, in specifico report sintetico inviato ai comuni del Cratere, anche le immagini di cantieri in partenza e con lavori appena conclusi al fine di dare concreta immagine alla ricostruzione dei centri storici.

EDILIZIA SCOLASTICA

Nel corso del primo semestre del 2021 sono stati conclusi **4 interventi di edilizia scolastica** di miglioramento/adeguamento sismico e nuova costruzione, per un totale complessivo di **5.813.311,17 €**.

Inoltre sono state trasferite risorse per **2.915.075,01 €** ed assegnate risorse per **4.174.824,84 €** per l'attuazione degli interventi in corso.

SVILUPPO DEL TERRITORIO

Dopo l'approvazione, nel 2020, del primo PIT - Progetto Integrato per il Turismo (Area Omogenea 4, "Terre della Baronìa", per un importo di € 5.353.716,39), nel primo semestre 2021 l'USRC ha affiancato la Struttura di Missione nell'istruttoria dei **PIT - Progetti Integrati per il Turismo** proposti dalle restanti 7 Aree Omogenee del Cratere 2009, portando a definizione la proposta per il PIT dell'Area Omogenea n.5 da candidare a finanziamento CIPESS. Sono state inoltre sviluppate le progettualità del territorio del Cratere già avviate nel 2020 in vista dei finanziamenti del **PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (Recovery Fund), relative ai Progetti «*Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani*», per un importo di 70 Mln€, ed «*Abruzzo way of life*», per un importo di 10 Mln€.

RICOSTRUZIONE CHIESE

Sottoscrivendo una convenzione con il MIBACT nel mese di settembre 2020, l'USRC ha offerto collaborazione all'ente competente per la realizzazione degli interventi di **recupero post-sismico delle chiese del Cratere 2009**.

Otto risorse umane USRC (4 RUP e 4 supporti al RUP) offrono le proprie competenze professionali al servizio del Segretariato Regionale del MIBACT per appalti da avviare su 7 chiese; ulteriori collaborazioni e nomine avverranno nel corso del 2021.

E' stato possibile conseguire tali risultati grazie anche al fondamentale contributo di tutti gli altri addetti ai lavori, **150** amministrazioni comunali, e circa **5000** tra presidenti di consorzio, progettisti e direttori dei lavori, ditte appaltatrici, subappaltatori e fornitori.

L'avanzamento della ricostruzione al 30 giugno 2021 nei Comuni del Cratere e fuori Cratere è sinteticamente rappresentato dagli indici che seguono:

Ambito		Numero comuni	Avanzamento	Fabbisogno finanziario residuo
Ricostruzione privata	Comuni Cratere* AO 2-3 (2009-2016)	16	23%	2,4 Mld€
	Comuni Cratere* AO 4-5-6-7-8-9	40	50%	
	Comuni fuori Cratere**	114	61%	0,20 Mld€
Ricostruzione pubblica***	Cratere e fuori Cratere 2009	70	37%	0,46 Mld€
Ricostruzione scuole***	Cratere e fuori Cratere 2009	98	54%	0,13 Mld€

* L'indice di avanzamento della ricostruzione privata cratere è misurato rispetto ai fabbisogni finanziari stimati, distinto tra AO2-3 e restanti AO; rispetto all'importo delle richieste di contributo effettivamente presentate l'indice per tutte le AO è pari al 66%.

** Avanzamento stimato come rapporto tra l'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate rispetto all'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

*** Avanzamento stimato come rapporto tra l'importo degli interventi in corso/conclusi e l'importo già finanziato. Il fabbisogno finanziario residuo stimato tiene conto degli interventi ancora da programmare attraverso programmi pluriennali e piani annuali ai sensi della L. 125/2015, art.11, co.9.

1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE



La Legge 7 agosto 2012, n.134 (cosiddetta “Legge Barca”), artt. 67-bis e 67-ter, ha disposto la cessazione al 31 agosto 2012 dello stato di emergenza successivo al sisma del 6 aprile 2009 ed ha istituito l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, **USRC**), con sede a Fossa (AQ), per le finalità attinenti alla **gestione ordinaria della ricostruzione**, sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, nei territori dei Comuni del Cratere, ad esclusione di L’Aquila, e dei Comuni fuori Cratere (cfr. L.125/2015, art.11, co.13).

L’Intesa¹ dell’agosto 2012, ha disciplinato gli aspetti organizzativi e le competenze istituzionali dell’Ufficio.

La Legge 7 agosto 2012, n.134, ha assegnato all’USRC, tra l’altro, il coordinamento degli otto Uffici territoriali per la ricostruzione (di seguito, UTR), costituiti ai sensi dell’OPCM n.4013 del

2012 dai Comuni di ciascuna Area Omogenea per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati.

Dal 1° luglio 2018 gli UTR sono stati soppressi e le relative competenze sono state trasferite all’USRC (co.32, art.2-bis, L. n.172/2017). Da allora, il Titolare dell’USRC ha in capo la direzione ed il coordinamento esclusivi del personale in servizio presso gli UTR, assegnato anch’esso all’USRC (co.3, art.22, L.55/2019), nonché la gestione del processo di soppressione di detti Uffici attraverso specifici provvedimenti organizzativi e gestionali. In una fase transitoria, sono stati costituiti, tramite convenzioni con i Comuni, 8 Sportelli Decentrati dell’USRC (di seguito, SP) presso le medesime sedi dei soppressi UTR.

A partire dal 2019, la **riorganizzazione** ha avuto maggiore impulso con la definitiva soppressione di 3 degli 8 Sportelli Decentrati ed il trasferimento del relativo personale presso la sede dell’USRC a Fossa (AQ). Contestualmente, nell’anno 2019 è stato posto in essere anche l’accentramento delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, la cui gestione è transitata dai soppressi UTR all’USRC.

In esito all’evoluzione normativa sopra descritta, l’USRC, oltre al **coordinamento del processo di ricostruzione privata**, condotto sin dall’avvio dell’Ufficio nel 2013, ha oggi in capo direttamente anche l’istruttoria tecnico-amministrativa delle **richieste di contributo** per la ricostruzione privata.

¹ Intesa sottoscritta ai sensi dell’ art. 67-ter della Legge 7 agosto 2012, n.134.

La competenza per l'istruttoria dei contributi alla ricostruzione privata va ad aggiungersi alle altre competenze assegnate all'Ufficio sin dalla sua istituzione. L'USRC, infatti, cura la programmazione ed istruttoria tecnica degli interventi di **ricostruzione pubblica** e del **Piano "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza"**, cura l'attuazione dei **Piani di Ricostruzione** (dei quali ha effettuato l'istruttoria nel profilo di congruità economica), cura l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, gestisce la **contabilità speciale**, effettua il **monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi**, cura la trasmissione periodica dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, effettua la gestione delle assegnazioni e dei trasferimenti dei fondi per la ricostruzione privata, promuovere l'attrattività e lo **sviluppo economico e sociale del territorio del cratere**.

L'USRC è inoltre competente anche per la ricostruzione dei **Comuni fuori Cratere** (cfr. L. 71/2013, art.7, co.6; L.125/2015, art.11,

co.13) per ciò che attiene alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata ed ai trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione.

Nel corso del 2020 l'attività istruttoria per la ricostruzione privata ha avuto una fase di **significativa crescita ed ottimizzazione di processo**, con l'evasione di più della metà delle pratiche giacenti in attesa di istruttoria. Le misure organizzative adottate per far fronte all'emergenza pandemica da COVID-19, con la conduzione delle attività lavorative in smart working a far data da marzo 2020, hanno assicurato la continuità dell'azione amministrativa, il servizio all'utenza e la celere conclusione dei procedimenti.

Al contempo, è stata potenziata la **digitalizzazione** delle procedure e degli strumenti di gestione documentale interna ed esterna, nell'obiettivo di realizzare nel breve termine un'amministrazione "full digital" con la totale dematerializzazione degli atti.


2. PIANI DI RICOSTRUZIONE

La Legge n. 77 del 24 giugno 2009, di conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, all'art.14, co.5-bis, ha previsto che la ricostruzione dei centri storici dei Comuni del cratere avvenga previa predisposizione dei Piani di Ricostruzione, i cui obiettivi, contenuti e procedura di approvazione sono definiti dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010.

Dei 56 Comuni del Cratere, **55 Comuni hanno predisposto il PdR** e sono pervenuti alla conclusione dell'iter di approvazione. Di questi:

- **11 Comuni** hanno raggiunto l'Intesa sul PdR tra Sindaco, Presidente della Provincia e Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, nel corso dello stato di emergenza;
- **44 Comuni** (2 dei quali, Barete e Barisciano, con riferimento agli Ambiti non oggetto di Intesa nella fase emergenziale) hanno ottenuto l'attestazione della congruità economica del PdR con Nulla osta dell'USRC, nella gestione ordinaria.

L'USRC ha stimato le risorse residue occorrenti per la ricostruzione del centro storico di **1 Comune**, Torre de' Passeri, unico nel Cratere a non aver predisposto il PdR, non avendo raggiunto nel corso dello stato di emergenza l'Intesa sulla Perimetrazione del centro storico (art.3, DCD 3/2010).

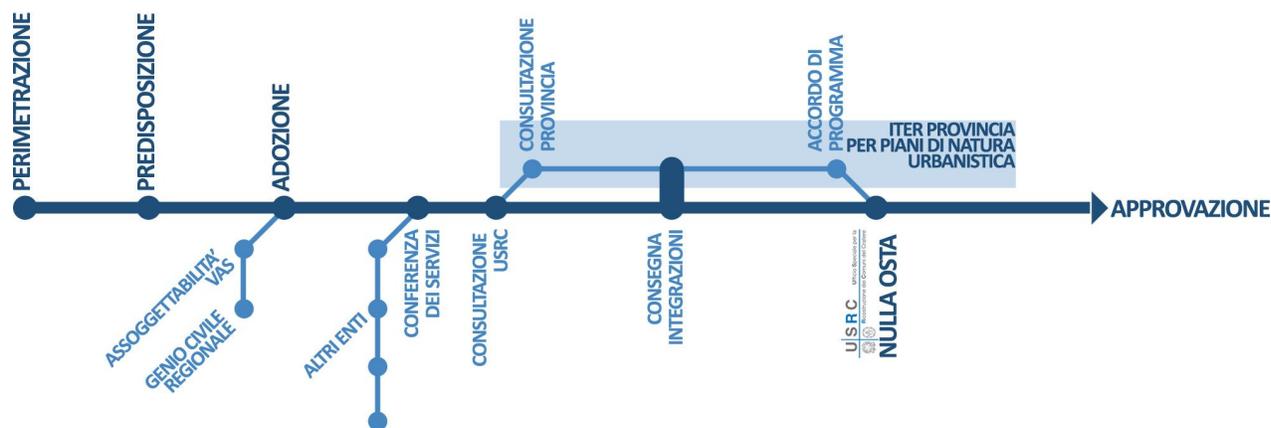



La **Legge n. 134 del 7 agosto 2012**, all'art. 67-quinquies, ha attribuito al Piano di Ricostruzione **natura strategica** come tale, è finalizzato a quantificare le esigenze finanziarie per la ricostruzione e a disciplinare le modalità di attuazione ed il cronoprogramma degli interventi di ricostruzione del centro storico – ovvero, se asseverato dalla Provincia, anche **urbanistica**, qualora abbia contenuti urbanistici che aggiornano, modificano, integrano o sostituiscono gli strumenti di pianificazione vigenti.

Dei Piani di Ricostruzione approvati dai **55 Comuni del Cratere**, **8** hanno **natura strategica**, mentre **47** hanno natura anche **urbanistica**.

A conclusione del processo di pianificazione, il quadro programmatico delle risorse necessarie per la ricostruzione dei centri storici dei 56 Comuni del Cratere ammonta a complessivi **3,4 Mld €**, di cui **3,1 Mld €** per interventi di **ricostruzione privata** e **0,3 Mld €** per interventi di **ricostruzione pubblica**.


3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE

3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere è stimato un fabbisogno finanziario complessivo pari a **4,75 Mld €**, così articolati:

- **4,1 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati nei centri storici (dei quali **3,1 Mld €** all'interno degli Ambiti dei Piani di Ricostruzione e **1,0 Mld €** all'esterno);
- **0,4 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati fuori dai centri storici ("periferie");
- **0,25 Mld €** necessari alla copertura dei maggiori costi dovuti all'aggravamento del danno causato dal sisma 2016, a valere sulle risorse della contabilità del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Centro Italia (art.4, D.L. 189/2016).



Dal **2009 ad oggi**, nei 56 Comuni del Cratere sono stati ammessi contributi agli interventi di ricostruzione privata per un importo complessivo pari a **1,97 Mld €** (dato periferia + centro storico, esclusi gli importi dei contributi ad interventi su edifici con esito di agibilità A), pari al **42%** del fabbisogno finanziario previsto, distribuiti nel tempo come da grafico che segue (dato al 30/06/2021 con monitoraggio al 30/04/2021). Nel solo anno 2021, sono stati ammessi contributi per un importo pari a **122 Mln €**.

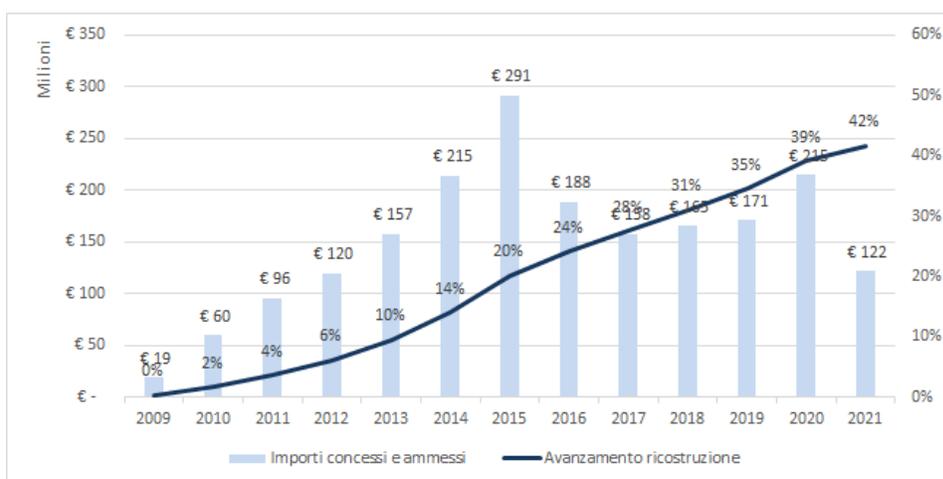

*Ammissioni:
Avanzamento nel
tempo della
concessione dei
contributi alla
ricostruzione privata
nei Comuni del Cratere
(Milioni di euro, dati al
30/06/2021).*

Il dato medio del cratere (42%) deve essere rapportato alle specificità della singola Area omogenea. I valori medi per Area omogenea variano infatti tra un minimo del 21% (AO2) ad un massimo del 70% (AO5):

- le **Aree omogenee n. 2 e 3** registrano un indice di avanzamento della ricostruzione privata pari al **23%** del fabbisogno previsto, in quanto tali aree sono state interessate anche dal sisma del 2016 e dalle problematiche legate alla sovrapposizione del danno tra i 2 terremoti (12 Comuni del Cratere sisma 2009, situati nelle AO n.2 e n.3, appartengono anche al Cratere sisma 2016).
- le **restanti Aree omogenee** del Cratere (**n. 4, 5, 6, 7, 8, 9**), invece, registrano un indice di avanzamento della ricostruzione privata significativamente superiore della media dell'intero cratere, attestandosi al **50%**.

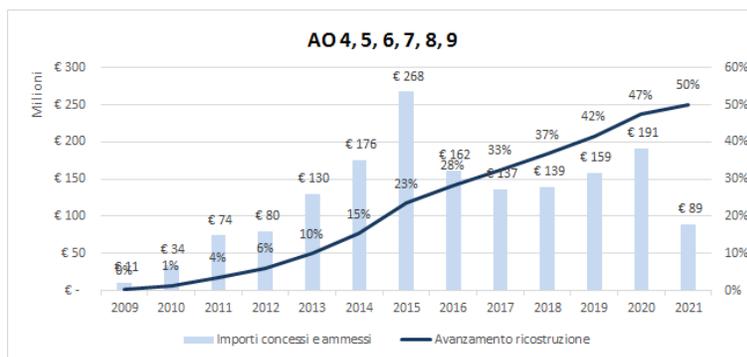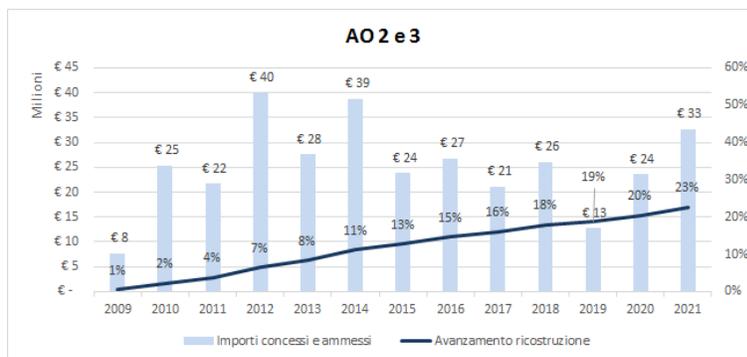


Ammissioni: Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere. Specifica per AO (Milioni di euro, dati al 30/06/2021).

Area	Atteso	Ammesso	Percentuale
AO2	€ 1.076	€ 226	21%
AO3	€ 369	€ 101	27%
AO4	€ 221	€ 77	35%
AO5	€ 298	€ 214	72%
AO6	€ 558	€ 235	42%
AO7	€ 256	€ 140	55%
AO8	€ 1.549	€ 748	48%
AO9	€ 411	€ 229	56%
Totale	€ 4.738	€ 1.971	42%

Ammissioni: Percentuale di Ammissione a contributo per singola Area omogenea (Milioni di euro, dati al 30/06/2021)

Se fin qui si è riferito dell'avanzamento della ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere in relazione ai fabbisogni finanziari stimati, occorre tuttavia porre l'attenzione sulla capacità di risposta dell'apparato pubblico alla reale domanda del territorio, focalizzando l'attenzione sulla performance del processo di ammissione contributi rispetto alla effettiva richiesta. **L'attuale avanzamento della ricostruzione privata nei Comuni del Cratere in relazione alle richieste di contributo effettivamente presentate è pari al 66%**, come da grafico che segue (aggiornato al 30/06/2021).

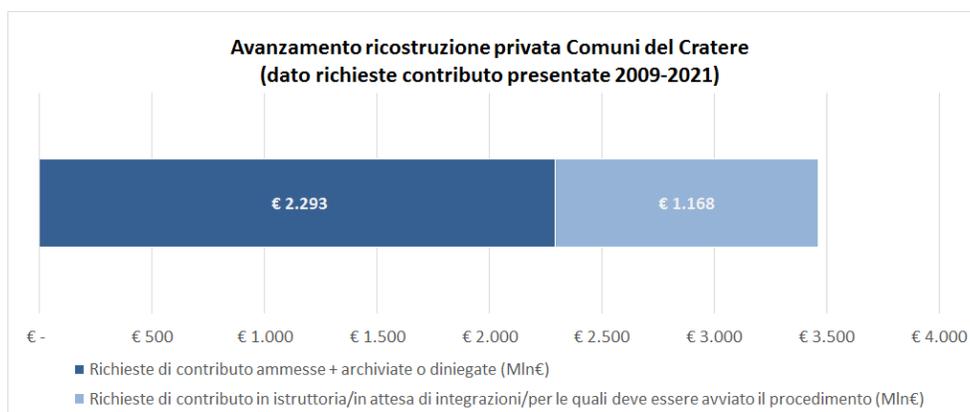




L'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari a **2.293 Mln €**, equivale al **66%** dell'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.




Più nel dettaglio, dal 2009 ad oggi risultano presentate complessivamente, sia presso i Comuni che presso l'USRC e gli Sportelli Decentrati (ex UTR), richieste di contributo per interventi di ricostruzione privata (esclusi gli edifici con esito A) nei Comuni del Cratere pari a **3.462 Mln €**. Di queste, risultano:

- Richieste di contributo **ammesse** per un importo complessivo di **1.971 Mln €**;
- Richieste di contributo **archivate o diniegate**, il cui procedimento è stato chiuso senza ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte dell'interessato per un importo complessivo di **322 Mln €**;
- Richieste di contributo **attualmente in istruttoria** per un importo complessivo di **357 Mln €**;
- Richieste di contributo **attualmente in attesa di integrazioni** per un importo complessivo di **535 Mln €**;
- Richieste di contributo **per le quali deve essere avviato il procedimento** per un importo complessivo di **275 Mln €**.

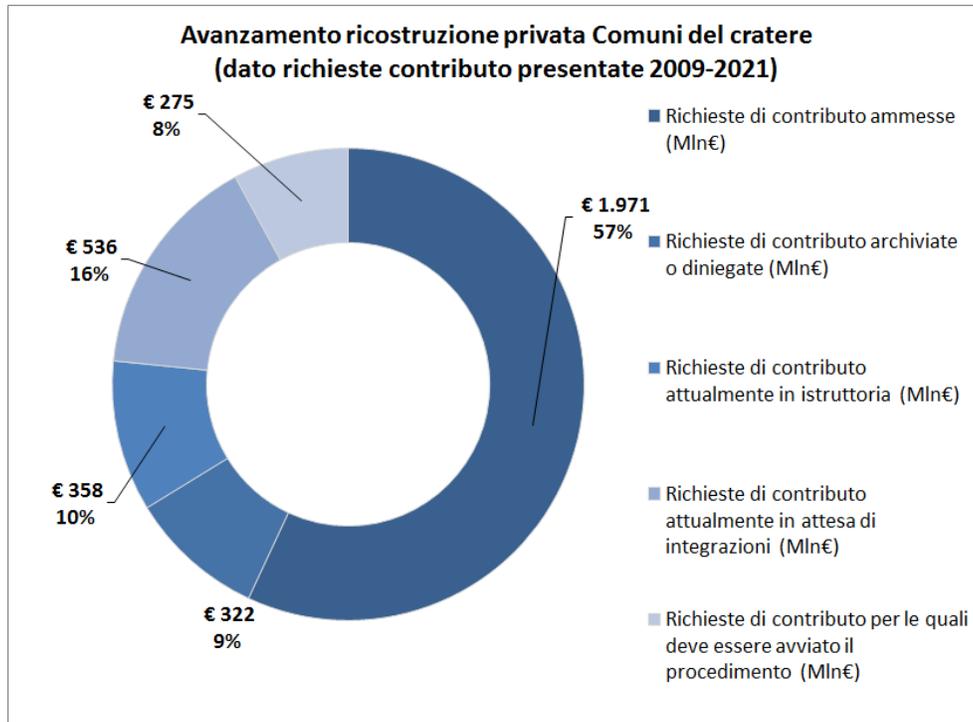

L'USRC, dal 2019, è al lavoro per ridurre il numero di richieste di contributo in attesa di istruttoria, recuperando le giacenze passate (in riferimento a quelle effettivamente in gestione da parte dell'USRC e degli Sportelli Decentrati). Lo stato al 30/06/2021 dei procedimenti istruttori per le istanze relative alla ricostruzione privata (in gestione da parte dell'USRC e Sportelli Decentrati) è raffrontato a quello di fine 2018, 2019 e 2020 nella figura seguente.

	Presentate		Ammesse		Archiviazione e dinieghi		Da Istruire		Di cui già avviata l'istruttoria		In integrazione	
	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]
2018	3434	€ 2.307.704.156	1398	€ 980.105.223	755	€ 216.527.969	792	€ 683.733.627	251	€ 282.185.841	460	€ 299.180.104
2019	3772	€ 2.670.535.046	1544	€ 1.162.677.569	811	€ 233.123.981	957	€ 781.117.987	265	€ 183.888.209	489	€ 323.929.347
2020	4061	€ 2.845.348.020	1715	€ 1.308.235.294	863	€ 266.478.314	677	€ 439.616.909	303	€ 155.085.096	802	€ 647.429.879
2021	4185	€ 2.966.854.834	1815	€ 1.406.363.766	962	€ 316.450.511	655	€ 505.522.917	347	€ 220.511.105	753	€ 549.328.962

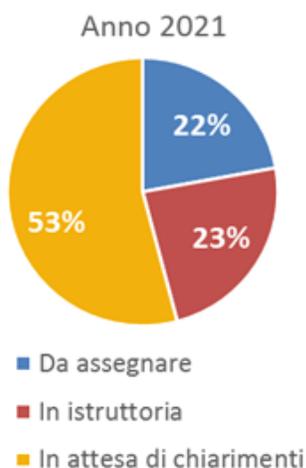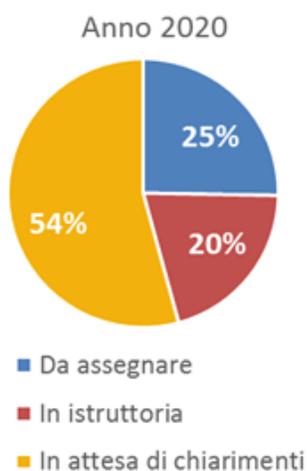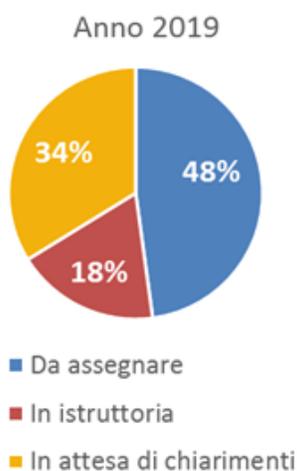

Delle 957 istanze da istruire a fine 2019, 550 sono state assegnate nel corso del 2020, per un importo di 350 Mln €. Nel 2020 si registra un aumento del numero di pratiche assegnate per la conseguente istruttoria rispetto al 2019, con un incremento pari al 13%. Nel 2021 diminuisce ancora la percentuale di pratiche in attesa di essere istruite.

3.2 MIC – MODELLO INTEGRATO CRATERE


Per la ricostruzione dei Centri Storici dei 56 Comuni del Cratere, la procedura parametrica **MIC - Modello Integrato Cratere**, introdotta con Decreto USRC n.1/2014, ha regolamentato i criteri per la determinazione ed il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata (DPCM 4/2/2013).

Attraverso il MIC-Modello Integrato Cratere, dal 2014 ad oggi, sono state presentate **2186** richieste di contributo, per un importo totale di circa **2.474 Mln €**. Di queste ad oggi sono state **ammesse 1016 MIC** per un importo di **1.191 Mln €** (e 208 chiusure del procedimento senza ammissione). Alle istanze ammesse corrispondono 788 cantieri MIC avviati e 355 cantieri con lavori già terminati a cui corrisponde il ripristino della agibilità.

Schede MIC Presentate [numero]	Schede MIC Presentate [importo]	Schede MIC Ammesse [numero]	Schede MIC Ammesse [importo]	Cantieri MIC	Cantieri MIC chiusi
2.186	2.474 Mln €	1016	1.191 Mln €	788	355

3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

Per quanto riguarda lo **stato di avanzamento** in termini di **cantieri e SAL**, dal 2009 ad oggi è stato liquidato un importo complessivo pari a **1,22 Mld €** (dato periferia + centro storico, esclusi gli interventi su edifici con esito A).

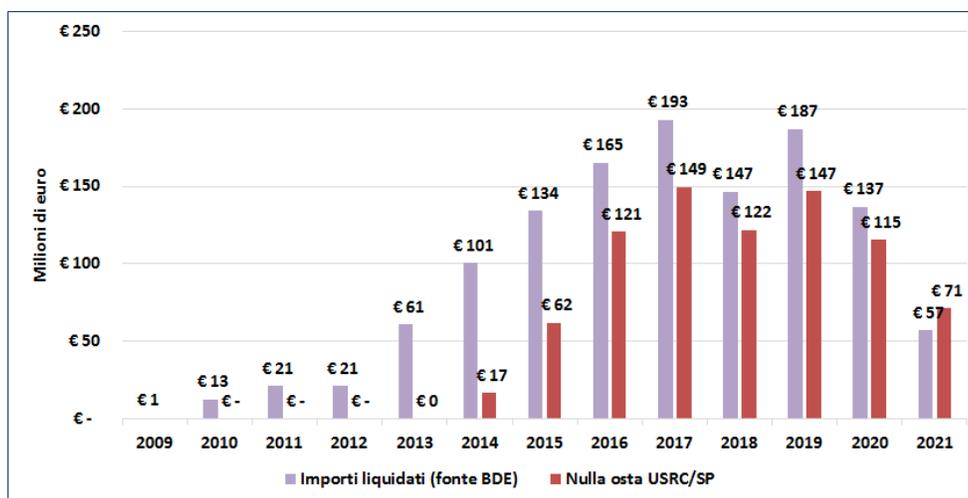

SAL: Avanzamento nel tempo delle erogazioni a seguito di nulla osta SAL per la ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (dati al 30/06/2021)

Area	Capofila	Perc.	Importo	Di cui USRC/SP
2	Barete	10%	€ 127.963.762	€ 62.977.436
3	Montorio al Vomano	6%	€ 72.207.917	€ 15.133.117
4	Castel del Monte	4%	€ 47.154.006	€ 45.702.279
5	Bussi sul tirino	14%	€ 168.407.227	€ 118.013.589
6	Caporciano	11%	€ 138.563.651	€ 92.075.196
7	Goriano Sicoli	7%	€ 90.966.114	€ 51.898.654
8	Barisciano	37%	€ 452.190.211	€ 263.746.809
9	Rocca di Mezzo	11%	€ 131.492.756	€ 83.440.409

SAL: Distribuzione degli importi totali dei contributi liquidati tra le aree omogenee - SAL. (dati al 30/06/2021)

Il dato delle liquidazioni SAL per l'avanzamento dei cantieri dell'ultimo biennio è positivo, tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 intervenuta nel 2020. Tale risultato è ottenuto anche grazie alle innovazioni introdotte dal 2019, quali la semplificazione degli adempimenti istruttori delle richieste di liquidazione dei SAL (Circolari USRC n. 12/2019 e n. 13/2019) e la digitalizzazione dell'acquisizione documentale attraverso una piattaforma telematica che, a far data da aprile 2020, ha permesso di gestire il 75% delle richieste di liquidazione dei SAL.

Gli **immobili**, nei Comuni del Cratere, per i quali sono terminati i lavori al 30 giugno 2021, sono stimati in circa **9565**, su un totale stimato di circa 23.240 abitazioni inagibili alla data del 2009. Gli immobili con lavori terminati nel 2020 sono circa 1350. Quelli invece riconducibili ai SAL Finali presentati nel primo semestre 2021 circa 368. I **cantieri** di ricostruzione privata **attualmente attivi sono 659** (dato al 30/06/2021).


Cantieri	
Totali Attivi	659
Di cui	
In Centro Storico e PdR	502⁽¹⁾
Fuori Centro Storico	157
(1) 421 riferibili alla procedura parametrica MIC	

Immobili con lavori terminati	
9565⁽²⁾	
(368)	
Di cui	
Prime Abitazioni	Altro (seconde ab e altri usi)
3330	6235
(2) escludendo i 9.689 interventi realizzati su abitazioni con esito di agibilità A.	
Tra parentesi il dato relativo al solo 2021, quota parte del dato superiore.	

3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

Si riportano di seguito le immagini di alcuni cantieri conclusi e avviati recentemente.

Comune di Castelvecchio Subequeo - Agg. n. 13 - Esito "E" - 4.984.289,71 €
Cantiere chiuso nel primo semestre del 2021

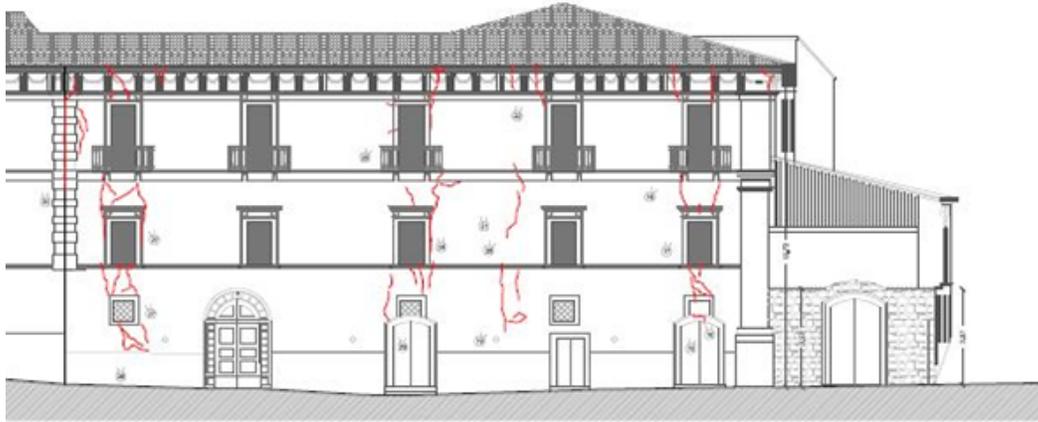

Comune di Castel di Ieri - Agg. n.6 - Esito "E" - 2.291.146,75 €
Cantiere in corso e aperto nel primo semestre del 2021




4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE

Dal 2013 l'USRC è competente (L. 71/2013, art. 7, co. 6) per i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione ricadenti nel territorio dei Comuni fuori Cratere, ovvero in quei Comuni abruzzesi che, pur non ricompresi nel Cratere sismico, hanno comunque riportato danni aventi nesso di causalità diretto con il sisma del 6 aprile 2009 (art. 1, co. 3, L.77/2009).

Si tratta di complessivi 114 Comuni, di cui 34 nella provincia dell'Aquila, 32 nella provincia di Teramo, 42 nella provincia di Pescara e 6 nella provincia di Chieti.

L'USRC, a partire dal gennaio 2019, ha preso in carico le **attività istruttorie** inerenti le richieste di contributo e SAL per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni fuori Cratere. Tale competenza - inizialmente attribuita, a far data dal 2014, agli UTR - Uffici Territoriali per la Ricostruzione "di frontiera" (competenti per l'Area omogenea del Cratere geograficamente prossima ai Comuni fuori cratere interessati), coordinati dall'USRC (Del. CIPE n. 1/2014; L.125/2015, art.11, co.13) - è stata trasferita integralmente all'USRC dal 2018, a seguito della soppressione degli UTR (L.172/2017).

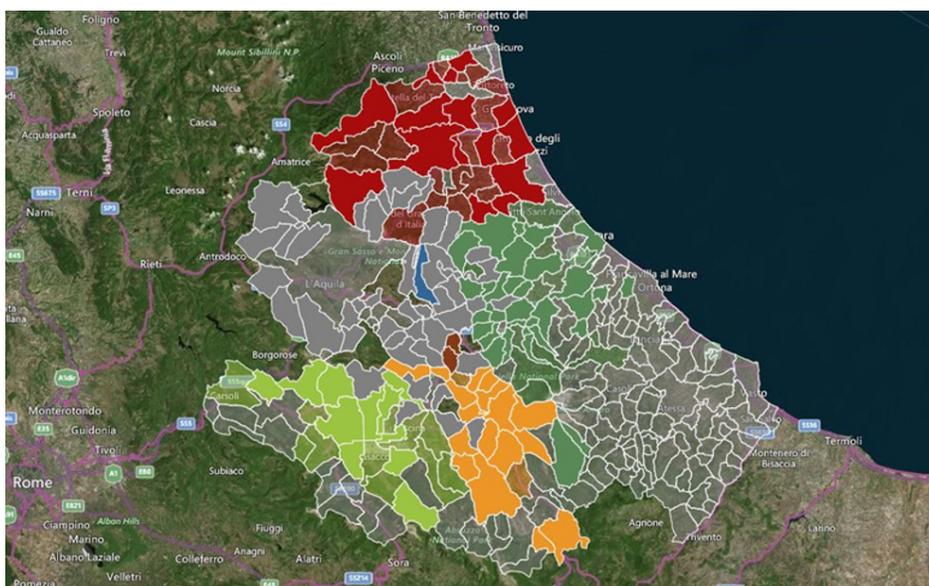


I contributi ammessi per la ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, dal 2009 ad oggi, ammontano a circa **480,7 Mln €**, di cui:

- **85,36 Mln €** ammessi con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti (finanziamento agevolato) nel periodo 2009-2012;
- **385,75 Mln €** ammessi sul canale del contributo diretto.


Ad essi si aggiungono le richieste di contributo archiviate o diniegate, per un importo di **28,1 Mln €**.

L'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari a **499,21 Mln €**, equivale al **61%** dell'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

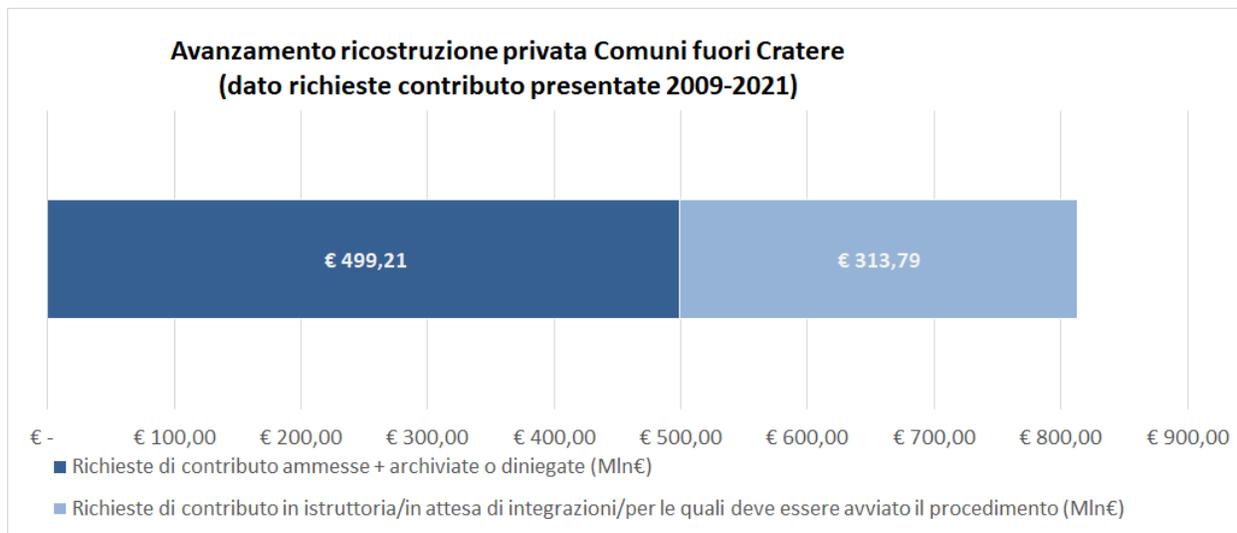

L'USRC, a far data dal 2019, ha preso in carico **803** richieste di contributo giacenti, per un importo totale pari a circa **182,00 Mln €**, delle quali **655** è stato avviato il procedimento (**148 Mln €**). In particolare, risultano:

- Richieste di contributo in **istruttoria** per un importo complessivo di **69,7 Mln €**;
- Richieste di contributo in **attesa di integrazioni** per un importo complessivo di **46,5 Mln €**;
- Richieste di contributo **ammesse** per un importo complessivo di **10,6 Mln €**;
- Richieste di contributo **archivate o diniegate**, il cui procedimento è stato chiuso senza ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte dell'interessato, per un importo complessivo di **21,7 Mln €**;
- Richieste di contributo **per le quali deve essere avviato il procedimento** per un importo complessivo di **33,5 Mln €**.

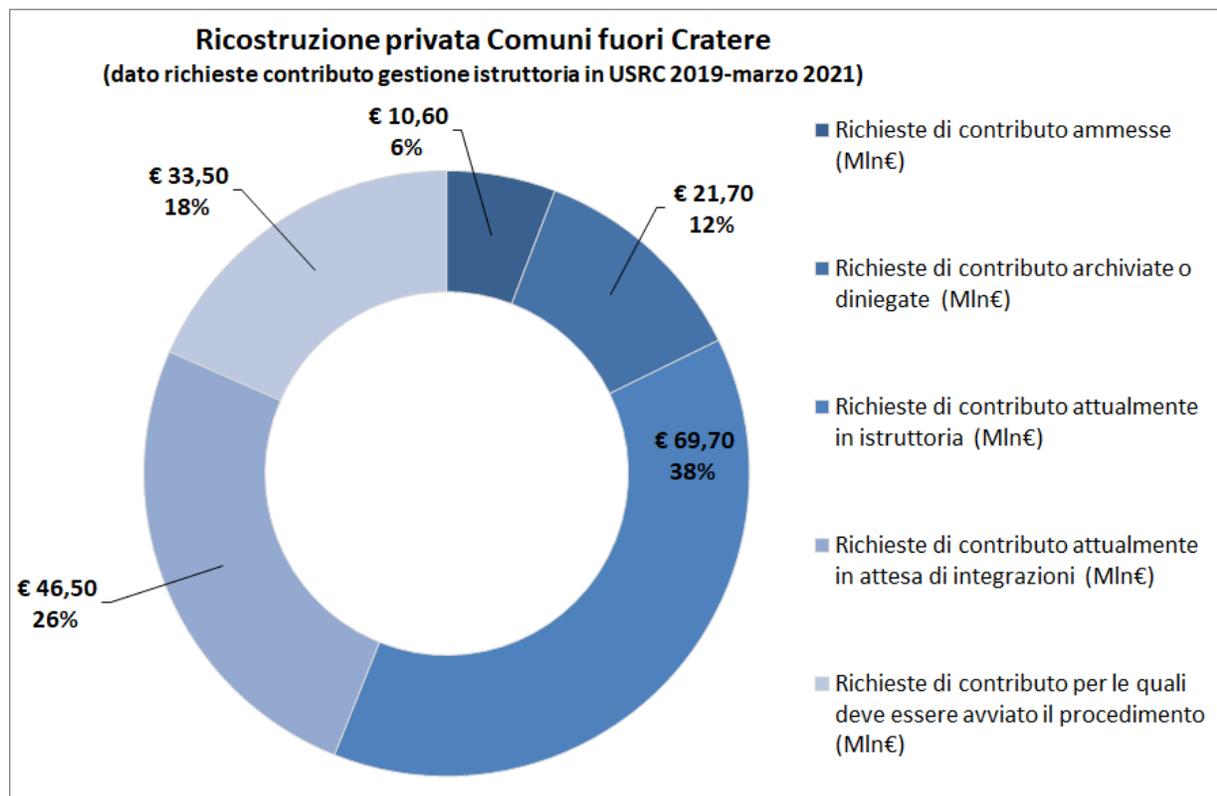

Nel solo anno 2021, sono stati ammessi contributi per un importo pari a **0,9 Mln €**.

L'USRC, a far data dal 2019, ha gestito inoltre **228** richieste di liquidazione **SAL** per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, di cui **175 liquidate, per un importo complessivo di 19,7 Mln €**. Nel solo anno 2021, sono stati liquidati **32 SAL** per un importo pari a **3,5 Mln €**.

Le **abitazioni**, nei Comuni Fuori Cratere, per le quali è stata ripristinata l'agibilità, sono stimate in circa **1.900**, su un totale di circa 3.610 abitazioni inagibili alla data del 2009. Le abitazioni tornate agibili nel 2021 sono circa 101. I **cantieri** di ricostruzione privata **attualmente in corso sono 230**, di cui 3 avviati nel 2021.

5. GESTIONE FONDI



L'USRC esegue il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata nei Comuni del Cratere e fuori Cratere (art. 4, Decreto MEF del 29 ottobre 2012), che è inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato sul sito www.usrc.it.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per la ricostruzione privata sul canale diretto aggiornato al **30/06/2021**:

RICOSTRUZIONE PRIVATA	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPEGNATE	RISORSE TRASFERITE
Comuni cratere	€ 1 193 853 630,95	€ 1.101.454.588,701	€ 841.548.971,45
Comuni fuori cratere	€ 346.770.424,74	€ 329.628.083,77	€ 267.197.590,98

Ai sensi delle Delibere CIPE n. 23/2014 e n. 22/2015, l'USRC cura inoltre l'assegnazione e trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni del Cratere e fuori cratere. Le risorse sono assegnate ai singoli Comuni per i soli interventi immediatamente attuabili e solo nel caso in cui siano state integralmente impegnate le risorse precedentemente assegnate. In tal modo sono garantiti l'efficiente utilizzo delle risorse per la ricostruzione privata e la corretta allocazione delle stesse nei Comuni con maggiore capacità di spesa.

5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 30/06/2021, raggiunge un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di 1.817 Mln € (2.023 Mln € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 30/06/2021 **l'USRC ha assegnato** complessivamente 1.138 Mln€, di cui trasferiti 908 Mln €.

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC	€ 1.193.853.630,95	
B. Totale utilizzi USRC Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni del cratere		1.137.699.501,93 €
C. Totale Disponibile Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Cratere		€ 56.154.129,02

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 54 Comuni del Cratere e rappresentano circa il 66% del totale delle risorse assegnate dal 2009.



L'aggiornamento dei dati è pubblicato sul sito istituzionale dell'USRC, al seguente link:

[Gestione fondi comuni del cratere](#)

Nel primo semestre del 2021 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 104.749.600,17** a 33 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati finanziamenti a 39 comuni per complessivi **€ 103.620.617,42**.

5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 30/06/2021, raggiunge un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di **436.637.644,33** Mln € (85.034.287,93 Mln € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 30/06/2021 **l'USRC ha assegnato** € 329.628.083,77 di cui trasferiti € 267.197.590,98;

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC	€ 346.770.424,74	
B. Totale utilizzi USRC Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni Fuori Cratere		€ 329.628.083,77
C. Totale Disponibile Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Fuori Cratere		€ 17.409.459,38 (comprensivi residui gestioni precedenti)

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 114 Comuni del Fuori Cratere e rappresentano circa il 90% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

Nel corso dell'anno **2021** sono stati complessivamente **trasferiti** da parte dell'USRC **€ 13.822.471,62** a 28 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati finanziamenti a 4 Comuni per complessivi € 2.580.702,13;

6. TRASPARENZA



6.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

Per gli interventi localizzati nei Comuni del Cratere, sul sito istituzionale dell'USRC sono pubblicate, con aggiornamento settimanale, le informazioni relative allo stato dell'istruttoria delle richieste di contributo e degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) depositate presso l'USRC, accessibili senza restrizioni da parte degli interessati al seguente link:

[Verifica lo stato della pratica](#)

6.2 WEB-GIS

L'USRC, oltre alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, con cadenza bimestrale, del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione privata, ha reso disponibili ai soggetti interessati i dati del monitoraggio mediante geolocalizzazione su mappa in apposito web-GIS, accessibile dal sito istituzionale dell'USRC.

6.3 CONTRATTI

L'USRC effettua l'acquisizione dei contratti relativi agli interventi di ricostruzione privata, localizzati nei Comuni del Cratere e fuori Cratere, da parte dei committenti e ne effettua la trasmissione ai comuni interessati, per gli idonei controlli (art. 67-quater, co.8, L. n. 134/2012; art. 11, co.1, L. n. 125/2015). La procedura, a far data dal gennaio 2019, avviene interamente on line.

Al 30 Giugno 2021 risultano acquisiti contratti in numero di **9.128** relativi a 2.422 richieste di contributo e a 115 Comuni, per un importo complessivo di **2.413.519.619,62 €**.

6.4 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Con determina del Titolare n. 56 del 31.01.2020, l'USRC si è dotato del **Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza** per il triennio 2020-2022.

Il Piano, adottato in esito ad una procedura pubblica che ha consentito forme di partecipazione degli stakeholders interessati, sposa un'interpretazione ampia del concetto di fenomeno corruttivo al fine di reprimere ed ancor prima prevenire ogni fenomeno di *maladministration*, idoneo anche solo potenzialmente a sviare il corretto esercizio del potere pubblico nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ufficio. Il PTPCT è accessibile in formato aperto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'USRC al seguente link:

[Piano triennale per la prevenzione della corruzione](#)



7. RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati **354** interventi di ricostruzione pubblica nei Comuni del Cratere per complessivi **222,4 Mln €**, **331** dei quali nel corso della gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un importo pari a **207,5 Mln €**. Tali interventi riguardano il ripristino, a seguito del danneggiamento arrecato dal sisma 2009, di beni pubblici, quali Case Comunali, Reti infrastrutture, Edilizia Residenziale Pubblica, Centri di Aggregazione, Edilizia Cimiteriale.

Nel rispetto del riparto di competenze previsto nella gestione ordinaria, l'USRC dal 2013 cura la programmazione delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica, effettua il trasferimento delle somme e cura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (Decreto del MEF del 20/10/2012).

Le principali fonti di finanziamento degli interventi di Ricostruzione pubblica, dal 2013 ad oggi, sono:

Delibera CIPE 135/2012, a valere sulla quale è stata definita la **Programmazione triennale della Ricostruzione Pubblica (2013 - 2015) dei Comuni del Cratere** per un importo complessivo di **126,45 Mln €**;

Delibera CIPE n. 48/2016, che ha definito gli indirizzi, i criteri e le modalità per la predisposizione dei **“Programmi pluriennali di intervento di settore”** e dei relativi

“Piani annuali di attuazione”, al fine di razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica, in linea con le previsioni del DL n. 78/2015, ed ha approvato un “Piano Stralcio”, che finanzia interventi nei Comuni del Cratere per complessivi **14,5 Mln €**;

Delibera CIPE n. 24/2018, che ha approvato il Piano annuale 2018 relativo al Settore 4 - “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” ed ha assegnato risorse all’USRC per complessivi **21,3 Mln €**, destinati a **21** interventi nei Comuni del Cratere e a **14** interventi nei Comuni fuori Cratere;

Delibera CIPE n. 18/2020, che ha approvato il secondo Piano annuale 2020 relativo al Settore 4 - “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” ed ha assegnato risorse per un importo di **30,3 Mln €** all’USRC per l’attuazione di 37 interventi in Comuni del Cratere e fuori Cratere.

Dal 2013 ad oggi, sono **190 i progetti finanziati in via definitiva**, per complessivi **73.6 Mln €**, che rappresentano complessivamente oltre il 60% degli interventi programmati. Di questi:

- **107** interventi sono ultimati o in fase di collaudo, per un importo pari a **28,6 Mln €**;
- **28** interventi con lavori in corso, per un importo pari a **21,8 Mln €**;
- **55** interventi per i quali è in corso l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori, per un importo pari a **23,2 Mln €**.


Risultano inoltre oltre **120 interventi programmati**, con una copertura finanziaria di complessivi **88,8 Mln €**.

Dal 2013 ad oggi sono state complessivamente trasferite ai Comuni del Cratere risorse per **€ 47.499.477,42** per il pagamento dei lavori eseguiti.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per la ricostruzione pubblica nel **periodo 2013-2021**:

RICOSTRUZIONE PUBBLICA	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPEGNATE	RISORSE TRASFERITE	RISORSE SPESE
Ricostruzione pubblica (esclusi interventi emergenziali, DPC, Provveditorato, Mibact, ATER)	€ 177 966 712,63	€ 78 200 725,13	€ 79 896 276,50	€ 47.499.477,42

Stato di attuazione degli interventi di Ricostruzione pubblica (dato al 30/06/2021)

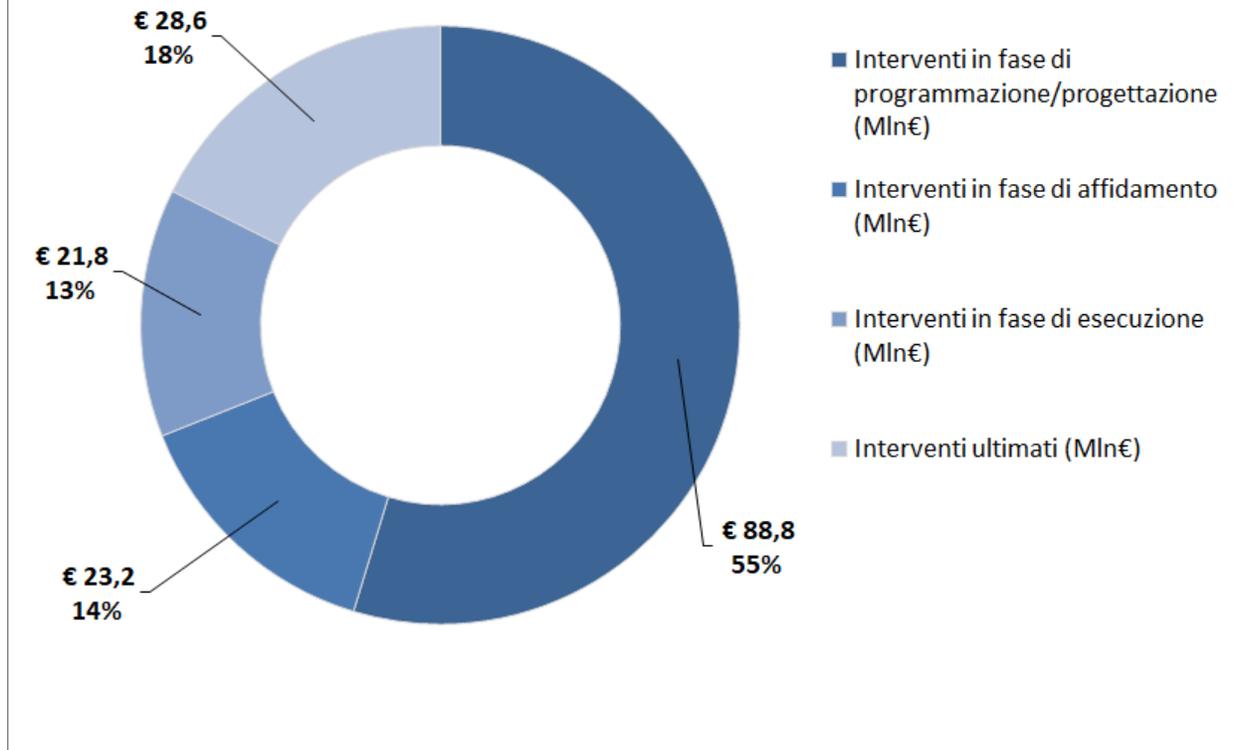

Nel corso del primo semestre del 2021 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC € **1.256.447,59** per interventi pubblici e sono stati assegnati finanziamenti per 3 interventi pari a € **633.830,08**.

ALCUNI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CONCLUSI



Comune di **Barisciano (AQ)** - Municipio
€ 1.692.000,00



Comune di **Villa Sant'Angelo (AQ)** - Municipio
€ 293.431,00



Comune di **Navelli (AQ)** - Municipio
€ 1.721.347,51



Comune di **Carapelle Calvisio (PE)** - Municipio
€ 398.887,00



Comune di **Navelli (AQ)** - Complesso cimiteriale e
Chiesa di S.Maria in Cerulis
€ 961.000,00 €



Comune di **San Pio delle Camere (AQ)** - Municipio
€ 1.149.743,00

8. EDILIZIA SCOLASTICA



Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati **245** interventi sull'edilizia scolastica, per complessivi **244 Mln €**, **214** dei quali nel corso della gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un importo pari a circa **192 Mln €**.

Con Decreto DiSET n. 48 del 14 marzo 2013, sono state trasferite all'USRC le competenze per l'attuazione del Piano denominato "**Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza**", finalizzato alla riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per tutte le scuole della Regione Abruzzo ad eccezione di quelli ricadenti nel Comune di L'Aquila.

Più di recente, con Delibera CIPE n. 32/2019, all'USRC è stata conferita la responsabilità di attuazione del Piano annuale degli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica nell'ambito territoriale di propria competenza,

mentre al MIUR è assegnata la competenza della programmazione del Settore.


Gli interventi previsti riguardano **la riparazione, il miglioramento sismico** e, in alcuni casi, **la costruzione di nuovi edifici scolastici**, coinvolgendo oltre **160 edifici, 4 province e 98 comuni, e quasi 30.000 studenti** abruzzesi.


Sulla base dei criteri e delle procedure definiti dall'USRC, ad oggi, sono stati **approvati 111 interventi per oltre 102,6 Mln €**, **immediatamente cantierabili, e sono state trasferite agli enti attuatori risorse per 79,3 Mln €**.

Dei 111 interventi approvati dal 2013 ad oggi: 77 hanno concluso i lavori, 29 cantieri sono in corso e 5 stanno espletando le procedure di gara.

Dei **192 Mln €** di interventi finanziati, risultano, in particolare:

- interventi ultimati per un importo pari a **57,4 Mln €**;
- interventi in fase di esecuzione per un importo pari a **47,4 Mln €**;
- interventi in fase di progettazione, per un importo pari a **72.8 Mln €**;
- interventi in fase di programmazione per un importo pari a **7,3 Mln €**;
- interventi defianziati per un importo pari a **7,3 Mln €**.

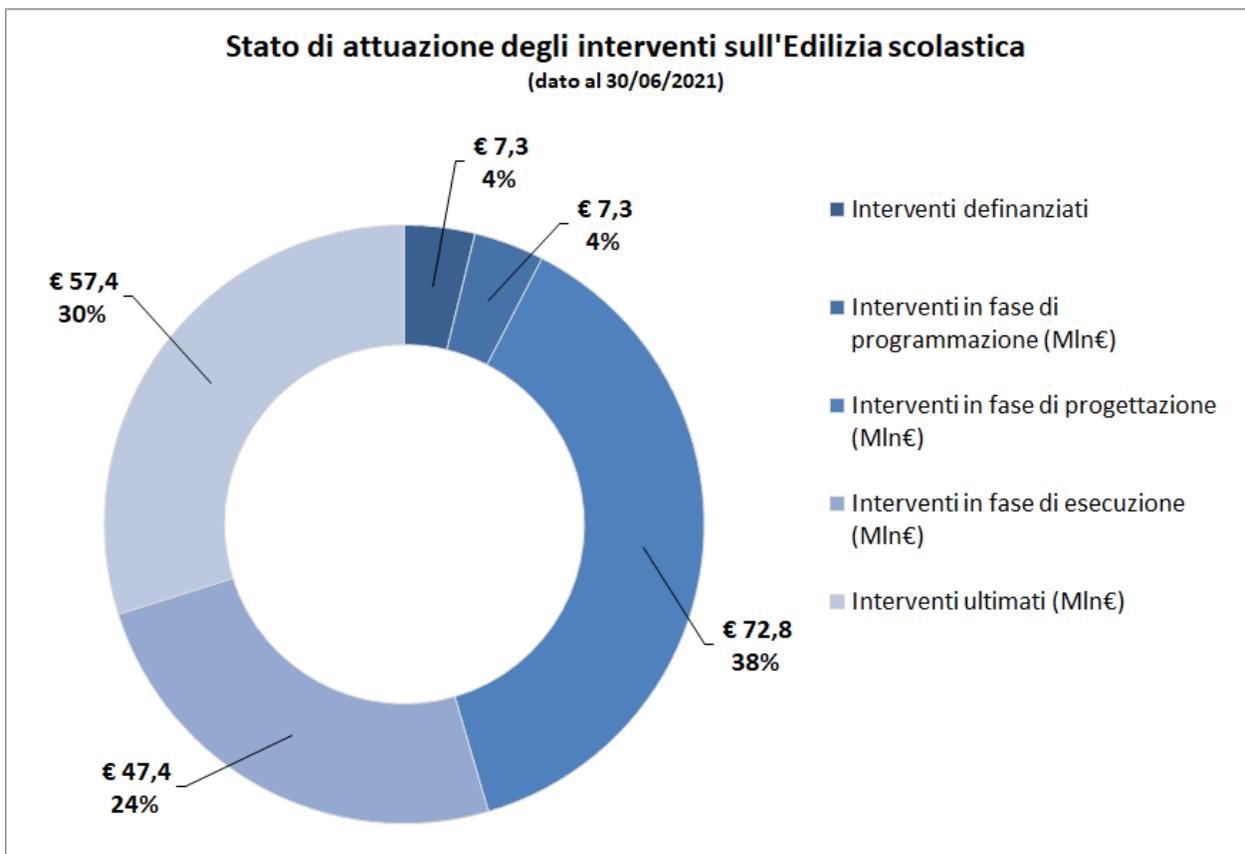

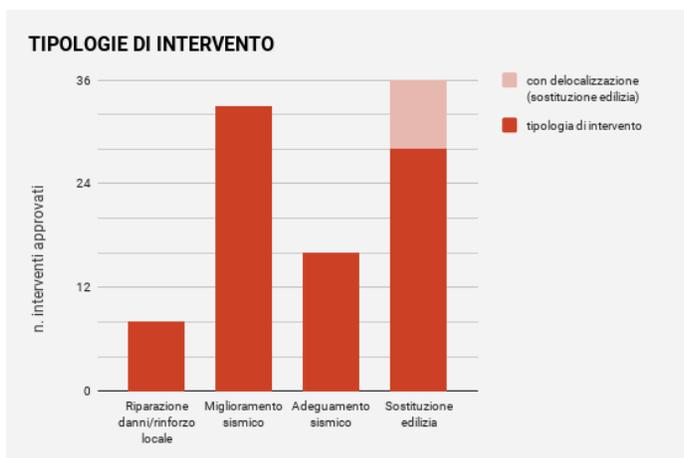

Gli interventi riguardano edifici che hanno manifestato un'elevata vulnerabilità sismica e sono finalizzati al raggiungimento del massimo livello di sicurezza conseguibile con il finanziamento disponibile; per quasi la metà di essi è prevista la sostituzione dei vecchi fabbricati con nuovi edifici scolastici.

Nel corso del primo semestre del **2021** sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **2.915.075,01 €** a 17 soggetti attuatori degli interventi di edilizia scolastica e sono stati assegnati finanziamenti a 6 enti per interventi pari ad **4.174.824,84 €**.

Fra gli interventi finanziati, nel corso del primo semestre 2021, **4** hanno concluso i lavori, mentre gli altri procedono con l'esecuzione dei lavori e la progettazione. Nel corso del 2020 è stata effettuata la ricognizione del fabbisogno economico per la programmazione della II annualità (2020) degli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, con assegnazione delle risorse da parte del CIPE con deliberazione n. 72/2020.

USRC - Edilizia scolastica - Interventi conclusi	Importo
Scuole materne - Comune di Scafa	221.011,17 €
Scuola elementare in Via Pertini - Comune di Avezzano	4.074.300,00 €
Scuola materna ed elementare - Comune di Vittorito	1.088.000,00 €
Liceo Artistico "Mario dei Fiori" di Penne	430.000,00 €
Totale	5.813.311,17 €

INTERVENTO INAUGURATO NEL 2021



Comune di Avezzano
Scuola primaria in Via Pertini



Intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione
€ 4.074.300,00



Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per gli interventi sull'edilizia scolastica nel **periodo 2013-2021**:

EDILIZIA SCOLASTICA	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPEGNATE	RISORSE TRASFERITE	RISORSE SPESE
Edilizia scolastica (esclusi interventi Provveditorato)	€ 192.284.383,90	€ 102.580.100,25	€ 155 787 593,30	€ 79.251.420,04



AGORA' (spazio centrale) della nuova Scuola elementare di Celano

L'U.S.R.C. ha contribuito a diffondere presso le amministrazioni competenti le **indicazioni dettate dalle Linee guida del MIUR**, per realizzare scuole con una concezione innovativa degli spazi dedicati alla didattica e con un nuovo rapporto con il territorio, che qualifichi la scuola come «centro civico», al servizio della comunità oltre gli orari scolastici.

L'Ufficio ha inoltre provveduto alla copertura economica delle spese necessarie alla **sistemazione provvisoria degli studenti** per garantire la continuità didattica durante l'esecuzione degli interventi, definendo altresì i criteri di assegnazione delle risorse alle Amministrazioni richiedenti.



9. SVILUPPO DEL TERRITORIO

La L. 134/2012 individua tra le finalità della gestione ordinaria della ricostruzione quella di assicurare l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (art.67-ter, co.1) ed assegna all'USRC la competenza anche in ordine allo sviluppo dei territori (art.67-ter, co.2).


Allo scopo, **l'art. 11, co. 12, del D.L. n. 78/2015**, ha destinato una quota (**fino al 4%**) delle risorse finanziarie stanziata per la ricostruzione al **Programma di sviluppo RESTART**, predisposto dalla SdM – Struttura di Missione (ex DPCM 1 giugno 2014, confermata con modificazioni dal DPCM 4 ottobre 2019) ed approvato con **Delibera CIPE n. 49/2016**, con una dotazione finanziaria pari a **219,7 Mln €**, per interventi da attuarsi nel territorio del Cratere sismico abruzzese. Tali risorse sono aggiuntive a quelle già assegnate allo sviluppo con **Delibera CIPE n. 135/2012**, pari a **100 Mln €**.

Con successive delibere CIPE n. 70/2017, 115/2017, 25/2018, 56/2018, 20/2019, 54/2019, 16/2020, 17/2020 e 70/2020, sono stati approvati ulteriori interventi del Programma di sviluppo RESTART ed assegnate ulteriori risorse per l'attuazione degli interventi.

Nella Tabella che segue è riportato lo stato di avanzamento del Programma per ciascuna delle Priorità o Ambiti tematici, con riferimento alle Delibere CIPE sopra richiamate:

RIEPILOGO PROGRAMMA SVILUPPO (DELIBERA CIPE N. 49/2016 + DELIBERA CIPE N. 135/2012)						
PRIORITA' - AMBITI TEMATICI RESTART	RIPARTO FINANZIARIO / DOTAZIONE PRIORITA'	INCIDENZA SUL TOTALE PROGRAMMA	TOTALE RISORSE APPROVATE	% RISORSE APPROVATE SU DOTAZIONE PRIORITA'	RISORSE RESIDUE	% RISORSE RESIDUE SU DOTAZIONE PRIORITA'
	mln€	%	mln€	%	mln€	%
A - Sistema imprenditoriale e produttivo	136,6	43%	95,7	70%	40,9	30%
B - Turismo e ambiente	77,8	24%	58,6	75%	19,2	25%
C - Cultura	14,8	5%	14,8	100%	0,0	0%
D - Alta formazione	17,8	6%	15,0	84%	2,8	16%
E - Ricerca e innovazione tecnologica	58,9	18%	57,7	98%	1,2	2%
F - Agenda digitale	9,4	3%	6,8	72%	2,6	28%
G - Governance, monitoraggio e valutazione del programma di Sviluppo	4,4	1%	4,4	100%	0,0	0%
TOTALE	319,7	100%	253,1	79%	66,6	21%

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA RESTART

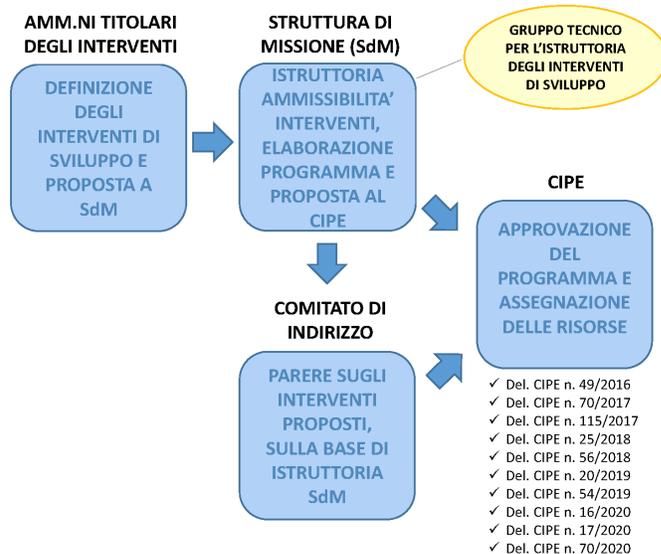

Nell'ambito della procedura di approvazione degli interventi del programma RESTART, l'USRC è componente del **Gruppo tecnico per l'istruttoria degli interventi di sviluppo**, competente alla valutazione delle proposte d'intervento presentate dalle Amministrazioni Titolari, a supporto della SdM – Struttura di Missione, e fa parte del **Comitato di Indirizzo**, nella figura del Titolare.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, l'USRC è inoltre competente in fase di attuazione del programma, al **trasferimento delle risorse destinate agli interventi di RESTART a titolarità dei Comuni**

del Cratere sismico, ad esclusione di L'Aquila, previa istruttoria positiva da parte della SdM e trasferimento delle relative risorse da parte del MEF – Dipartimento del Tesoro.

Ad oggi, l'USRC ha effettuato il trasferimento di risorse per un importo complessivo pari a € **191.275,44**.

Il sito internet istituzionale dell'USRC rende disponibile l'informativa in ordine allo stato di attuazione del Programma RESTART, al link che segue: [Programma di sviluppo RESTART](#)

A far data dall'anno 2019, l'USRC sta affiancando la Struttura di Missione ed i 56 Comuni del Cratere nella predisposizione, da parte delle Aree Omogenee (AO) del Cratere, di **8 PIT – Progetti Integrati per il Turismo**, a valere sulle risorse disponibili per la **Priorità B – Turismo e Ambiente**. Con delibera CIPE n. 16 del 14 maggio 2020 è stato approvato il primo PIT, "Terre della Baronia", proposto da 5 Comuni del Cratere appartenenti prevalentemente all'AO4, per un importo pari a € 5.353.716,39.

Nel corso del primo semestre 2021 l'USRC ha supportato la Struttura di Missione nell'istruttoria degli ulteriori 7 PIT delle restanti Aree Omogenee, propedeutica all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo e del CIPESS. In esito a tale attività, è stato portato a definizione il PIT "Terre della Pescara", proposto da 7 Comuni dell'Area omogenea n.5, per un importo di 7,6 mln€.

I PIT hanno l'obiettivo di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico del territorio del Cratere, a completamento e valorizzazione delle azioni di ricostruzione dei borghi, in linea con la vocazione turistica prevalente dell'Area omogenea di appartenenza, mediante interventi fisici affiancati da interventi immateriali di marketing territoriale, volti a conseguire la riconoscibilità dell'offerta territoriale. I **PIT - Progetti integrati per il Turismo** sono diretti a potenziare:

- 1. Turismo storico culturale e religioso;**
- 2. Turismo naturalistico;**
- 3. Turismo dei borghi, delle tradizioni popolari ed enogastronomico.**

In tema di **valorizzazione turistica del territorio**, l'USRC ha dato avvio all'implementazione di **"STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE"**, un quadro di area vasta delle risorse turistiche del territorio del Cratere, composto dall'analisi dei principali tematismi/valori e dalla sintesi degli stessi in una Visione guida, che mette a sistema le emergenze puntuali di valore storico, architettonico e naturalistico ed i percorsi fisici e tematici che le collegano, con l'obiettivo di delineare un sistema integrato di fruizione e conoscenza dei luoghi, funzionale a consolidare l'identità e la cultura del territorio.

La Visione guida e le analisi ad essa presupposte sono rese disponibili ai Comuni del Cratere, quale strumento a supporto delle decisioni e delle proposte di intervento in materia di sviluppo del territorio, sul sito istituzionale dell'USRC, al seguente link: [Strategie sviluppo turistico](#)

Sulla base delle "STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE", l'USRC ha predisposto il Progetto «**Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani**», per un importo di 70 Mln €, entrato a far parte, insieme ad altre 73 proposte progettuali regionali, della "Banca progetti" della Regione Abruzzo, oggetto della proposta-contributo al **PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "L'Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese"**, inviata il 15 ottobre 2020 dalla Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri agli Affari europei e agli Affari regionali. Il documento è disponibile al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr>

Nel primo semestre 2021, i Progetti *“Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani”* e *“Abruzzo way of life - I borghi che accudiscono: lo stile di vita rurale”*, elaborati dall’USRC in vista delle opportunità prospettate dal PNRR e dell’attivazione di possibili sinergie con gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Programma di sviluppo RESTART, sono stati proposti nell’ambito del progetto *“Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”*, da attuarsi a valere sulle risorse del Fondo complementare al PNRR (DL 6 maggio 2021, n.59), proposto dal Dipartimento Casa Italia, dalla Struttura di Missione Sisma 2009 e dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 .

10. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE



L'USRC gestisce i movimenti contabili, dalle previsioni di entrata/spesa alla registrazione contabile delle entrate ed uscite effettive, emettendo mandati di pagamento, registrando ordinativi di incasso ed ottemperando ai dettami della rendicontazione ex L. 1992, n. 225 e ss. mm.ii.

A far data dall'aprile 2013, sono stati eseguiti n. **10500** mandati di pagamento per un totale € **1.406.768.441,01** (dato al **30/06/2021**).

Di questi, nel 2021 sono stati eseguiti n° **691** mandati di pagamento per complessivi € **124.240.724,74**.

Per il dettaglio si veda il sito <http://www.usrc.it/ammtrasparente.aspx>

Di seguito alcune delle principali attività di gestione fondi dell'USRC oltre quelli della ricostruzione privata, OOPP, ed edilizia scolastica:

A) SPESE OBBLIGATORIE

L'USRC esegue l'istruttoria delle rendicontazioni effettuate dai Comuni sul portale di interscambio AVEIANET dove gli stessi possono compilare le schede relative alle diverse tipologie di spesa (CAS, LOCAZIONE TEMPORANEA ALLOGGI, TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO, CONTRATTI DI LOCAZIONE) al fine di richiedere il trasferimento dei fondi.

Nel 2021 è stato trasferito per le spese obbligatorie (contributo di autonoma sistemazione, locazione temporanea di alloggi ad uso abitativo, contratti di locazione, trasloco e deposito temporaneo del mobilio), in favore dei Comuni del Cratere e Fuori Cratere un importo totale pari ad € **33.380,80** così suddiviso:

- € **11.500,00** per contributo di autonoma sistemazione;
- € **21.880,80** per trasloco e deposito temporaneo del mobilio.

B) CO.CO.CO.

Nel 2021 è stato trasferito dall'USRC ai comuni del cratere per le spese relative ai i co.co.co. € 642.728,39 ripartiti come segue:

• co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2016	€ 9.000,00
• co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2017	€ 32.842,37
• co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2018	€ 41.883,84
• co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2019	€ 79.683,84
• co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2020	€ 479.318,34

C) VIDEOSORVEGLIANZA

Nel 2021 sono stati erogati fondi per il finanziamento del *“Safe Community – Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico”* per un importo complessivo pari ad € **13.263,45**.

CREDITS

- Copertina [<https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/castelli-di-fondazione-dellaquila-fossa-il-baronato-del-gran-rifiuto.html>]
- pag.8 [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centro_storico_Navelli.jpg - Sayatek, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons]
- pag.12 [<https://www.fmdos.cl/noticias/santo-stefano-di-sessanio-pueblo-en-italia-ofrece-casi-10-mil-dolares-por-mudarte-alla/>]
- pag.24 [https://abruzzoturismo.it/sites/default/files/2020-09/800px-Corno_grande_e_Pietracamela%2C_Gran_Sasso%2C_Provincie_of_Teramo%2C_Abruzzo%2C_Italy_-_panoramio.jpg]
- pag.33 [<https://i0.wp.com/www.abruzzo-segreto.it/wp-content/uploads/Veduta-aerea-Chiesa-di-Madonna-del-Campo-03.jpg?fit=1920%2C1280&ssl=1>]
- Tutte le illustrazioni [<https://www.freepik.com/pch-vector/>]
