

LE ATTIVITÀ DI USRC AD OGGI

NOTA INFORMATIVA
ANNO 2024



SOMMARIO

USRC: PRINCIPALI RISULTATI ANNO 2024

1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE

2. PIANI DI RICOSTRUZIONE

3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE

3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

3.2 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

3.3 MIC – FOCUS SUL MODELLO INTEGRATO CRATERE

3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE

5. GESTIONE FONDI

5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

6. RICOSTRUZIONE PUBBLICA

7. EDILIZIA SCOLASTICA

7.1 La Pubblicazione: “Il futuro in sicurezza, la ricostruzione dell’edilizia scolastica danneggiata dal sisma dell’aprile 2009 nell’esperienza dell’USRC”

8. TRASPARENZA

8.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

8.2 WEB-GIS

8.3 MACERIE

8.4 CONTRATTI

9. GESTIONE APPALTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

10. SVILUPPO DEL TERRITORIO

10.1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RESTART

10.2 PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR

10.3 PROGETTO DI ASCOLTO PARTECIPATO NELLE TERRE DELLA BARONIA

10.4 PROGETTO DI CRESCITA ECONOMICA E PROGRESSO SOCIALE PER L'AREA INTERNA «GRAN SASSO – VALLE SUBEQUANA»

10.5 PROGETTUALITA' PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

11. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

11.1 SPESE OBBLIGATORIE

11.2 CO.CO.CO.

11.3 VIDEOSORVEGLIANZA

11.4 TRASFERIMENTI PNC/PNRR

11.5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'USRC

12. CAMMINI

13. PROMOZIONE CULTURALE E COMUNICAZIONE

13.1 CEC: CARTELLONE CONDIVISO DEGLI EVENTI CULTURALI DEI COMUNI DEL CRATERE

13.2 PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI

13.3 BANDI E FORMAZIONE

13.4 DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' UFFICIO

CREDITS

USRC: PRINCIPALI RISULTATI ANNO 2024

L'anno 2024 ha registrato concreti risultati in ogni settore di attività dell'USRC, con una continua innovazione nella gestione dei processi interni ed esterni. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti salienti.

L'avanzamento della ricostruzione al 31 dicembre 2024 nei Comuni del Cratere e fuori Cratere è sinteticamente rappresentato dagli indici che seguono:

Ambito		N. comuni	Avanzamento	Importo contributi ammessi	Fabbisogno finanziario residuo
Ricostruzione privata	Comuni Cratere ⁽¹⁾	56	70%	2,95 Mld €	1,43 Mld€
	Comuni fuori Cratere ⁽¹⁾	121	68%	0,620 Mld €	0,20 Mld€
Ricostruzione pubblica ⁽²⁾	Cratere e fuori Cratere 2009	83	46,9%	0,114 Mld ⁽³⁾	0,127 Mld€
Ricostruzione scuole ⁽²⁾	Cratere e fuori Cratere 2009	98	56,7%	0,204 Mld ⁽³⁾	0,95 Mld€

1 Avanzamento calcolato come rapporto tra l'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate rispetto all'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

2 Avanzamento calcolato come rapporto tra l'importo degli interventi in corso/conclusi e l'importo già finanziato. Il fabbisogno finanziario residuo stimato tiene conto degli interventi ancora da programmare attraverso programmi pluriennali e piani annuali ai sensi della L. 125/2015, art.11, co.9 (sono ricompresi i soli interventi attuati dai comuni e sono esclusi gli interventi sull'edilizia ecclesiastica, edilizia residenziale pubblica)

3 importo degli interventi finanziati e approvati in via definitiva (interventi conclusi e in fase di attuazione/collaudato)

RICOSTRUZIONE PRIVATA

Nel corso del **2024** sono state ammesse a contributo **oltre 340 nuove pratiche** nei comuni del cratere per **circa 349 milioni di euro** e **30** pratiche nei comuni fuori cratere per **19,85** milioni di euro.

Le ammissioni dal 01/01/2024 al 31/12/2024 per i comuni delle Aree omogenee n. 2 e 3, interessati anche degli eventi sismici del Centro Italia, ammontano a 77 milioni di euro.

Questi alcuni dei **principali risultati raggiunti nel 2024** (dati relativi a comuni del Cratere e Fuori Cratere):

- **lavori conclusi per 940 immobili** nel Cratere;
- **lavori conclusi per 95 immobili** nei comuni Fuori Cratere;
- **695 cantieri in corso** nei Comuni del Cratere;
- **216 cantieri in corso** nei comuni Fuori Cratere;
- **210 pratiche** ricadenti nel Cratere **con lavori avviati** nel 2024 relativi a circa 1820 immobili per un valore di **218 Mln €**;
- **553 ulteriori istruttorie avviate** in totale dall'USRC e dai suoi Sportelli su progetti di riparazione con miglioramento sismico di aggregati/edifici ricadenti nel Cratere, relative a 4.950 immobili per un valore di **455 Mln €**;
- **9 pratiche con lavori avviati nel 2024** nei comuni Fuori Cratere.

L'attuale **avanzamento della ricostruzione** privata nei Comuni del Cratere in relazione alle richieste di contributo effettivamente presentate **è pari al 70%**, mentre quella dei comuni Fuori Cratere **è pari al 68%**.

A partire da aprile 2021 l'USRC pubblica un report sintetico con frequenza bimestrale, inviato ai comuni del Cratere, con immagini di alcuni cantieri in partenza e con esempi di lavori appena conclusi, al fine di dare diffusione degli esiti della ricostruzione nei centri storici.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

Nel primo semestre del 2024 l'USRC ha avviato le necessarie valutazioni e interlocuzioni al fine di rispondere ai più frequenti dubbi sull'impostazione progettuale da adottare in caso di contributo sisma e contemporaneo utilizzo del superbonus. L'attività si è conclusa con l'adozione di specifica circolare, n.19, pubblicata in data 15 luglio 2024. La nota chiarisce le modalità con le quali, in via eccezionale e mediante verifiche a campione sulle dichiarazioni rese, sia possibile prevedere anche lavorazioni di riparazione del danno o di miglioramento sismico a valere sul superbonus.

In novembre 2024 è stato altresì pubblicato il Decreto USRC n.10 che recepisce le previsioni dell'art.1 comma 1-bis del DL 3/2023 in tema di condizioni di inagibilità anche se pregresse al sisma del 2009. In particolare, con questa modifica, il precedente Decreto n.6, che regola la richiesta di contributo nei territori del doppio sisma 2009-2016, amplia il suo ambito di applicazione agli aggregati costituiti da edifici con almeno un esito AeDES di inagibilità B/C/E attribuito con scheda AeDES antecedente agli eventi del sisma Centro Italia 2016, anche con danno interamente preesistente laddove siano da garantire le condizioni di salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.

APPALTI PUBBLICI

In materia di appalti pubblici, le istanze pervenute dai territori hanno portato l'Ufficio ad assumere il ruolo di soggetto attuatore degli appalti pubblici di pertinenza degli enti territoriali, ove dagli stessi delegato, allo scopo

di accelerare la ricostruzione del patrimonio immobiliare, determinando un'estensione dei compiti istituzionali anche per l'attuazione degli interventi del PNRR e per gli interventi di investimento per la rigenerazione urbana nei borghi, fino alla digitalizzazione dei servizi e all'informatizzazione della contabilità per la razionalizzazione della spesa.

L'ufficio, a dicembre 2024, ha in gestione n. 21 appalti delegati, in qualità di soggetto attuatore, per un importo complessivo da Q.T.E. di oltre 30 milioni di euro. Tra le Amministrazioni deleganti figurano il Segretariato Regionale per l'Abruzzo, la Prefettura dell'Aquila, la Struttura di Missione sisma 2009 e diversi Comuni del Cratere e Fuori Cratere. Gli interventi curati invece riguardano il recupero e la valorizzazione di Cammini storici, la manutenzione e il restauro di chiese, la realizzazione/manutenzione di opere Pubbliche.

L'USRC essendo stazione appaltante qualificata con il livello massimo "L1" per il Settore "Lavori" e con il livello "SF2" per il Settore "Servizi e Forniture" si è consolidato nel 2024 anche come punto di riferimento nel territorio abruzzese per l'espletamento di singole procedure di gara delegate da altre amministrazioni.

In particolare, nel 2024 l'ufficio ha sottoscritto convenzioni per la gestione di n. 4 procedure di gara, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro, oltre le 16 gare per complessivi 6,5 milioni di euro concluse nelle precedenti annualità. La maggior parte delle gare oggetto di accordo tra l'USRC e le amministrazioni deleganti, perlopiù Comuni abruzzesi, hanno riguardato la selezione di operatori economici per la realizzazione dei lavori di interventi relativi al Piano Nazionale complementare al PNRR, alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e alla riqualificazione di opere pubbliche.

EDILIZIA SCOLASTICA

A dicembre 2024 si è conclusa l'attività di programmazione delle ulteriori esigenze relative al "Settore ricostruzione del patrimonio pubblico – edifici scolastici" con l'approvazione del nuovo piano annuale. **La delibera CIPESS del 19/12/2024 ha approvato 7 interventi** (3 nel cratere e 4 fuori cratere) **per oltre 8 mln €**, che si aggiungono ad altrettanti interventi finanziati nel comune dell'Aquila.

Inoltre, nel corso del 2024 **sono state trasferite risorse per € 5.721.398,94 a 21 soggetti attuatori ed assegnate risorse per € 3.935.463,48 € a 5 enti** per l'attuazione degli interventi in corso.

A valle dell'attività di ricognizione del fabbisogno nel "Settore ricostruzione del patrimonio pubblico – edifici scolastici" per la redazione della nuova Programmazione pluriennale 2024-2026, avviata nel mese di aprile dall'USRC su richiesta di SDM, continua l'attività istruttoria delle istanze pervenute, inizialmente 63 e, a seguito di verifica dei requisiti essenziali, **48, per un importo stimato di circa 95 mln €**, con lo scopo di predisporre un successivo addendum alla Deliberazione CIPESS.

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati **245** interventi sull'edilizia scolastica, per complessivi **252 Mln €**, **207** dei quali nel corso della gestione ordinaria – **a partire dal 2013** – per un importo pari a circa **204,9 Mln €**.

Dei **204,9 Mln €** di interventi finanziati, risultano, in particolare:

- **90** interventi ultimati per un importo pari a **83,4 Mln €** assegnati;
- **37** interventi in fase di esecuzione per un importo pari a **55,7 Mln €** assegnati;

- **60** interventi in fase di programmazione/progettazione, per un importo pari a **58,4 Mln €** assegnati;
- **19** interventi de-finanziati per un importo pari a **7,4 Mln €** assegnati.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Nel 2024 si è conclusa l'attività di programmazione delle ulteriori esigenze relative al Settore 4 "funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali" con l'approvazione del nuovo piano annuale. Con la **CIPESS n.58/2024** pubblicata in G.U. il 24/10/2024 sono risultate assegnatarie di nuovi finanziamenti 21 amministrazioni ricadenti sia nel Cratere che nel Fuori Cratere per totali **28 interventi che ammontano a complessivi 35.743.385,15 €**.

Ad oggi sono **277 i progetti finanziati in via definitiva** attraverso determinazioni di impegno economico da parte dell'USRC, per complessivi **€ 113.003.939,55** che rappresentano complessivamente oltre il 72% degli interventi programmati. Di questi:

- **148** interventi sono ultimati o in fase di collaudo, per un importo pari a circa **46,2 Mln €**;
- **56** interventi con lavori in corso, per un importo pari a **34 Mln €**;
- **73** interventi per i quali è in corso l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, per un importo pari a **32,8 Mln €**.

SVILUPPO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RESTART

Nell'ambito del **Programma di Sviluppo RESTART**, dopo l'approvazione dei primi PIT - Progetti Integrati per il Turismo (Area Omogenea 4, "*Terre della Baronìa*", per un importo di 5,35 Mln€; Area Omogenea n.5, "*Terre della Pescara*", per un importo di 7,65 Mln€; Area Omogenea n.6, "*Altopiano d'Abruzzo: un museo all'aperto*", per un importo di 9,47 Mln€), attraverso l'azione di supporto condotta a partire dal 2023 dall'USRC, sono state perfezionate e **presentate alla Struttura di Missione** le proposte di candidatura del **PIT dell'AO n. 2**, "*Il Ponte tra i Parchi*", per un importo di 10,02 Mln€, del **PIT dell'AO n.3**, "*Gran Sasso outdoor e benessere*", per un importo di 8,28 Mln €, del **PIT dell'AO n.9**, "*Altopiano delle rocche. Terre montane tra sport e natura*", per un importo di 4,89 Mln€, e del **PIT dell'AO n.7**, "*Il Cammino delle genti*", per un importo di 9,90 Mln€.

Nel 2024, l'USRC ha effettuato il raccordo tra la SdM - Struttura di Missione sisma 2009 e le Aree Omogenee n. 2, 3, 7, 8 e 9 per il perfezionamento dei PIT, ai fini dell'adeguamento dei Quadri Tecnico-Economici ai criteri indicati dalla SdM, in esito al quale le AO n.2, 7 e 9 hanno trasmesso alla SdM i PIT aggiornati.

In recepimento delle ulteriori osservazioni formulate dalla SdM nell'incontro tenutosi con le AO in data 17 ottobre 2024 relative ai PIT n.2, 3 e 9, attinenti al corretto e compiuto inquadramento degli interventi nei vari profili istruttori, sono state prodotte le integrazioni e trasmesse alla SdM le proposte progettuali aggiornate dei PIT n.9 e n.2.

I Comuni dell'AO n. 8 stanno invece perfezionando, con il supporto dell'USRC, la proposta di candidatura da sottoporre alla Struttura di Missione, in recepimento delle osservazioni da essa formulate.

Le progettualità complessivamente espresse dai PIT delle 8 Aree omogenee ammontano a circa 70 Mln€.

Ad oggi, l'USRC ha effettuato il trasferimento di risorse a favore delle Amministrazioni titolari degli interventi RESTART nei 56 Comuni minori del Cratere per un importo complessivo pari a € **9.464.602,21**.

PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR (PNC)

Dal settembre 2021 l'Ufficio sta lavorando congiuntamente ai Soggetti attuatori del Programma, individuati nella Struttura di Missione sisma 2009 e nel Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, sul **Programma unitario di "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016"**, che ha una dotazione di complessivi 1,78 miliardi € a valere sulle risorse del **Fondo complementare al PNRR**.

Nell'ambito della **Misura A** del Programma Unitario di Intervento, **Linee di intervento A2.1, A3.1, A3.3 e A4.5**, l'USRC cura il monitoraggio attuativo degli interventi, il trasferimento delle risorse ed il raccordo tra i Responsabili degli Interventi ed i Soggetti attuatori del Programma, per i **238 interventi** localizzati nel Cratere sisma 2009 per complessivi 119,01 Mln€, aumentati a **131,51 Mln€** con l'assegnazione delle risorse aggiuntive a valere sul FOI - Fondo per l'avvio di opere indifferibili (art. 26, co. 7, DL n. 50/2022) per far fronte all'adeguamento prezzi a seguito dell'aumento dei costi delle materie prime.

L'USRC ha provveduto alla trasmissione ai Soggetti attuatori dell'**avanzamento procedurale degli interventi al 31 gennaio 2024 e al 31 marzo 2024** (ai sensi dell'Ordinanza commissariale n.84 del 28/12/2023). Inoltre,

come da richiesta del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 e della Struttura di Missione post sisma 2009 di cui alla nota prot. CGRTS-0011547-P-25/03/2024, l'USRC ha rimesso ai Soggetti attuatori **n.5 Report bimestrali dell'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi**, nel corso del periodo aprile-novembre 2024. Per i 238 interventi finanziati, dal monitoraggio al 30 novembre 2024 risulta un avanzamento medio delle erogazioni risorse effettuate dall' USRC pari al **64%**, a fronte di un dato a inizio 2024 pari al 35%. L'avanzamento procedurale medio degli interventi è di poco inferiore al **70% dei lavori**, circa il 30% in più rispetto al 2023.

Ai fini dei trasferimenti finanziari, l'USRC, d'intesa con l'USR Abruzzo sisma 2016, ha adottato la procedura di richiesta degli acconti successivi all'anticipazione e messo in disponibilità dei Responsabili degli interventi la relativa modulistica.

Al **31 dicembre 2024**, l'USRC ha trasferito a favore degli Enti responsabili dei 238 interventi risorse per un importo complessivo pari a **71,16 Mln€ (anticipazione + SAL successivi)**, dei quali circa **31 Mln€ nell'anno 2024**. L'avanzamento finanziario del trasferimento delle risorse PNC dall'USRC agli Enti responsabili dei 238 interventi, è il seguente:

- Per **n. 40 interventi** è stata trasferita l'**anticipazione (30%)**, per un importo complessivo trasferito pari a **10,60 Mln€**;
- Per **n. 104 interventi** è stato trasferito anche il primo acconto successivo all'anticipazione (**ulteriore 30%**), per un importo complessivo trasferito pari a **27,75 Mln€**;
- Per **n. 81 interventi** è stato trasferito anche il secondo acconto successivo all'anticipazione (**ulteriore 30%**), per un

importo complessivo trasferito pari a **29,95 Mln€**;

- Per **n. 12 interventi** è stato trasferito anche il saldo (**10% finale**), per un importo complessivo trasferito pari a **2,86 Mln€**;
- Per n. 1 intervento non è intervenuto alcun trasferimento risorse.

Nel 2024 l'USRC, d'intesa con l'USRA, ha adottato una **modulistica unificata** per la formulazione, da parte degli Enti responsabili degli interventi, dell'**istanza per l'utilizzo delle economie** rinvenibili nei QTE degli interventi afferenti alle linee di intervento A3.1 e A4.5, ai sensi dell'**Ordinanza commissariale n. 104/PNC del 11/9/2024**. Per la medesima tipologia di istanze, con l'USR Abruzzo 2016 è stata adottata una procedura unificata per la gestione degli interventi PNC a responsabilità dei Comuni del doppio Cratere.

L'Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 n.106 del 23/12/2024, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024 e nell'esercizio dei poteri di deroga commissariali stabiliti dalla normativa vigente, ha rimodulato il cronoprogramma previsto dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, a decorrere dal Quarto trimestre 2024 incluso, con il solo termine del quarto trimestre 2026, entro il quale, per tutti gli interventi della macro-misura A, occorre conseguire la conclusione dei lavori-collauda.

PROGETTO DI ASCOLTO PARTECIPATO NELLE TERRE DELLA BARONIA

Nell'esercizio delle proprie competenze in tema di Sviluppo del territorio, in esito al progetto sperimentale di **Ascolto partecipato** realizzato nel 2023 tra l'USRC e il Comune di Santo Stefano di Sessanio, volto ad individuare azioni per la "**rigenerazione urbana**" e la "**rigenerazione di comunità**", con il

coinvolgimento attivo della popolazione, degli attori istituzionali e degli operatori economici, gli **8 Comuni di Barisciano, Calascio, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Ofena, Santo Stefano di Sessanio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi**, hanno espresso la comune volontà di intraprendere una fase successiva del progetto, estendendo l'Ascolto partecipato all'area vasta della Baronia, con l'obiettivo di individuare azioni di più ampia portata, capaci di incidere sulle criticità locali, sperimentando una collaborazione intercomunale per la costruzione delle strategie ed identificazione delle progettualità, affiancata e sostenuta dall'USRC e dalla Regione Abruzzo.

In tal senso, il "**Progetto di Ascolto Partecipato nelle Terre della Baronia**", su richiesta dell'USRC e degli 8 Comuni aderenti, ha ottenuto nel 2024 il patrocinio da parte della Presidenza del Consiglio Regionale (Deliberazione n. 31 del 5 marzo 2024), nonché l'alto patrocinio della Regione Abruzzo (DGR n. 364 del 25/06/2024).

Nel corso dell'anno 2024, l'USRC ha lavorato all'**identità visiva** del progetto, ideando il logo, ha predisposto e condiviso con le Amministrazioni comunali un **Questionario delle percezioni sui temi urbani, ambientali e socio-economici**, in duplice formato cartaceo e digitale, rivolto agli abitanti, ai frequentatori abituali e ai visitatori dei Comuni della Baronia, ed ha sviluppato un'**Analisi di contesto del territorio degli 8 Comuni della Baronia**, costruendo il quadro conoscitivo del territorio di intervento, da porre alla base dell'accompagnamento sul campo del territorio della Baronia che l'USRC intende sostenere attraverso un percorso di co-progettazione con le comunità e con gli attori istituzionali e socio-economici interessati.

PROGETTO DI CRESCITA ECONOMICA E PROGRESSO SOCIALE PER L'AREA INTERNA «GRAN SASSO – VALLE SUBEQUANA»

Dal giugno 2023, l'USRC ha attivato una collaborazione con il "Dottorato comunale di ricerca" in Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia per l'Area interna "Gran Sasso - Valle Subequana", coordinato dall'omonimo Dipartimento dell'Università degli Studi dell'Aquila, finanziato dall'Agenda per la Coesione Territoriale.

Nell'ambito del progetto, Univaq-DIIE e USRC hanno condotto, sotto la guida del Prof. Luciano Fratocchi, Responsabile scientifico del progetto, un'indagine conoscitiva delle aziende operanti nei **macro-settori agro-alimentare e turistico-ricettivo**, presenti con proprie unità locali nel territorio di 24 Comuni dell'Area interna, acquisendo dati di **quasi 300 aziende**. I risultati preliminari della ricerca sono stati presentati da Univaq-DIIE agli amministratori comunali nel novembre 2024.

CAMMINI

L'USRC, nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, è stato individuato come **Soggetto Responsabile per l'attuazione di quattro interventi del Piano Complementare** nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3a, relativi alla realizzazione, l'implementazione e il consolidamento di **percorsi e cammini culturali, tematici e storici**.

Le proposte progettuali, avanzate dai Comuni, sono state concretizzate in **4 appalti integrati per i quali è stata conclusa la fase progettuale con consegna dei lavori per 4 su 4 cammini**. L'opera mette in relazione tra loro circa **40 comuni del Cratere e Fuori Cratere 2009, 3 parchi, di cui due nazionali e uno regionale, circa 400 Km di tracciati, per un valore pari a**

2,2 milioni di euro. Il sistema dei quattro Cammini finanziati si compone di: **"Il Cammino Grande di Celestino", "Il Cammino dei Francescani", "Il Cammino della Baronia" e infine il "Cammino tra i Vestini"**.

Il progetto si inserisce altresì nell'ambito del lavoro di **valorizzazione territoriale a base culturale** che promuove l'ufficio con le attività di [Promozione Culturale](#), parte della più ampia strategia di Rigenerazione e Sviluppo. In particolare, si stanno implementando azioni utili alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che vanno dalla **narrazione innovativa** dei Cammini, alla creazione di un'**identità viva** per l'intero progetto, all'**implementazione della segnaletica con tecnologia smart** per offrire un'**esperienza immersiva del cammino, in totale sicurezza e nell'ottica di una massima inclusività e accessibilità**, alla **collaborazione con il CAI sezione dell'Aquila** per attività di ricognizione dei tracciati effettuate tra giugno e settembre 2024 eseguite in cooperazione tra USRC e CAI.

A Dicembre 2024 possono ritenersi conclusi i principali interventi infrastrutturali appaltati per ogni Cammino, mentre sono previste per la prossima annualità le opere di completamento infrastrutturale, il perfezionamento del sistema di segnaletica direzionale e informativa e il posizionamento degli arredi urbani previsti.

RIGENERAZIONE URBANA - PICC Piano di Interventi Connessi e Complementari

Il rapporto istruttorio concluso nel primo semestre del 2024 ha consentito di addivenire alla conclusione delle **attività di verifica poste dal legislatore alla base del parere di congruità tecnico-economica di competenza dell'USRC**.

Nei prossimi mesi l'ufficio affiancherà la Struttura di Missione nel percorso di accesso all'assegnazione dei fondi necessari alla

progettazione e realizzazione degli interventi di ripristino dei sottoservizi e degli spazi pubblici da parte del CIPESS, in riscontro alla programmazione del fabbisogno pari a complessivi 298 Mln€. Tali interventi sono volti a dare completa attuazione al processo di ricostruzione che dopo la conclusione degli interventi di ricostruzione privata, e il completo ripristino della funzionalità degli Uffici e dei servizi pubblici, troverà il suo pieno compimento con la riqualificazione dei centri storici, delle reti, delle strade e degli spazi pubblici, messi a dura prova con anni di cantieri.

Dal consolidato partenariato con UNIVAQ sono state sviluppate "Linee Guida per la progettazione degli interventi di Rigenerazione Urbana", strumento di indirizzo strategico per la progettazione degli interventi, in fase di divulgazione attraverso incontri dedicati con i Comuni del cratere. E' in corso lo sviluppo di 5 casi studio di applicazione delle Linee Guida, due dei quali portati a termine, da implementare con possibili progetti pilota di rigenerazione territoriale. L'Ufficio ha poi affiancato la propria azione strategica ad un percorso di partenariato con UNIVAQ, avviando progetti di ricerca e di indagine qualificata delle caratteristiche socio-economiche del territorio che verranno presentate agli amministratori nei prossimi mesi al fine di definire strategie di potenziamento del tessuto economico e sociale.

PROMOZIONE CULTURALE e COMUNICAZIONE

Nell'ambito dell'**attività di ricognizione degli eventi culturali programmati su base annuale e pluriennale, attraverso lo sviluppo del CEC: il Cartellone Condiviso degli Eventi Culturali dei Comuni del Cratere**, dal 2023 ad oggi sono stati registrati più di 1500 eventi e al 31 dicembre 2024 il CEC ha dato visibilità e condiviso informazioni su **oltre 1000 eventi in 64 Comuni**.

Sono state portate avanti azioni per lo sviluppo ulteriore del CEC, quali uno studio quanti-qualitativo dei dati raccolti nella base dati, oltre ad un'analisi di sfide e opportunità, che ha portato alla creazione di una strategia di promozione con azioni prioritarie per lo sviluppo ulteriore e la promozione del CEC: la prima attività è stata una **Hackathon sui temi dello sviluppo territoriale a base culturale**: la **CulturalHack**, svolta ad aprile 2024 nell'ambito del TedXAquila.

Gli esiti del lavoro di studio e analisi e gli input ricevuti nelle giornate della CulturalHack hanno portato a nuove idee progettuali che l'Ufficio è in fase di elaborazione e sistematizzazione, per arrivare ad una **proposta progettuale per lo sviluppo del Cartellone degli Eventi Culturali del Cratere in cui si intende ampliare il CEC per sviluppare ambiti di azione innovativi**.

Nell'ottica di una gestione condivisa dei **Cammini degli Altipiani** nel 2024 sono proseguite le azioni complementari del Piano di Comunicazione per la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Tra queste rientrano le attività di **informazione, formazione**, oltre alle ricerche etnografiche condotte seguendo una *metodologia sperimentale* basata sul patrimonio culturale immateriale UNESCO per la **narrativa innovativa** dei Cammini, alla creazione di un'**identità visiva** per l'intero progetto e all'implementazione della **segnaletica con tecnologia smart per offrire un'esperienza immersiva del cammino**. Per lo sviluppo di queste attività è stata necessaria una **pianificazione multilivello e multiattoriale** basata su una metodologia di lavoro sinergica con le istituzioni locali di messa in rete e raccordo di amministrazioni, enti locali, associazioni e stakeholder.

Come parte del piano di comunicazione è stata creata la **sezione del sito USRC dedicata ai Cammini degli Altipiani (progetto, tracciati,**

incontri di formazione e informazioni, collaborazione CAI) aggiornata in tempo reale per dare visibilità alle diverse azioni che compongono l'intero progetto.

L'Ufficio ha, inoltre, iniziato un lavoro di supporto all'animazione territoriale con la diffusione di opportunità di **formazione e bandistica a livello locale, regionale, nazionale ed europeo sullo sviluppo territoriale a base culturale con i Comuni del Cratere.**

Nel 2024 l'Ufficio ha organizzato eventi istituzionali locali, nazionali ed europei per la **diffusione dei progetti dell'USRC e la promozione del territorio**, oltre a proseguire nel supportare gli attori locali istituzionali e associativi chiave nell'organizzazione diretta di iniziative di animazione del territorio, diffusione e comunicazione ed engagement. Le azioni di divulgazione e diffusione delle attività vengono condivise dall'Ufficio nella crescente **rete di contatti locali, regionali e nazionali** che l'USRC ha iniziato a raccogliere con la ricognizione fatta in occasione del Mapping Operativo organizzato nell'ambito degli incontri di Formazione e Informazione dei Cammini degli Altipiani organizzato a novembre 2023, utile ad un lavoro di profilazione e targettizzazione del network dell'Ufficio composto di figure locali, regionali e nazionali con expertise diverse, focus tematici e campi di azioni legati allo sviluppo territoriale a base culturale.

CAPITALE UMANO E PERFORMANCE 2024

Nel 2024, l'USRC ha continuato a rafforzare la propria **capacità organizzativa e amministrativa** per rispondere alle esigenze dei Comuni del Cratere. A tal fine, sono stati reclutati nuovi dipendenti attraverso convenzioni con altri Enti, scorrendo le graduatorie concorsuali, e istituendo un elenco di esperti per supportare le attività legate al PNC. Con l'assunzione di 9

nuovi dipendenti, di cui 6 a tempo indeterminato, l'organico è arrivato a 121 dipendenti entro fine anno.

Parallelamente, sono stati avviati numerosi progetti formativi per sviluppare competenze tecniche, digitali, di privacy e gestione degli appalti, confermando l'impegno dell'USRC nel promuovere la crescita del personale. A dicembre 2024 è stato siglato il Contratto Collettivo Integrativo 2024-2026, che ha ridotto parzialmente le disparità economiche tra categorie di personale e ha introdotto misure di **welfare integrativo**. Per migliorare ulteriormente il **benessere organizzativo**, sono stati adottati strumenti come il lavoro agile e la flessibilità oraria. Queste iniziative riflettono la volontà di creare un ambiente di lavoro dinamico, efficiente e incentrato sul benessere del personale, con un impatto positivo sulla produttività e fidelizzazione.

Nel 2024, l'USRC ha anche introdotto un innovativo **sistema di valutazione delle performance**, finalizzato a migliorare l'efficienza e la qualità del lavoro. Il sistema, che integra indicatori chiave per monitorare e ottimizzare i risultati, è stato ampiamente condiviso con le parti interessate, favorendo il consenso interno. Tra gli obiettivi innovativi per il 2024, si annoverano la progettazione di un sistema di rilevazione della soddisfazione degli stakeholder USRC, l'aumento degli obiettivi di avvio e chiusura di pratiche di ricostruzione, l'innalzamento dei livelli di sicurezza digitale, una gestione degli appalti tramite milestones, e lo sviluppo di percorsi innovativi per il territorio. Il sistema di valutazione delle performance, articolato su tre livelli (organizzativo, individuale, di settore), ha potenziato il focus sugli obiettivi individuali, stimolando un maggiore impegno e orientamento al risultato. Questo ha contribuito a una cultura organizzativa dinamica, responsabile e centrata sul raggiungimento degli obiettivi, con un allineamento stretto tra performance individuali e incentivi economici. La realizzazione di questo sistema ha avuto un impatto positivo sulla produttività e sull'ottimizzazione delle performance complessive dell'organizzazione. Per maggiori

dettagli, è possibile consultare il documento degli obiettivi 2024: [MANCA LINK](#)

CONTABILITA' SPECIALE

L'USRC gestisce le attività di **rilevazione dei fabbisogni finanziari e di programmazione della spesa** in raccordo con le Strutture Centrali ed **alloca le risorse agli Enti beneficiari dei trasferimenti/contributi tramite emissione di ordinativi secondari di contabilità speciale**, ottemperando alle prescrizioni normative circa le modalità e i termini di rendicontazione alla competente RTS.

Nel 2024 sono stati effettuati **n. 2504 ordinativi di pagamento** per un totale complessivo di **224.862.698,99 €** di risorse erogate; di seguito le principali voci di spesa relative ai trasferimenti occorsi a favore degli enti/beneficiari finali:

- **RICOSTRUZIONE PRIVATA: n. 182 ordinativi** per un totale di **170.099.069,4 €** a favore di **75 Comuni**;
- **EDILIZIA PUBBLICA ed EDILIZIA POPOLARE (ATER): n. 102 ordinativi** per un totale di **7.975.394,3 €** a favore di **31 Enti**;
- **EDILIZIA SCOLASTICA: n. 29 ordinativi** per un totale di **5.508.020,77€** a favore di **19 Comuni**;
- **INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PNC/PNRR: n. 222 ordinativi** per un totale di **30.684.959,54 €** a favore di **52 Enti**.

Prosegue anche nel 2024 l'attività di sostegno continuo ai Comuni richiedenti mediante l'erogazione tempestiva di risorse per i contributi destinati a:

- Personale assunto dai Comuni ai sensi delle Ordinanze emergenziali (**COCOCO**): **n. 52**

ordinativi per un totale di **773.966,75 €** a favore di **34 Comuni**;

- **SPESE OBBLIGATORIE: n. 85 ordinativi** per un totale di **2.321.103,98 €** a favore di **37 Comuni**;
- Supporto specialistico nell'ambito delle attività PNC/PNRR a favore degli Enti Responsabili di Intervento (cd. **SL PNC**): **n. 257 ordinativi** per un totale di **656.071,95 €** a favore di **n. 40 Comuni**.

Nel corso dell'anno sono state effettuate puntuali **ricognizioni finanziarie** volte all'accertamento di residui passivi/economie su alcune fonti di finanziamento che hanno permesso la **riprogrammazione delle risorse in CIPESS e che sono state destinate alla copertura finanziaria delle Spese Obbligatorie** (Manutenzione straordinaria MAP e Contributi per trasloco e deposito) **per il triennio 2024-2026**.

Altri risparmi di spesa derivanti dalle medesime operazioni contabili sono stati destinati alla copertura finanziaria delle **spese di funzionamento dei cd. Ex-UTR**, superando l'annosa questione dei rimborsi richiesti dai Comuni Capofila per le spese sostenute per l'avvio ed il funzionamento degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione delle aree omogenee. Nel 2024 è stato possibile effettuare **rimborsi a favore di n. 4 Enti su 8 per un totale complessivo di 169.823,98 €**.

Una puntuale tenuta della contabilità e la ricostruzione storica dei movimenti finanziari ha inoltre permesso all'Ufficio di stilare un **documento di analisi finanziaria** contenente la raccolta e l'analisi dei trend storici dei flussi finanziari delle varie tipologie di finanziamenti nel tempo gestiti dall'USRC. Tale documento, in corso di definizione, sarà pubblicato nel corso del nuovo anno.

L'integrazione delle procedure di gestione della contabilità speciale e di tenuta e conservazione degli atti amministrativi e più in generale l'informatizzazione dei processi di spesa/trasferimento garantisce una riduzione dei **tempi di pagamento** e il rispetto dei tempi previsti dalle norme. È indicativo in tal senso il **dato relativo agli indici di tempestività dei pagamenti che si conferma negativo anche nel 2024** (rappresentativo di pagamenti effettuati prima delle scadenze delle relative fatture).

Dati rappresentativi della validità dei modelli amministrativi adottati dall'USRC sono inoltre il superamento del controllo di regolarità preventiva da parte della Corte dei Conti per tutti gli atti, progetti e convenzioni trasmessi, la **consegna tempestiva e il discarico dei rendiconti finanziari** per le più recenti annualità da parte della competente RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato - Sez. L'Aquila).

DIGITALIZZAZIONE

L'anno 2024 è stato ricco di traguardi importanti raggiunti che diventeranno presto nuovi punti di partenza per le sfide che ci attendono.

In autunno è stato rilasciato al cittadino il nuovo **portale WEB GIS** (<https://datigis.usrc.it>) grazie al lavoro congiunto tra UNIVAQ e USRC. Il portale di nuova generazione è un nuovo modo di mettere a disposizione del cittadino le informazioni sulla ricostruzione privata e pubblica, consentendo di muoversi su mappe ed aree geografiche. Il servizio gira in Cloud e vede l'impiego delle ultime tecnologie in termini di affidabilità e disponibilità del servizio. Dal punto di vista tecnologico ci preme sottolineare, in termini di interoperabilità dei servizi, la possibilità del portale di poter integrare informazioni provenienti da altri Enti quali ad esempio le ortofoto del territorio interessato messe a disposizione dalla Regione Abruzzo tramite la tecnologia Web Map Services (WMS).

In autunno, è stato pubblicato, sotto una nuova veste, il portale delle macerie (<https://maceriesisma2009.it>), portale storico che ha mosso i primi passi sin dal 2013 con la costituzione degli uffici speciali USRA e USRC. Questo portale ha consentito alle ditte che lavorano nella ricostruzione di tracciare lo spostamento delle macerie nei vari punti di conferimento. Purtroppo, per diverse vicissitudini e soprattutto per una obsolescenza tecnologica, negli ultimi anni il portale ha offerto un servizio parziale creando diverse difficoltà agli utilizzatori. Il nuovo portale è stato completamente re-ingegnerizzato adeguandolo alle attuali norme dettate da AGID in ambito di servizi web pubblici. Questo lavoro ha permesso di offrire un nuovo portale con accesso SPID alle società e soprattutto mettere a disposizione in modalità Open i dati dei trasporti delle macerie.

Altro argomento che merita di essere menzionato è il tema della sicurezza informatica, sul quale sono state compiute diverse azioni nel corso dell'anno, tra cui la cifratura dei dati presenti sui portatili e l'adeguamento in termini restrittivi delle politiche di gestione delle password. Infine è stato redatto e pubblicato il nuovo regolamento sull'utilizzo dei beni informatici in modo da descrivere chiaramente i comportamenti da adottare con gli strumenti informatici dell'USRC.

Nel corso dell'anno, infine, sono state sviluppate funzionalità all'interno della piattaforma web chiamata *Sportello Digitale*, che hanno reso più veloce il rilascio delle Concessioni, da parte dei Comuni, e l'apertura di nuovi cantieri. L'area della ricostruzione privata e della ricostruzione pubblica si sono avvalse di queste funzionalità per gestire rispettivamente i tempi della trasmissione delle richieste di integrazione dell'Ufficio, e le attività dei Piani Interventi Connessi e Complementari (PICC).

NUOVE ATTIVITÀ DELL'USRC

La riorganizzazione dell'USRC ha previsto una **nuova macro-struttura**, che prevede l'istituzione di un'area dirigenziale afferente all'area Giuridico-Finanziaria e 8 posizioni organizzative: 3 tecniche per la ricostruzione privata, 1 per gli appalti delegati, 1 contabile per l'ufficio finanziario, 1 per il personale, 1 per i servizi informatici e 1 per la gestione della comunicazione ed eventi. La riorganizzazione e la certificazione del fondo apposito per l'incentivo al personale è servita a garantire una gestione più efficace e performante, che ha consentito di avviare nuove attività su esigenze manifestate dal territorio:

- La necessità di accelerare la ricostruzione pubblica, attraverso l'esercizio, da parte dell'USRC, del ruolo di **soggetto attuatore degli appalti pubblici**, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nonché per l'attuazione degli interventi del PNRR e per gli interventi di investimento per la rigenerazione urbana nei borghi, fino alla digitalizzazione dei servizi e all'informatizzazione della contabilità per la razionalizzazione della spesa;
- La necessità di assicurare l'efficace e l'efficiente conduzione del **PNC-Piano Nazionale Complementare al PNRR**, di cui al DL 59/2021, attraverso il

trasferimento fondi ai Responsabili degli interventi, il monitoraggio attuativo e procedurale degli interventi, il raccordo tra la Cabina di coordinamento integrata, i Soggetti attuatori del programma e gli Enti locali;

- La **rigenerazione urbana nei centri storici del cratere**: ai sensi della L.172/2017 e della determina del Titolare dell'USRC n. 1097/2021, l'USRC, in collaborazione con la Struttura di Missione sisma 2009, ha concluso la fase di programmazione del fabbisogno dei 56 comuni del cratere, istruendo 192 richieste per altrettanti interventi. La programmazione del fabbisogno, pari a complessivi 298 Mln€, genererà la possibile assegnazione dei fondi necessari alla progettazione e realizzazione delle opere. Contestualmente si sono portati a conclusione i primi due progetti pilota in partenariato con UNIVAQ-DICEA e si è dato avvio alla fase di divulgazione delle linee guida di indirizzo strategico per la progettazione degli interventi.
- L'incremento delle progettualità del territorio nell'ambito di azioni di **sviluppo**, attraverso il supporto tecnico delle Aree Omogenee proponenti nella predisposizione o completamento dei **PIT – Progetti integrati per il Turismo**, da candidare a finanziamento a valere sul Programma di sviluppo RESTART, in raccordo con la Struttura di Missione.

1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE



La Legge 7 agosto 2012, n.134 (cosiddetta “Legge Barca”), artt. 67-bis e 67-ter, ha disposto la cessazione al 31 agosto 2012 dello stato di emergenza successivo al sisma del 6 aprile 2009 ed ha istituito l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, **USRC**), con sede a Fossa (AQ), per le finalità attinenti alla **gestione ordinaria della ricostruzione**, sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, nei territori dei Comuni del Cratere, ad esclusione di L’Aquila, e dei Comuni fuori Cratere (cfr. L.125/2015, art.11, co.13).

L’Intesa¹ dell’agosto 2012, ha disciplinato gli aspetti organizzativi e le competenze istituzionali dell’Ufficio.

La Legge 7 agosto 2012, n.134, ha assegnato all’USRC, tra l’altro, il coordinamento degli otto Uffici territoriali per la ricostruzione (di seguito, UTR), costituiti ai sensi dell’OPCM n.4013 del

2012 dai Comuni di ciascuna Area Omogenea per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati.

Dal 1° luglio 2018 gli UTR sono stati soppressi e le relative competenze sono state trasferite all’USRC (co.32, art.2-bis, L. n.172/2017). Da allora, il Titolare dell’USRC ha in capo la direzione ed il coordinamento esclusivi del personale in servizio presso gli UTR, assegnato anch’esso all’USRC (co.3, art.22, L.55/2019), nonché la gestione del processo di soppressione di detti Uffici attraverso specifici provvedimenti organizzativi e gestionali. In una fase transitoria, sono stati costituiti, tramite convenzioni con i Comuni, 8 Sportelli Decentrati dell’USRC (di seguito, SP) presso le medesime sedi dei soppressi UTR.

A partire dal 2019, la **riorganizzazione** ha avuto maggiore impulso con la soppressione di 5 degli 8 Sportelli Decentrati ed il trasferimento del relativo personale presso la sede dell’USRC a Fossa (AQ). Contestualmente, nell’anno 2019 è stato posto in essere l’accentramento delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, la cui gestione è transitata dai soppressi UTR all’USRC.

In esito all’evoluzione normativa sopra descritta, l’USRC, oltre al **coordinamento del processo di ricostruzione privata**, condotto sin dall’avvio dell’Ufficio nel 2013, ha oggi in capo direttamente anche l’istruttoria tecnico-amministrativa delle **richieste di contributo** per la ricostruzione privata. Il

¹ Intesa sottoscritta ai sensi dell’ art. 67-ter della Legge 7 agosto 2012, n.134.

30/09/2022 è decorso il termine per la presentazione delle domande di contributo, da parte dei privati all'interno dei centri storici dei comuni del cratere e complessivamente nel solo periodo luglio-settembre 2022 sono state presentate 1.200 nuove domande di contributo. Il successivo **31 marzo 2023** è decorso altresì il termine per il caricamento sullo Sportello Digitale dell'USRC della documentazione minima necessaria ai fini delle verifiche istruttorie delle predette 1200 pratiche. Ad oggi sono 1020 le pratiche con documentazione effettivamente caricata per un importo pari a 915 mln €.

La competenza per l'istruttoria dei contributi alla ricostruzione privata va ad aggiungersi alle altre competenze assegnate all'Ufficio sin dalla sua istituzione. L'USRC, infatti, cura la programmazione ed istruttoria tecnica degli interventi di **ricostruzione pubblica** e del **Piano "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza"**, cura l'attuazione dei **Piani di Ricostruzione** (dei quali ha effettuato l'istruttoria nel profilo di congruità economica), cura l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, gestisce la **contabilità speciale**, effettua il **monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi**, cura la trasmissione periodica dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, effettua la gestione delle assegnazioni e dei trasferimenti dei fondi per la ricostruzione privata, promuove l'attrattività e lo **sviluppo economico e sociale del territorio del cratere**.

L'USRC è inoltre competente anche per la ricostruzione dei **Comuni fuori Cratere** (cfr. L. 71/2013, art.7, co.6; L.125/2015, art.11, co.13) per ciò che attiene alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata ed ai trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla

popolazione; il 30/9/2021 è scaduto il termine per la consegna delle richieste di contributo fuori cratere. Ciò consentirà ragionevolmente di concludere la ricostruzione privata fuori Cratere entro i prossimi 2 anni.

Dal 2020 l'attività istruttoria per la ricostruzione privata ha avuto una fase di **significativa crescita ed ottimizzazione di processo**, con l'evasione di più della metà delle pratiche giacenti in attesa di istruttoria. Le misure organizzative adottate per far fronte all'emergenza pandemica da COVID-19, con la conduzione delle attività lavorative in smart working a far data da marzo 2020, hanno assicurato la continuità dell'azione amministrativa, il servizio all'utenza e la conclusione dei procedimenti con documentazione completa

Al contempo, è stata potenziata la **digitalizzazione** delle procedure e degli strumenti di gestione documentale interna ed esterna, nell'obiettivo di realizzare nel breve termine un'amministrazione "full digital" con la totale dematerializzazione degli atti.

Dal 2022 l'USRC ha assunto ulteriori competenze anche nell'ambito del **Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016**, finanziato ai sensi del DL 59/2021 a valere sulle risorse del **PNC - Piano Nazionale complementare al PNRR**, relativamente all'**attuazione degli interventi** a responsabilità dei Comuni del Cratere sisma 2009 diversi da L'Aquila. Nell'ambito del predetto Programma, l'USRC è direttamente Responsabile di 4 interventi per il recupero e la valorizzazione di **Cammini storici** per un valore complessivo di 2,2 mln€: un progetto che favorisce il collegamento delle risorse dell'intero territorio, attraversando 42 Comuni, 31 dei quali rientranti nel Cratere sismico 2009.

Parallelamente alla realizzazione degli interventi, sono state altresì avviate dall'Ufficio azioni di promozione culturale del territorio attraverso il **CEC (Cartellone Unico e Coordinato degli Eventi Culturali dei Comuni del Cratere)**, che raccoglie le iniziative culturali nel Cratere, favorendone la sistematizzazione e la diffusione.

Le ulteriori competenze assunte nel tempo dall'USRC ne hanno sancito il ruolo di riferimento per il territorio. Il modello di governance per la gestione ordinaria della ricostruzione post sisma 2009 - con l'Ufficio Speciale a coordinamento e

raccordo degli Enti locali colpiti dal sisma - oltre ad aver dato prova di efficacia nella gestione dei processi di ricostruzione, è infatti sempre più utilizzato per attuare progetti di sviluppo su vasta scala, ponendosi come soluzione aggregativa di funzioni a servizio dell'intero Cratere.


2. PIANI DI RICOSTRUZIONE

La **Legge n. 77 del 24 giugno 2009**, di conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, all'art.14, co.5-bis, ha previsto che la ricostruzione dei centri storici dei Comuni del cratere avvenga previa predisposizione dei Piani di Ricostruzione, i cui obiettivi, contenuti e procedura di approvazione sono definiti dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010.

Dei 56 Comuni del Cratere, **55 Comuni hanno predisposto il PdR** e sono pervenuti alla conclusione dell'iter di approvazione. Di questi:

- **11 Comuni** hanno raggiunto l'Intesa sul PdR tra Sindaco, Presidente della Provincia e Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, nel corso dello stato di emergenza;
- **44 Comuni** (2 dei quali, Barete e Barisciano, con riferimento agli Ambiti non oggetto di Intesa nella fase emergenziale) hanno ottenuto l'attestazione della congruità economica del PdR con Nulla osta dell'USRC, nella gestione ordinaria.

L'USRC ha stimato le risorse residue occorrenti per la ricostruzione del centro storico di **1 Comune**, Torre de' Passeri, unico nel Cratere a non aver predisposto il PdR, non avendo raggiunto nel corso dello stato di emergenza l'Intesa sulla Perimetrazione del centro storico (art.3, DCD 3/2010).

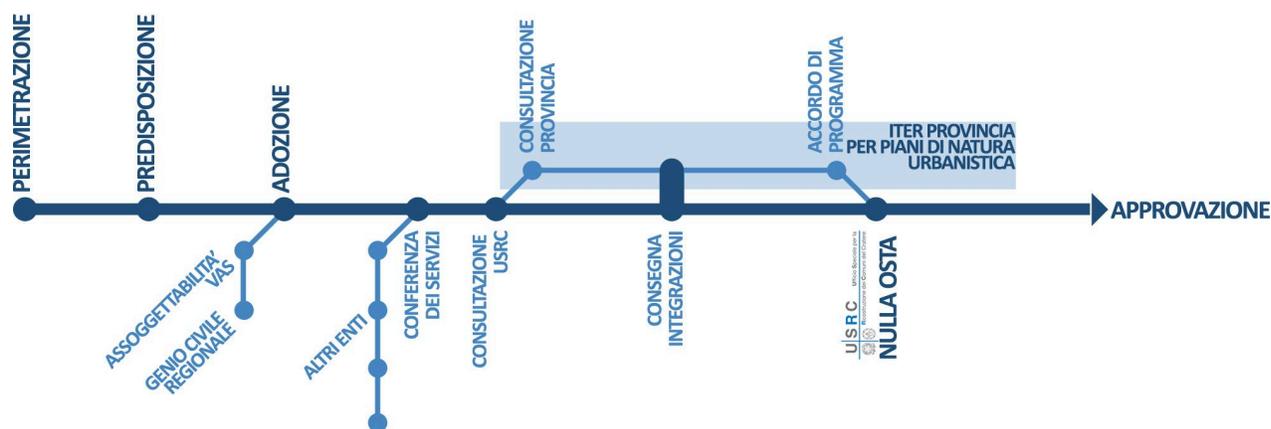



La **Legge n. 134 del 7 agosto 2012**, all'art. 67-quinquies, ha attribuito al Piano di Ricostruzione **natura strategica** come tale, è finalizzato a quantificare le esigenze finanziarie per la ricostruzione e a disciplinare le modalità di attuazione ed il cronoprogramma degli interventi di ricostruzione del centro storico – ovvero, se asseverato dalla Provincia, anche **urbanistica**, qualora abbia contenuti urbanistici che aggiornano, modificano, integrano o sostituiscono gli strumenti di pianificazione vigenti.

Dei Piani di Ricostruzione approvati dai **55 Comuni del Cratere**, **8** hanno **natura strategica**, mentre **47** hanno natura anche **urbanistica**.

A conclusione del processo di pianificazione, il quadro programmatico delle risorse necessarie per la ricostruzione dei centri storici dei 56 Comuni del Cratere ammonta a complessivi **3,4 Mld €**, di cui **3,1 Mld €** per interventi di **ricostruzione privata** e **0,3 Mld €** per interventi di **ricostruzione pubblica**.

3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE

3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Dal **2009 ad oggi**, nei 56 Comuni del Cratere sono state presentate domande di contributo in numero di 10.629 per un totale di **4,8 Mld€**.


Il termine per la presentazione, da parte dei privati all'interno dei centri storici dei comuni del cratere, è decorso il 30 settembre 2022. Complessivamente nel solo periodo luglio-settembre 2022 sono state presentate 1.200 nuove domande di contributo.

E' utile porre in evidenza il dettaglio della capacità di risposta del sistema ufficio - soggetti interessati focalizzando l'attenzione sulla performance del processo di istruttoria dei contributi rispetto alla effettiva richiesta.

L'attuale avanzamento della ricostruzione privata nei Comuni del


Cratere in relazione alle richieste di contributo effettivamente presentate è pari al 70%, come da grafico che segue (aggiornato al 31/12/2024).

L'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari a **3,35 Mld€** (pari a 8.674 domande), equivale appunto al **70%** dell'importo complessivo delle richieste di contributo presentate (pari a 4,78 Mld€).

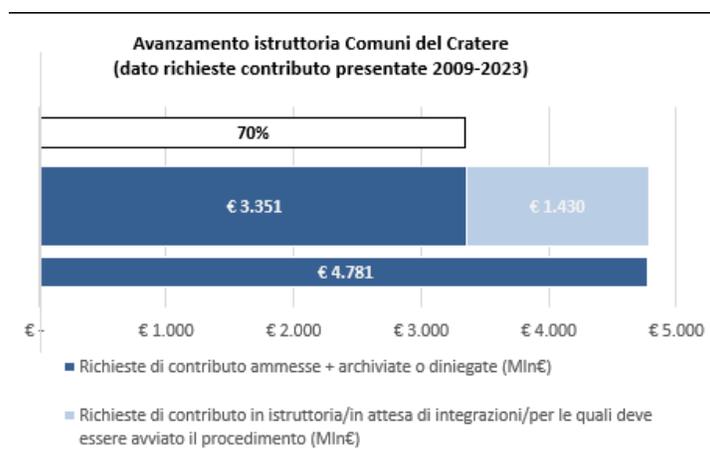

Più nel dettaglio, dal 2009 ad oggi risultano presentate complessivamente, sia presso i Comuni che presso l'USRC e gli Sportelli Decentrati (ex UTR), richieste di contributo per interventi di ricostruzione privata (esclusi gli edifici con esito A) nei Comuni del Cratere pari a **4.781 Mln €**. Di queste, risultano:

- Richieste di contributo **ammesse** per un importo complessivo di **2.950 Mln €** e oltre **300 Mln €** non riconosciuti;
- Richieste di contributo **archivate o diniegate**, il cui procedimento è stato chiuso senza ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte dell'interessato per un importo complessivo di **401 Mln €**;
- Richieste di contributo **attualmente in istruttoria** per un importo complessivo di **115 Mln €**;
- Richieste di contributo **attualmente in attesa di integrazioni** per un importo complessivo di **917 Mln €**;
- Richieste di contributo **per le quali deve essere avviato il procedimento** per un importo complessivo di **398 Mln €**.

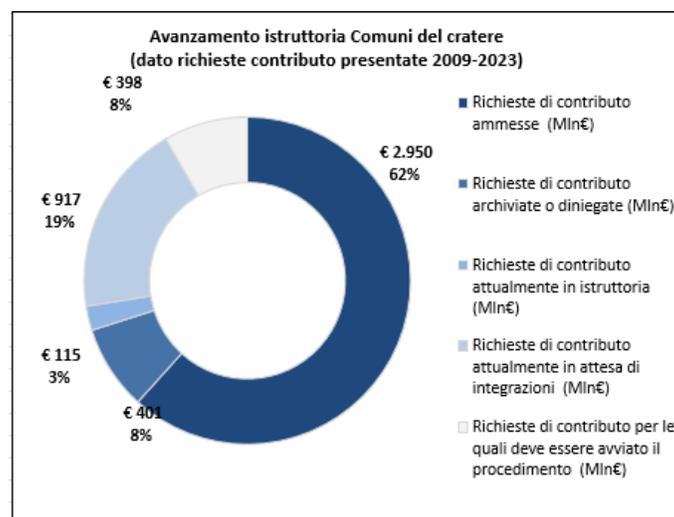


Nella tabella seguente si riporta il dettaglio per singolo comune.

	Avanzamento istruttoria pratiche Cratere			
	Presentate	Chiuse	Da chiudere	Avanzamento
	mln €	mln €	mln €	Percentuale
	A	B	C	B/A
BARETE	€ 58,46	€ 48,29	€ 10,17	83%
CAGNANO AMITERNO	€ 102,91	€ 24,66	€ 78,25	24%
CAMPOTOSTO	€ 112,15	€ 71,03	€ 41,11	63%
CAPITIGNANO	€ 74,31	€ 42,79	€ 31,52	58%
MONTEREALE	€ 128,98	€ 75,04	€ 53,94	58%
PIZZOLI	€ 186,31	€ 90,56	€ 95,75	49%
SCOPPITO	€ 116,37	€ 83,00	€ 33,37	71%
TORNIMPARTE	€ 104,47	€ 43,97	€ 60,50	42%
ARSITA	€ 34,51	€ 28,66	€ 5,85	83%
CASTELLI	€ 60,97	€ 27,65	€ 33,32	45%
COLLEDARA	€ 33,11	€ 20,10	€ 13,01	61%
FANO ADRIANO	€ 34,33	€ 21,20	€ 13,14	62%
MONTORIO AL VOMANO	€ 114,63	€ 57,47	€ 57,16	50%
PENNA SANT'ANDREA	€ 17,13	€ 16,80	€ 0,33	98%
PIETRACAMELA	€ 53,54	€ 30,87	€ 22,67	58%
TOSSICIA	€ 47,32	€ 24,94	€ 22,38	53%
CASTEL DEL MONTE	€ 39,35	€ 33,04	€ 6,31	84%
SANTO STEFANO DI SESSANIO	€ 48,92	€ 30,17	€ 18,75	62%
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	€ 73,04	€ 53,47	€ 19,57	73%
BRITTOLI	€ 15,79	€ 13,20	€ 2,59	84%
BUSSI SUL TIRINO	€ 90,49	€ 79,54	€ 10,95	88%
CAPESTRANO	€ 91,12	€ 58,31	€ 32,81	64%
CIVITELLA CASANOVA	€ 33,78	€ 25,99	€ 7,79	77%
CUGNOLI	€ 20,52	€ 19,64	€ 0,87	96%
MONTEBELLO DI BERTONA	€ 17,34	€ 16,44	€ 0,90	95%
OFENA	€ 73,99	€ 48,29	€ 25,70	65%
POPOLI	€ 79,56	€ 63,69	€ 15,87	80%
TORRE DE' PASSERI	€ 41,44	€ 39,99	€ 1,46	96%
CAPORCIANO	€ 69,26	€ 58,03	€ 11,23	84%
CARAPELLE CALVISIO	€ 47,04	€ 30,41	€ 16,63	65%
CASTELVECCHIO CALVISIO	€ 51,48	€ 26,11	€ 25,37	51%

NAVELLI	€ 125,86	€ 111,51	€ 14,34	89%
PRATA D'ANSIDONIA	€ 131,46	€ 87,41	€ 44,05	66%
SAN PIO DELLE CAMERE	€ 123,87	€ 71,72	€ 52,16	58%
BUGNARA	€ 41,64	€ 36,13	€ 5,51	87%
CASTEL DI IERI	€ 32,85	€ 32,39	€ 0,47	99%
CASTELVECCHIO SUBEQUO	€ 60,33	€ 56,27	€ 4,06	93%
COCULLO	€ 19,17	€ 17,65	€ 1,52	92%
COLLARMELE	€ 9,96	€ 6,47	€ 3,50	65%
GAGLIANO ATERNO	€ 58,48	€ 49,28	€ 9,20	84%
GORIANO SICOLI	€ 45,01	€ 43,01	€ 2,00	96%
ACCIANO	€ 102,84	€ 64,02	€ 38,82	62%
BARISCIANO	€ 284,81	€ 199,28	€ 85,53	70%
FAGNANO ALTO	€ 163,63	€ 100,21	€ 63,42	61%
FONTECCHIO	€ 96,48	€ 82,08	€ 14,39	85%
FOSSA	€ 145,15	€ 125,34	€ 19,81	86%
OCRE	€ 140,26	€ 109,48	€ 30,78	78%
POGGIO PICENZE	€ 110,11	€ 80,48	€ 29,63	73%
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	€ 263,42	€ 200,30	€ 63,12	76%
SANT'EUSANIO FORCONESE	€ 123,45	€ 108,49	€ 14,96	88%
TIONE DEGLI ABRUZZI	€ 79,98	€ 67,40	€ 12,58	84%
VILLA SANT'ANGELO	€ 94,90	€ 79,35	€ 15,55	84%
LUCOLI	€ 227,08	€ 151,07	€ 76,01	67%
OVINDOLI	€ 20,04	€ 12,25	€ 7,79	61%
ROCCA DI CAMBIO	€ 74,20	€ 65,94	€ 8,26	89%
ROCCA DI MEZZO	€ 134,73	€ 89,48	€ 45,25	66%
TOTALI	€ 4.782,34	€ 3.350,36	€ 1.431,99	70%

Le ammissioni sono distribuite nel tempo come da grafico che segue (dato istruttoria al 31/12/2024 con monitoraggio al 30/10/2024). Nel solo anno 2024, sono stati ammessi contributi per un importo pari a **349 Mln €**.

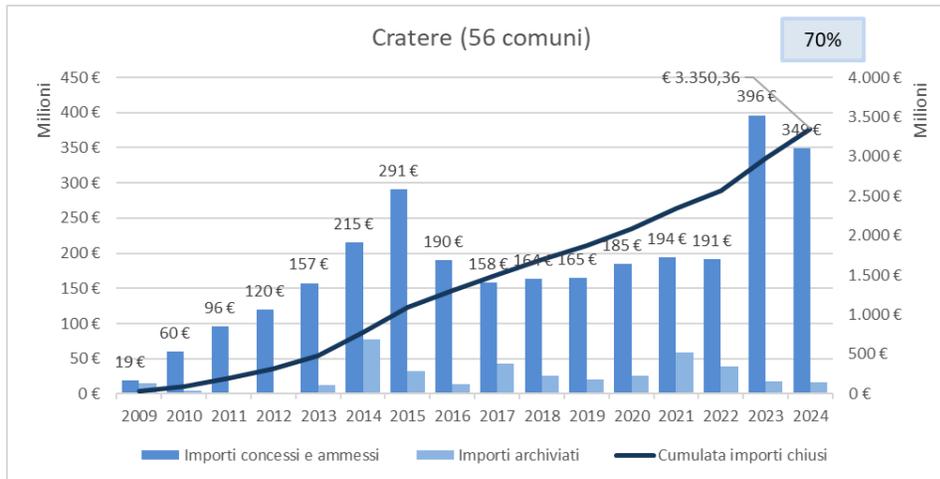

Ammissioni: Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (Millioni di euro, dati al 31/12/2024).

Area	Presentato	Chiuso	Percentuale
	A	B	C=B/A
AD2	€ 884	€ 479	54%
AD3	€ 396	€ 228	58%
AD4	€ 161	€ 117	72%
AD5	€ 464	€ 365	79%
AD6	€ 549	€ 385	70%
AD7	€ 267	€ 241	90%
AD8	€ 1.605	€ 1.216	76%
AD9	€ 456	€ 319	70%
Tot/media	€ 4.782	€ 3.350	70%

Ammissioni: Percentuale di chiusura dei contributi (ammissioni e archiviazioni) per singola Area omogenea (Millioni di euro, dati al 31/12/2024)


Nel dettaglio si riportano nella tabella sottostante il numero di avvii e chiusure 2024 disposte dai singoli responsabili del procedimento incaricati per l'istruttoria a cui si aggiungono le pratiche avviate e chiuse dai responsabili gestionali dei 3 settori dell'Area Ricostruzione Privata con il supporto istruttorio del personale interno in attività presso l'USRC e gli Sportelli decentrati e di consulenti esterni.

	Avvii		Chiusure	
	n	€ [Mln]	n	€ [Mln]
ADALBERTO SACCHINI	60	€ 53,56	32	€ 34,06
VINCENZO MARTINELLI	64	€ 50,07	18	€ 21,32
ANNALISA DI CRISTOFARO	77	€ 60,07	32	€ 24,42
FRANCESCA PROSPERINI	80	€ 90,01	30	€ 18,27
GIULIA DI TOMMASO	29	€ 22,64	35	€ 26,78
IVAN DI POMPEO	11	€ 8,40	15	€ 8,82
MARIA LUISA PARISI	29	€ 22,36	40	€ 32,64
NADIA MARCANTONIO	22	€ 20,87	16	€ 18,11
ROBERTA SCARIZZA	57	€ 33,22	35	€ 41,00
SARA SABABA	36	€ 21,38	24	€ 19,32
VANNI RANIERI	15	€ 9,43	32	€ 31,28
TOT	480	€ 392,01	309	€ 276,02



3.2 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI


Per quanto riguarda lo **stato di avanzamento** in termini di **cantieri e SAL**, dal 2009 ad oggi è stato liquidato un importo complessivo pari a **1,89 Mld €** (dato periferia + centro storico, esclusi gli interventi su edifici con esito A).

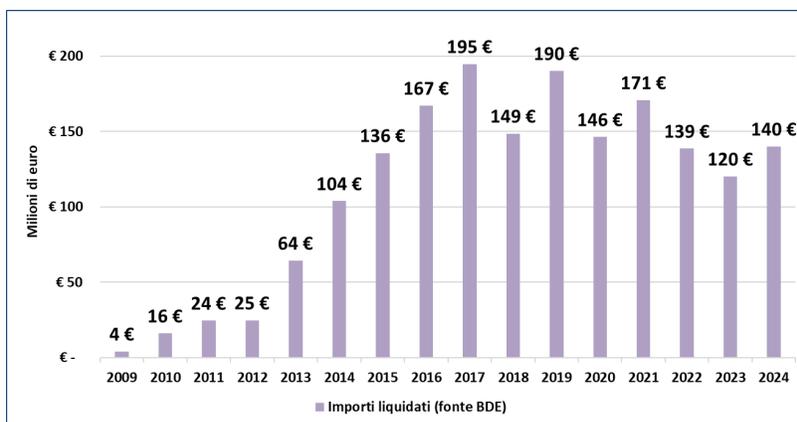

*SAL: Avanzamento nel tempo delle erogazioni dei **comuni** a seguito di nulla osta SAL per la ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (dati al 31/12/2024 - Fonte: BDE)*

Area	Capofila	Importo (milioni di euro)	% sul totale
		A	B=A/somma(A)
2	Barete	€ 185,76	10%
3	Montorio al Vomano	€ 96,41	5%
4	Castel del Monte	€ 72,53	4%
5	Bussi sul tirino	€ 212,48	12%
6	Caporciano	€ 227,58	13%
7	Goriano Sicoli	€ 134,51	8%
8	Barisciano	€ 680,40	38%
9	Rocca di Mezzo	€ 180,32	10%

SAL: Distribuzione degli importi totali dei contributi liquidati dai **comuni** tra le aree omogenee - SAL. (dati al 31/12/2024)

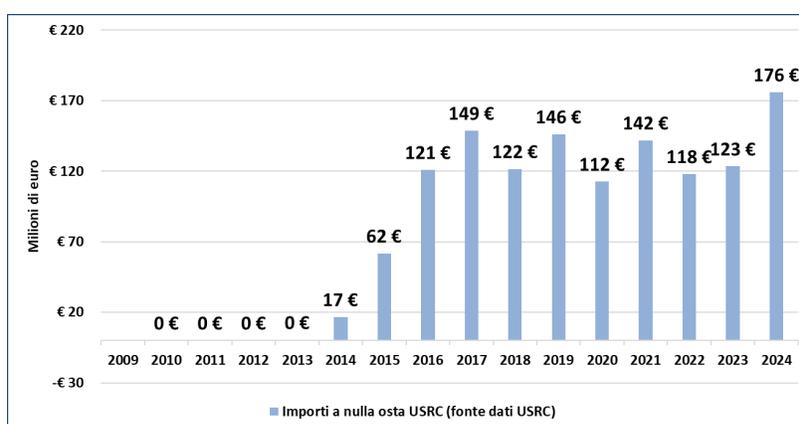

SAL: Avanzamento nel tempo dei nulla osta da parte di **USRC/SP** per la ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (dati al 31/12/2024 - Fonte: dati USRC)

Gli **immobili** danneggiati, nei Comuni del Cratere, per i quali sono terminati i lavori al 31/12/2024, sono stimati in circa **12.490**, su un totale stimato di 23.240 abitazioni inagibili alla data del 2009. Gli immobili con lavori terminati nell'anno 2024 (e riconducibili ai SAL Finali presentati) sono 940. I **cantieri** di ricostruzione privata **attualmente attivi nel Cratere sono 695** (dato al 31/12/2024).

Pratiche con cantieri attivi		Immobili con lavori terminati	
		12.490 ^(*)	
		Di cui	
Totali Attivi	695	Prime Abitazioni	Altro (seconde ab e altri usi)
		3.910	8.580
(*) escludendo i 9.700 interventi realizzati su abitazioni con esito di agibilità A.			

3.3 MIC – FOCUS SUL MODELLO INTEGRATO CRATERE


Per la ricostruzione dei **Centri Storici** dei 56 Comuni del Cratere, la procedura parametrica **MIC - Modello Integrato Cratere**, introdotta con Decreto USRC n.1/2014, ha regolamentato i criteri per la determinazione ed il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata (DPCM 4/2/2013).

Attraverso il Modello Integrato Cratere, dal 2014 ad oggi, sono state presentate **3.471** richieste di contributo, per un importo totale di circa **3.744 Mln €**. Di queste ad oggi sono state **ammesse 1.897 pratiche MIC** per un importo di **2.141 Mln €**. Alle istanze ammesse corrispondono 1.206 cantieri MIC avviati, di cui 816 cantieri con lavori già terminati e 390 in corso (dato al 31/12/2024).

Schede MIC Presentate [numero]	Schede MIC Presentate [importo]	Schede MIC Ammesse [numero]	Schede MIC Ammesse [importo]	Cantieri MIC	
3.471	3.744 Mln €	1.897	2.141 Mln €	1.206	
				Chiusi	Aperti
				816	390

3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

Nel 2024 sono stati conclusi **cantieri** per 940 immobili per un valore di 115 Mln € e avviati per 1.820 immobili per un valore di 218 Mln € (corrispondenti rispettivamente a SAL finali e SAL1 presentati). Si riportano di seguito le immagini di alcuni cantieri che hanno visto la fine lavori o l'avvio nell'anno 2024.

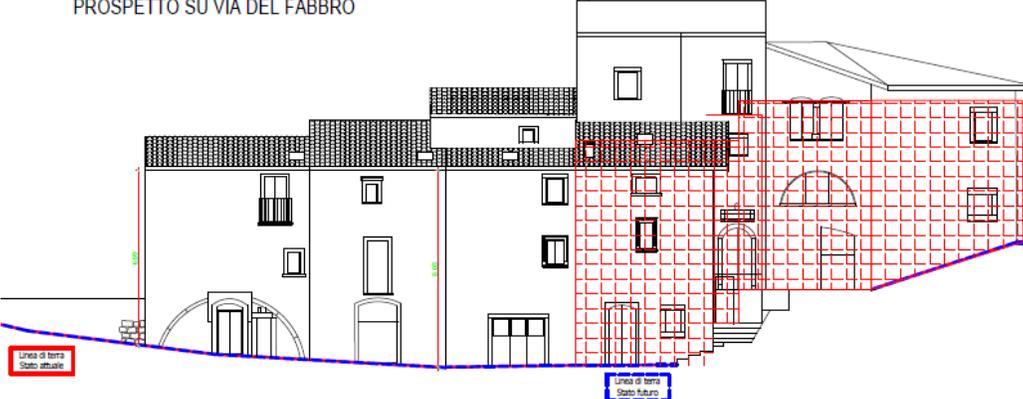Comune di Poggio Picenze – AQ-PPI-E-02754 <u>Cantiere avviato in aprile 2024</u>	Immobili: 15 Importo ammesso: 1.301.376,00 €
<p>PROSPETTO SU VIA DEL FABBRO</p> 	
	

Comune di Gagliano Aterno - AQ-GAT-E-14470
Cantiere chiuso nel febbraio 2024

Immobili: 6
Importo ammesso: 491.200,51 €



Com'era



Com'è




4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE

Dal 2013 l'USRC è competente (L. 71/2013, art. 7, co. 6) per i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione ricadenti nel territorio dei Comuni fuori Cratere, ovvero in quei Comuni abruzzesi che, pur non ricompresi nel Cratere sismico, hanno comunque riportato danni aventi nesso di causalità diretto con il sisma del 6 aprile 2009 (art. 1, co. 3, L.77/2009).

Si tratta di complessivi 121 Comuni, di cui 44 nella provincia dell'Aquila, 33 nella provincia di Teramo, 38 nella provincia di Pescara e 6 nella provincia di Chieti.

L'USRC, a partire dal gennaio 2019, ha preso in carico le **attività istruttorie** inerenti le richieste di contributo e SAL per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni fuori Cratere. Tale competenza - inizialmente attribuita, a far data dal 2014, agli UTR - Uffici Territoriali per la Ricostruzione "di frontiera" (competenti per l'Area omogenea del Cratere geograficamente prossima ai Comuni fuori cratere interessati), coordinati dall'USRC (Del. CIPE n. 1/2014; L.125/2015, art.11, co.13) - è stata trasferita integralmente all'USRC dal 2018, a seguito della soppressione degli UTR (L.172/2017).

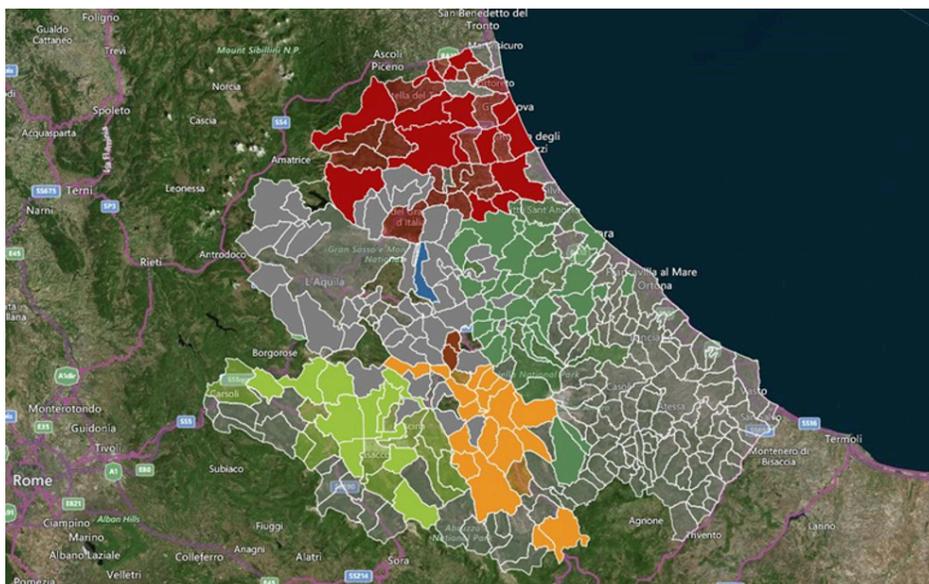


A fronte di un importo complessivamente richiesto di circa **1.024 mln di euro**, i **contributi ammessi** per la ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, dal 2009 ad oggi, ammontano a circa **620 Mln € di cui:**

- **85,19 Mln €** ammessi con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti e credito d'imposta (finanziamento agevolato) nel periodo 2009-2012;

- **515,84 Mln €** ammessi sul canale del finanziamento diretto.


Ad essi si aggiungono le richieste di contributo archiviate o diniegate, per un importo di **67 Mln €**.

L'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari a **687 Mln €**, equivale al **68%** dell'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

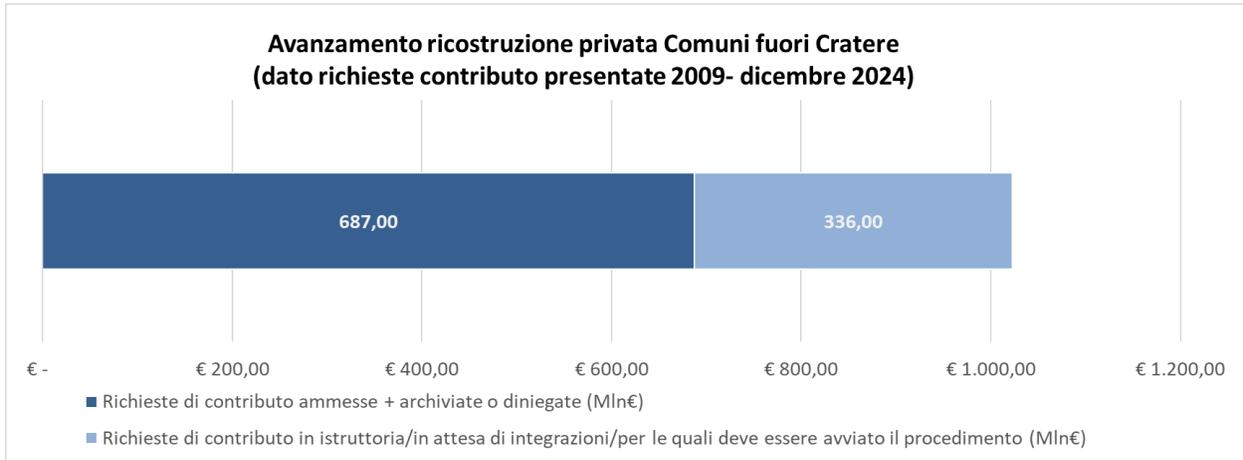

L'USRC, a far data dal **2019**, ha preso in carico **928** richieste di contributo giacenti, per un importo totale pari a circa **263,23 Mln €**, delle quali **882** è stato avviato il procedimento. In particolare, risultano:

- **152** Richieste di contributo **ammesse** per un importo complessivo di **87,60 Mln €**;
- **498** Richieste di contributo **archivate o diniegate**, il cui procedimento è stato chiuso senza ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte dell'interessato, per un importo complessivo di **59,81 Mln €**;
- **91** Richieste di contributo in **istruttoria** per un importo complessivo di **49,81 Mln €**;
- **141** Richieste di contributo in **attesa di integrazioni** per un importo complessivo di **49,37 Mln €**;
- **46** Richieste di contributo **per le quali deve essere avviato il procedimento** per un importo complessivo di **10,52 Mln €**.

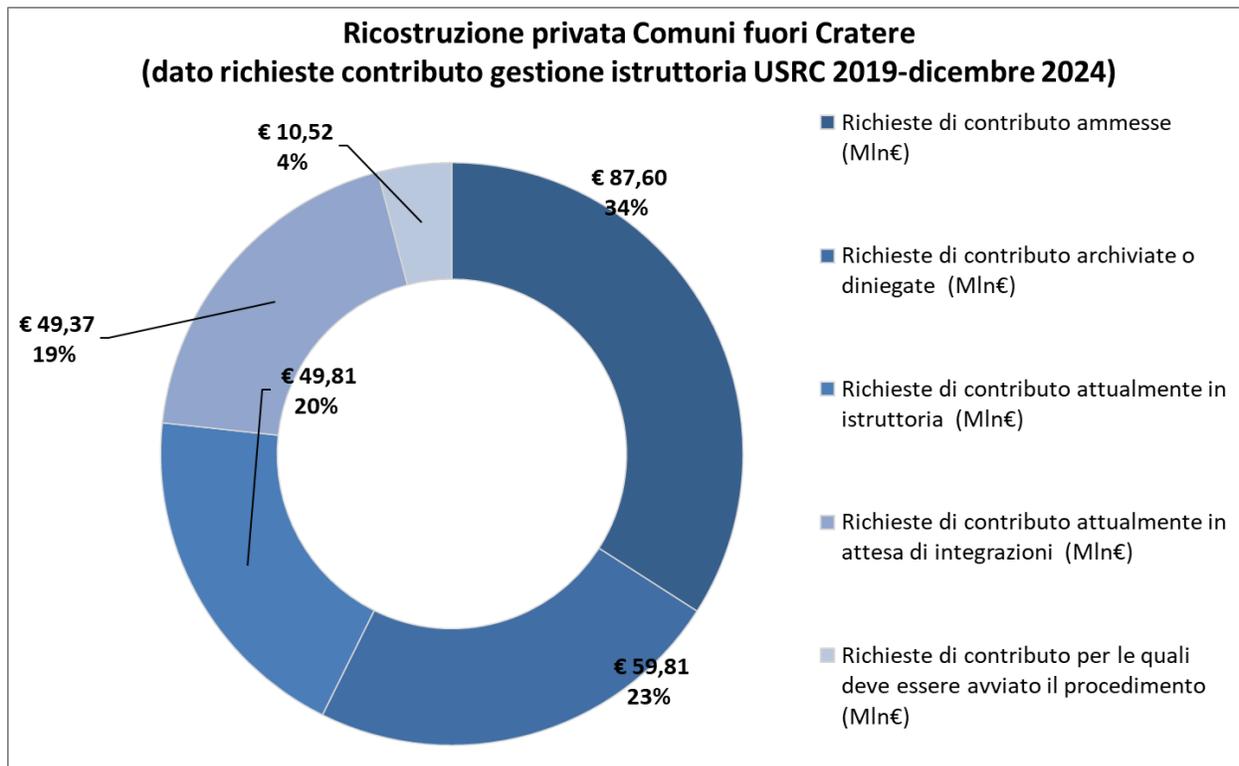

Da gennaio a dicembre del 2024 sono stati ammessi **46** contributi per un importo pari a **30,16 Mln €**.

L'USRC, a far data dal 2019, ha gestito inoltre **356** richieste di liquidazione **SAL** per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, di cui **320 liquidate, per un importo complessivo di 35 Mln €**. Da gennaio a dicembre del 2024 sono stati liquidati **39** SAL per un importo pari a **3,98 Mln €**.

Le **abitazioni** nei Comuni fuori Cratere per le quali è stata ripristinata l'agibilità sono stimate in **2.167** su un totale di circa 3.610 abitazioni inagibili alla data del 2009. Le abitazioni tornate agibili nel 2024 sono 95. I **cantieri** di ricostruzione privata fuori Cratere **attualmente in corso sono 216**.

5. GESTIONE FONDI



L'USRC esegue il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata nei Comuni del Cratere e fuori Cratere (art. 4, Decreto MEF del 29 ottobre 2012), che è inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria

Generale dello Stato e pubblicato sul sito www.usrc.it.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per la ricostruzione privata sul canale diretto aggiornato al **16/12/2024**:

RICOSTRUZIONE PRIVATA	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPEGNATE	RISORSE TRASFERITE
Comuni cratere	€ 1.942.260.056,12	€1.904.458.541,32	€ 1.488.689.207,22
Comuni fuori cratere	€ 471.077.480,85	€ 470.948.055,35	€ 383.347.71215

Ai sensi delle Delibere CIPE n. 23/2014 e n. 22/2015, l'USRC cura inoltre l'assegnazione e trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni del Cratere e fuori cratere. Le risorse sono assegnate ai singoli Comuni per i soli interventi immediatamente attuabili e solo nel caso in cui siano state integralmente impegnate le risorse precedentemente assegnate. In tal modo sono garantiti l'efficiente utilizzo delle risorse per la ricostruzione privata e la corretta allocazione delle stesse nei Comuni con maggiore capacità di spesa.

A inizio 2023 è stato emanato il **decreto USRC 1 del 14/02/2023** che ha modificato le procedure di ammissione a contributo, consentendo, contestualmente all'approvazione dell'istanza, l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'integrale copertura economica e il trasferimento del 40% di risorse di cassa per consentire il pagamento delle spese sostenute per indagini, progettazioni e anticipazione lavori.

Nel mese di settembre 2024 è stata avanzata da parte dell'USRC la richiesta di assegnazione di ulteriori risorse per la ricostruzione privata, calcolata moltiplicando la migliore media di ammissioni mensili del primo semestre del 2024 per 18 mesi in maniera tale da soddisfare il fabbisogno finanziario delle pratiche di ricostruzione privata che saranno ammesse nei prossimi 18 mesi. La richiesta ammontava all'attribuzione di 577 milioni di euro, di cui 480 milioni per l'ambito territoriale dei comuni del cratere e 97 milioni per l'ambito dei comuni fuori cratere.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) con delibera del 19/12/2024 ha assegnato all'USRC **378 milioni di euro** utili a soddisfare il fabbisogno finanziario delle pratiche di ricostruzione privata che saranno ammesse nel prossimo anno.

5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 31/10/2024, raggiunge un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di 2.727.009.285 € (2.933.233.280 € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 16/12/2024 l'**USRC** ha **assegnato** complessivamente 1.904.458.541,32 €, di cui trasferiti 1.488.689.207,22 €.

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC	€ 1.942.260.056,12	
B. Totale utilizzi USRC Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni del cratere		€ 1.904.458.541,32
C. Totale Disponibile Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Cratere		€ 37.801.514,80

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 55 Comuni del Cratere e rappresentano circa il 85% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

Nel 2024 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 140.622.973,82** per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati finanziamenti per complessivi **€ 129.538.975,79**.

5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 31/10/2024, raggiunge un importo totale dei **contributi concessi** con finanziamento diretto di **455.794.717 €** (537.508.731 € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 16/12/2024 l'**USRC** ha **assegnato** € 470.948.055,35, **di cui trasferiti** € 375.269.040,37.

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC	€ 471.077.480,85	
B. Totale utilizzi USRC Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni Fuori Cratere		€ 470.948.055,35
C. Totale Disponibile Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Fuori Cratere		€ 129.425,50 (comprensivi residui gestioni precedenti)

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 116 Comuni del Fuori Cratere e rappresentano circa il 93% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

Nel 2024 sono stati complessivamente **trasferiti** da parte dell'USRC € **22.863.891,50** per interventi di ricostruzione privata e sono stati **assegnati** finanziamenti per complessivi € **35.936.633,57**.



6. RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Nel rispetto del riparto di competenze previsto nella gestione ordinaria, l'USRC dal 2013 cura la programmazione delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica, effettua il trasferimento delle somme e cura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (Decreto del MEF del 20/10/2012).

A partire dal 2013, nel corso della gestione ordinaria, sono stati programmati **398** interventi di ricostruzione pubblica **per complessive risorse assegnate pari ad € 242.370.886,73** che riguardano il ripristino, a seguito del danneggiamento arrecato dal sisma 2009, di beni pubblici quali: Case Comunali, Reti di servizi e infrastrutture, Edilizia Residenziale Pubblica, Centri di Aggregazione, Edilizia Cimiteriale; interventi che hanno visto quali soggetti attuatori i Comuni del Cratere e del fuori Cratere, l'ente Provincia e l'ATER di Chieti e Pescara.

Ad oggi sono **277 i progetti finanziati in via definitiva** attraverso determinazioni di impegno economico da parte dell'USRC, per complessivi **€ 113.003.939,55**

Le principali fonti di finanziamento degli interventi di Ricostruzione pubblica, dal 2013 ad oggi, sono:

Delibera CIPE 135/2012, a valere sulla quale è stata definita la **Programmazione triennale della Ricostruzione Pubblica (2013 - 2015) dei Comuni del Cratere** per un importo complessivo di **126,45 Mln €**;

Delibera CIPE 23/2015, avente ad oggetto "REGIONE ABRUZZO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6 APRILE 2009 RICOGNIZIONE RISORSE RESIDUE EX ART. 14, C. 1, d.l. 39/2009 (l. DI CONV. 77/2009)

E DELIBERA cipe 35/2009. FINALIZZAZIONI VARIE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'OPCM N. 4013/2012" a valere sulla quale sono stati finanziati interventi di ricostruzione o riparazione degli **immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER)** delle province di CHIETI e PESCARA **per complessivi € 27.109.458,42.**

Delibera CIPE n. 48/2016, che ha definito gli indirizzi, i criteri e le modalità per la predisposizione dei **"Programmi pluriennali di intervento di settore"** e dei relativi **"Piani annuali di attuazione"**, al fine di razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica, in linea con le previsioni del DL n. 78/2015, ed ha approvato un "Piano Stralcio", che finanzia interventi nei Comuni del Cratere per complessivi **€ 1.451.330,23.**

Delibera CIPE n. 24/2018, che ha approvato il Piano annuale 2018 relativo al Settore 4 - "Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali" ed ha assegnato risorse all'USRC per complessivi **21,3 Mln €**, destinati a **21** interventi nei Comuni del Cratere e a **14** interventi nei Comuni fuori Cratere;

Delibera CIPE n. 18/2020, che ha approvato il secondo Piano annuale 2020 relativo al Settore 4 - "Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali" ed ha assegnato risorse per un importo di **30,3 Mln €** all'USRC per l'attuazione di 37 interventi in Comuni del Cratere e fuori Cratere.

Delibera CIPESS n. 58/2024, che ha approvato il terzo Piano annuale 2024 relativo al Settore 4 - "Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali" ed ha assegnato risorse per un importo di **35,7 Mln €** all'USRC per l'attuazione di 28 interventi in Comuni del Cratere e fuori Cratere.

Dei **277 progetti finanziati fino ad oggi in via definitiva**, per complessivi **€ 113.003.939,55**, si dettaglia quanto segue:


- **148** interventi sono ultimati o in fase di collaudo, per un importo pari a circa **46,2 Mln €**;
- **56** interventi con lavori in corso, per un importo pari a **34 Mln €**;
- **73** interventi per i quali è in corso l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, per un importo pari a **32,8 Mln €**.

Risultano inoltre **altri 122 interventi in fase di programmazione/progettazione** per i quali è stato determinato un impegno di spesa di complessivi **127,9 Mln €**.

Dal 2013 ad oggi sono state complessivamente trasferite ai Comuni del Cratere e del Fuori Cratere risorse per **€ 84.158.770,82** per il pagamento delle progettazioni svolte e dei lavori eseguiti.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle risorse assegnate, impegnate, e trasferite per la ricostruzione pubblica nel **periodo 2013-2024**:

RICOSTRUZIONE PUBBLICA	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPEGNATE	RISORSE TRASFERITE agli ENTI
Ricostruzione pubblica (esclusi interventi emergenziali, DPC, Provveditorato, Mibact)	€ 242.370.886,73	€ 113.003.939,55	€ 84.158.770,82

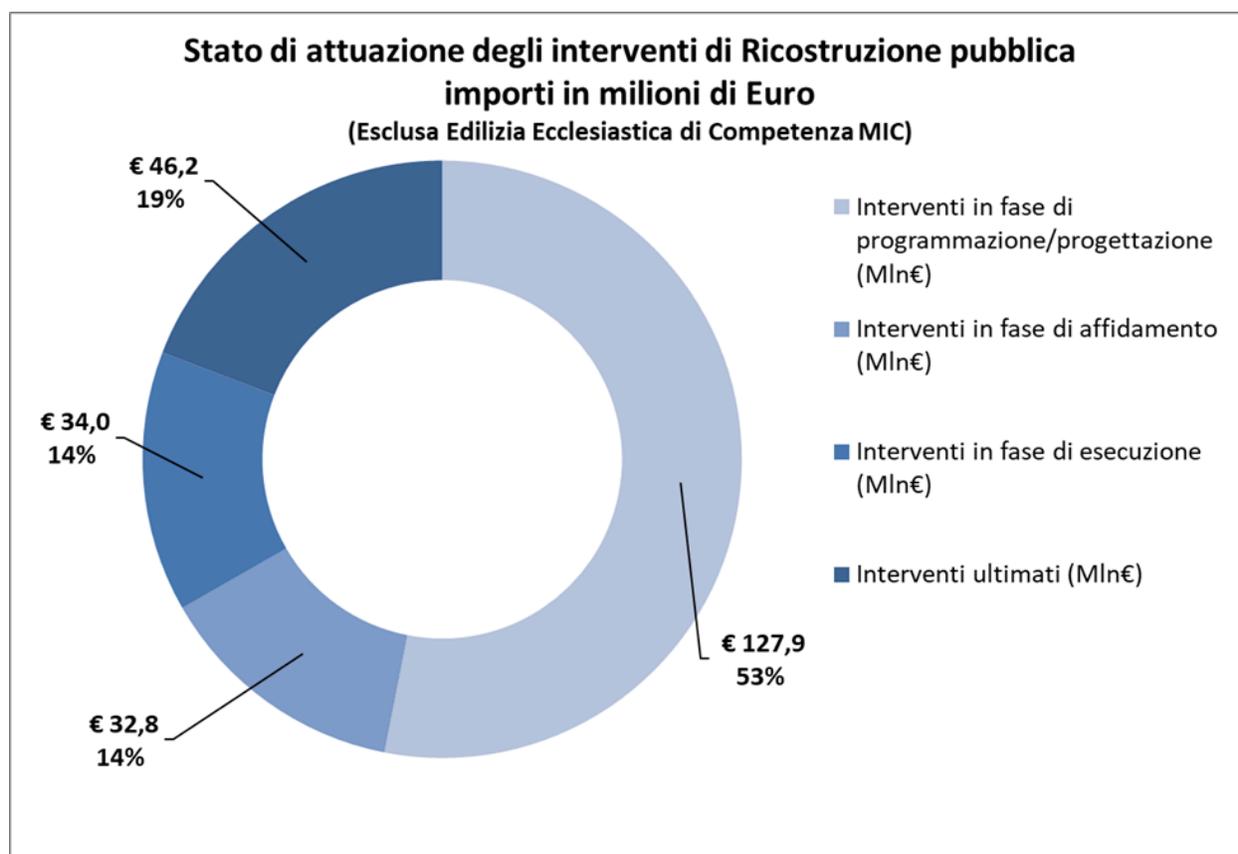

Nel corso del secondo semestre del 2024, si è conclusa l'attività di programmazione delle ulteriori esigenze relative al Settore 4 "funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali" con l'approvazione del nuovo piano annuale. Con la **CIPRESS n.58/2024** pubblicata in G.U. il 24/10/2024 sono risultati assegnatari di nuovi finanziamenti 21 amministrazioni ricadenti sia nel Cratere che nel Fuori Cratere per totali **28 interventi che ammontano a complessivi 35.743.385,15 €**.

Nel corso dell'anno sono tornati agibili dopo i lavori di recupero con fondi sisma 2009 il **Municipio di Montebello di Bertona**, tornato fruibile grazie ad un intervento di miglioramento sismico che ha visto un finanziamento complessivo pari ad € 518.734,70...



....**Palazzo Tinozzi**, sede municipale del comune di **Cugnoli**, con un intervento di miglioramento sismico che ha visto un doppio finanziamento per un totale di €1.518.813,80....



....e la **Casa Comunale di Ovindoli**, con un intervento di sostituzione edilizia per un importo pari ad € 1.174.413,05.



7. EDILIZIA SCOLASTICA



Con Decreto DiSET n. 48 del 14 marzo 2013, sono state trasferite all'USRC le competenze per l'attuazione del Piano denominato "**Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza**", finalizzato alla riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per tutte le scuole della Regione Abruzzo ad eccezione di quelli ricadenti nel Comune di L'Aquila.

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati **245** interventi sull'edilizia scolastica, per complessivi **244 Mln €**, **207** dei quali nel corso della gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un importo pari a circa **204,9 Mln €**.

Più di recente, con Delibera CIPE n. 32/2019, all'USRC è stata conferita **la responsabilità di attuazione del Piano annuale degli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica** nell'ambito territoriale di propria competenza, mentre al MIUR è assegnata la competenza della programmazione del Settore.


Gli interventi previsti riguardano **la riparazione, il miglioramento sismico e la costruzione di nuovi edifici scolastici**, coinvolgendo oltre **160 edifici, 4 province e 98 comuni, e quasi 30.000 studenti abruzzesi**.

Sulla base dei criteri e delle procedure definiti dall'USRC, ad oggi, sono stati approvati **127 interventi per oltre 128,4 Mln €**, immediatamente cantierabili, e sono state trasferite agli enti attuatori risorse **per 111,8 Mln €**.

Dei 127 interventi approvati dal 2013 ad oggi, 90 hanno concluso i lavori e 37 sono in fase di esecuzione.

Dei **204,9 Mln €** di interventi finanziati, risultano, in particolare:

- interventi ultimati per un importo pari a **83,4 Mln €** assegnati per **90 interventi**;
- interventi in fase di esecuzione per un importo pari a **55,7 Mln €** assegnati per **37 interventi**;
- interventi in fase di progettazione/programmazione, per un importo pari a **58,4 Mln €** assegnati per **60 interventi**;
- interventi de-finanziati per un importo pari a **7,4 Mln €** assegnati per **19 interventi**.

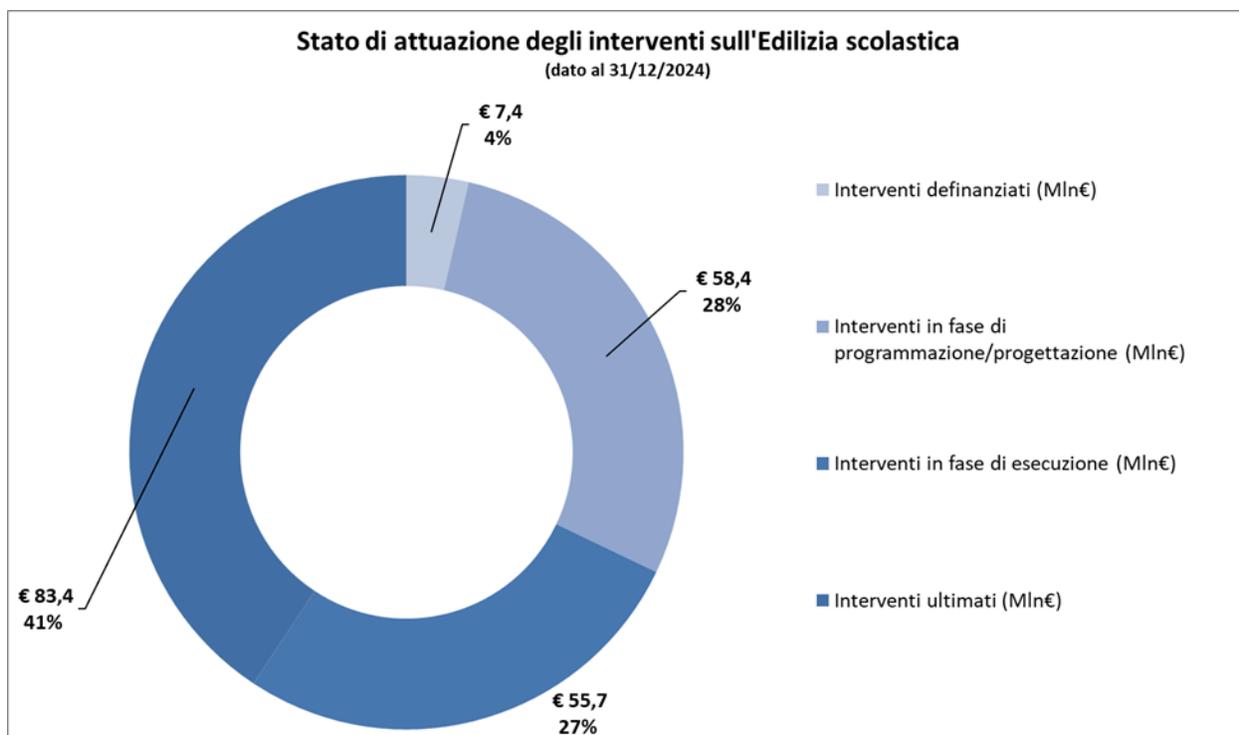

Nel mese di aprile è stata avviata la ricognizione della terza annualità dell'edilizia scolastica, tra gli obiettivi anche la revisione dei criteri di finanziamento e dei parametri economici. Nel secondo e terzo trimestre del 2024 sono stati contattati 54 Enti, di cui 50 Comuni del Cratere e le 4 Province dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti; **si è avuto riscontro da 37 Amministrazioni (11 Comuni Cratere, 23 Comuni Fuori Cratere oltre alle Province di L'Aquila, Pescara e Chieti) per 63 interventi (15 relativi ai progetti delle scuole dei Comuni del Cratere, 35 dei Comuni Fuori Cratere e 13 interventi relativi a scuole delle Province).**

Gli interventi riguardano edifici che hanno manifestato un'elevata vulnerabilità sismica e sono finalizzati al raggiungimento del massimo livello di sicurezza conseguibile con il finanziamento disponibile; per quasi la metà di essi è prevista la sostituzione dei vecchi fabbricati con nuovi edifici scolastici.

A valle dell'attività di ricognizione del fabbisogno, la deliberazione del CIPESS del 19/12/2024 ha approvato secondo i nuovi criteri un piano annuale composto da **7 interventi** (3 nel cratere e 4 fuori cratere) per circa **8 mln €**.

n.	ENTE ATTUATORE	DENOMINAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO APPROVATO
1	Bussi sul Tirino	Scuola dell'infanzia	Sostituzione edilizia	€565.000,00
2	Campoli	Scuola primaria in località piano nocella	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€1.166.053,00
3	Castel di Sangro	Scuola secondaria di I grado "A. Petrarca"	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€500.000,00
4	Castelvecchio Subequo	Scuola primaria e secondaria di I grado in via Benedetto Croce e via degli Equi	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€3.600.000,00
5	Civitella Casanova	Scuola primaria in Via Guglielmo Marconi	adeguamento sismico con efficientamento energetico e impiantistico	€680.000,00
6	Provincia dell'Aquila	Istituto I.T.C. - I.T.G. "De Nino - Morandi" Sulmona	adeguamento sismico con efficientamento energetico e impiantistico	€977.907,76
7	Sulmona	Scuola primaria "Masciangioli"	Adeguamento sismico con efficientamento energetico e impiantistico	€1.350.000,00
				€8.838.960,76

Continua da parte di USRC l'attività istruttoria sulle istanze pervenute. Ad oggi, a seguito di verifica dei requisiti essenziali, **le istanze ammontano a 48 per 35 Enti per un importo complessivo stimato di oltre 95 mln €, con lo scopo di predisporre un successivo addendum alla Deliberazione CIPESS.**

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi per i quali sarà necessaria la verifica del rispetto dei criteri di congruità tecnico-economica.

n.	ENTE ATTUATORE	DENOMINAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO RICHIESTO
1	Avezzano	Scuola primaria "Giovanni XXIII"	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€4.452.840,00
2	Avezzano	Polo scolastico in Via Puglie	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€650.000,00
3	Avezzano	Scuola primaria "San Pelino"	Sostituzione edilizia	€1.225.000,00

4	Barisciano	Scuola primaria e secondaria di I grado "U. Piccinini" e palestra	Miglioramento sismico con efficientamento energetico - edificio con vincolo	€399.939,53
5	Bolognano	Palestra	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€75.541,90
6	Capestrano	Polo scolastico "U. Migliorati"	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€4.724.536,40
7	Castellalto	Scuola dell'infanzia in località Castelnuovo Vomano	Sostituzione edilizia	€1.884.600,00
8	Castilenti	Scuola secondaria di I grado	Sostituzione edilizia con delocalizzazione Completamento	€835.053,40
9	Celano	Scuola secondaria di primo grado "Beato Tommaso da Celano"	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€300.000,00
10	Celano	scuola primaria "G. D'Annunzio"	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€250.000,00
11	Civitella Casanova	Palestra (scuola primaria e secondaria di I grado)	Adeguamento sismico con efficientamento energetico e sismico	€1.150.000,00
12	Colledara	Palestra	sostituzione edilizia	€848.600,00
13	Colledara	Scuola secondaria di I grado Capoluogo - Scuola dell'infanzia della frazione Ornano Grande	sostituzione edilizia	€96.000,00
14	Sulmona	Palestra (Scuola secondaria di I grado "Serafini")	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica	€350.000,00
15	Fontecchio	Nuovo plesso scolastico	sostituzione edilizia	€334.188,64
16	Introdacqua	Scuola dell'infanzia e primaria	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€2.193.140,22
17	Loreto Aprutino	Scuola dell'infanzia in località Saletto	Sostituzione edilizia	€826.372,58

18	Montefino	Scuola dell'infanzia	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€570.000,00
19	Pacentro	Nuova scuola primaria e secondaria di I grado "M. Silvestri"	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€380.000,00
20	Pacentro	Palestra (scuola primaria e secondaria di I grado "M. Silvestri")	Nuovo intervento	€1.000.000,00
21	Pereto	Scuola dell'infanzia e primaria	Adeguamento sismico	€440.000,00
22	Pescasseroli	Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado "Benedetto Croce"	Sostituzione edilizia della scuola dell'infanzia e sostituzione edilizia della scuola primaria e secondaria di I° con delocalizzazione	€4.620.000,00
23	Pianella	Scuola primaria Capoluogo in Via Villa De Felice	Adeguamento sismico con efficientamento energetico e impiantistico	€370.000,00
24	Poggio Picenze	Scuola primaria "Silone"	Miglioramento sismico con efficientamento energetico ed impiantistico	€827.491,81
25	Popoli	Complesso Paolini - Scuola primaria ala sud	Miglioramento sismico edificio con vincolo	€486.953,15
26	Provincia dell'Aquila	Liceo classico "Ovidio" Sulmona	Adeguamento impianti e antincendio	€2.098.842,12
27	Provincia dell'Aquila	Liceo scientifico "Fermi" Sulmona	Adeguamento sismico	€9.977.437,28
28	Provincia di Chieti	ITIS "Luigi di Savoia" Chieti	Miglioramento sismico edificio vincolato e Sostituzione edilizia	€10.519.115,95
29	Provincia di Pescara	IPSIA "Amedeo di Savoia" Popoli	Adeguamento sismico con efficientamento energetico e impiantistico	€1.850.000,00

30	Provincia di Pescara	ITCG "Tito Acerbo" Pescara	Miglioramento sismico di strutture sottoposte a vincolo	€1.730.000,00
31	Provincia di Pescara	Liceo artistico musicale coreutico "Misticoni-Bellisario" Pescara	Adeguamento sismico con efficientamento energetico e impiantistico	€8.280.000,00
32	Provincia di Pescara	Liceo artistico "Mario dei Fiori" Penne	Adeguamento sismico con efficientamento energetico e impiantistico	€3.750.000,00
33	Raiano	Scuola dell'infanzia Viale Abruzzo	Adeguamento sismico	136.829,65
34	Rocca di Botte	Scuola dell'infanzia in Via Regina Elena	Adeguamento sismico con efficientamento energetico e impiantistico	€155.000,00
35	Rocca di mezzo	Plesso scolastico "Italo D'Eramo"	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€4.440.000,00
36	San Benedetto dei Marsi	Scuola primaria e secondaria I grado "Marruvium"	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€649.000,00
37	San Demetrio nei Vestini	Scuola primaria e secondaria I grado "F. Rossi"	Sostituzione edilizia	€6.290.000,00
38	San Pio delle Camere	Scuola dell'infanzia	Sostituzione edilizia	€356.500,00
39	Sante Marie	Scuola dell'infanzia "Pio XII"	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€699.024,19
40	Scanno	Scuola primaria e secondaria di I grado	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€344.000,00
41	Sulmona	Nuovo plesso scolastico	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	€2.986.905,89
42	Sulmona	Scuola dell'infanzia Bagnaturo	Sostituzione edilizia	€483.172,64
43	Sulmona	Scuola primaria "Lola di Stefano"	Adeguamento funzionale degli impianti, adeguamento	€1.932.710,41

			antincendio, infissi e finiture	
44	Teramo	Scuola primaria "Risorgimento"	Adeguamento sismico con efficientamento energetico e sismico	€1.905.507,57
45	Teramo	Scuola dell'infanzia "Lettieri"	Adeguamento sismico con efficientamento energetico e sismico	€2.478.750,80
46	Tocco da Casauria	Scuola secondaria di I grado	Sostituzione edilizia	€90.000,00
47	Tornimparte	Nuovo polo scolastico	Sostituzione edilizia della scuola secondaria di I e sostituzione edilizia con delocalizzazione della scuola primaria	€3.867.030,99
48	Villa Santa Maria	Scuola primaria in Via Duca degli Abruzzi	Adeguamento sismico con efficientamento energetico ed impiantistico	€855.571,67
				€95.165.656,79


L'inaugurazione della scuola "Umberto Sclocchi" di San Benedetto de' Marsi ha dato il via, per il 2024, alla prima occasione di incontro con gli studenti e la comunità per la riconsegna della scuola danneggiata dal sisma del 2009, oggetto di un intervento di adeguamento sismico ed impiantistico finanziato per € 850.000,00.



San Benedetto dei Marsi (AQ), Scuola dell'infanzia "Umberto Sclocchi" - inaugurazione 28/05/2024

Sempre nel mese di maggio è stato inaugurato il progetto del nuovo polo scolastico di Pacentro, concepito all'interno di un percorso partecipativo che facesse emergere le esigenze reali della comunità e degli studenti, coniuga l'utilizzo di un modello didattico innovativo con un impianto architettonico ambizioso.

L'intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione della scuola elementare e media di Pacentro è stato finanziato con i fondi del Piano "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in sicurezza" per complessivi € 1.700.000,00.

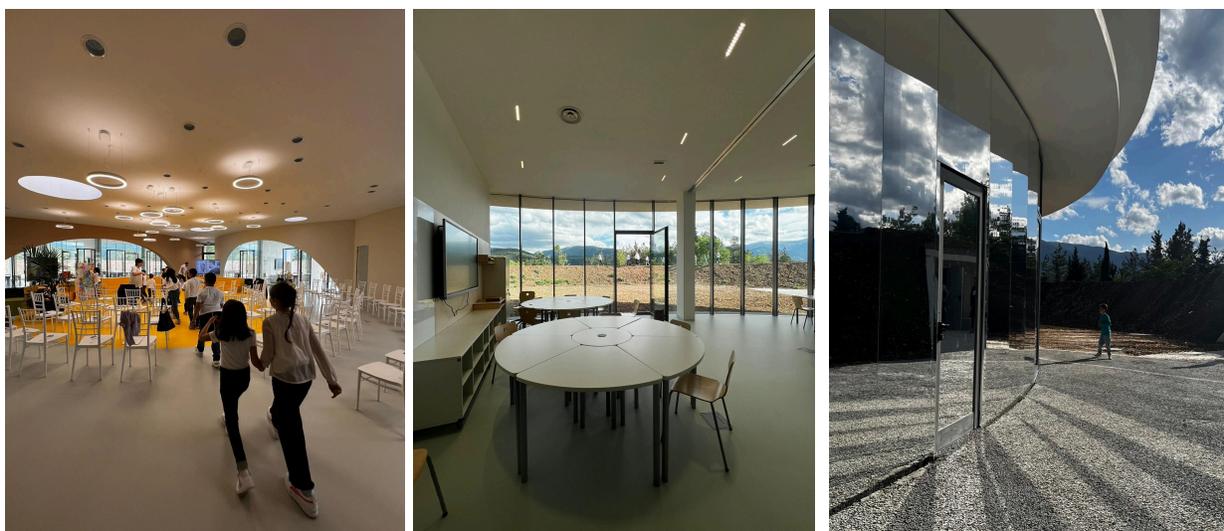

Pacentro (AQ), Scuola primaria e secondaria di primo grado "Mario Silvestri" - inaugurazione 31/05/2024

A conclusione del 2024 è stato riconsegnato anche il Liceo Classico "Ovidio" nella sua sede storica in piazza XX Settembre a Sulmona. L'edificio, costruito intorno al 1600 e situato all'interno del centro storico della città, oggetto di vincolo monumentale e di vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, è stato oggetto di un intervento di miglioramento sismico finanziato per oltre 4 mln €. I lavori erano partiti a settembre 2022.



Sulmona (AQ), Liceo classico "Ovidio" - inaugurazione del 21/12/2024

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per gli interventi sull'edilizia scolastica nel **periodo 2013-2024**:

EDILIZIA SCOLASTICA	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPEGNATE USRC	da	RISORSE TRASFERITE agli ENTI
Edilizia scolastica (esclusi interventi Provveditorato)	€ 204.965.130,61	€ 128.375.564,83		€ 111.800.011,04

7.1 La Pubblicazione: "Il futuro in sicurezza, la ricostruzione dell'edilizia scolastica danneggiata dal sisma dell'aprile 2009 nell'esperienza dell'USRC"

E' stata realizzata una pubblicazione sull'edilizia scolastica degli edifici finanziati dall'USRC dal 2013 ad oggi: nelle pagine del testo viene illustrato con schede progettuali degli interventi ultimati, suddivisi per tipologia, un percorso virtuoso che ha coinvolto diversi livelli lo Stato, che ha messo a disposizione le risorse, le istituzioni sul territorio, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e gli Enti Locali, e che ha consentito di progettare e realizzare opere che ricostruiscono quel necessario tessuto di fiducia tra le amministrazioni e le comunità, con il fine di promuovere una più matura consapevolezza della necessità

della prevenzione sismica in un territorio particolarmente vulnerabile ed esposto al rischio come quello abruzzese.

L'attuazione di un piano così complesso, per la dotazione finanziaria e la pluralità di soggetti coinvolti, costituisce un punto di riferimento per le politiche di ricostruzione e per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, che devono tragguardare alla messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, quale requisito essenziale per garantire alle future generazioni edifici sostenibili e sicuri dove apprendere e crescere.

Il libro, in prossima pubblicazione, è stato consegnato a tutte le Amministrazioni direttamente coinvolte.

8. TRASPARENZA



8.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

Per gli interventi localizzati nei Comuni del Cratere, sul sito istituzionale dell'USRC sono pubblicate, con aggiornamento settimanale, le informazioni relative allo stato dell'istruttoria delle richieste di contributo e degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) depositate presso l'ufficio, accessibili senza restrizioni da parte degli interessati al seguente link:

[Verifica lo stato della pratica](#)

8.2 WEB-GIS

Il portale di nuova generazione, **WEB GIS** (<https://datigis.usrc.it>), è un nuovo modo di mettere a disposizione del cittadino le informazioni sulla ricostruzione privata e pubblica, consentendo di muoversi su mappe ed aree geografiche. Oltre alla consultazione è disponibile una funzione di ricerca che consente di identificare geograficamente una richiesta di contributo identificata tramite il suo protocollo normalizzato.

8.3 MACERIE

Anche per questo ambito il nuovo portale delle macerie (<https://maceriesisma2009.it>), oltre a consentire alle società operanti nella ricostruzione di registrare i formulari relativi ai trasporti delle macerie, consente in una forma ottimizzata l'aggregazione e la consultazione aperta da parte del cittadino di tutti i dati aperti presenti nel portale. E' possibile consultare la sintesi delle macerie trasportate, la sintesi dei cantieri e delle aziende a lavoro ed infine la sintesi dei punti di conferimento.

8.4 CONTRATTI

L'USRC effettua l'acquisizione dei contratti relativi agli interventi di ricostruzione privata, localizzati nei Comuni del Cratere e fuori Cratere, da parte dei committenti e ne effettua la trasmissione ai comuni interessati, per gli idonei controlli (art. 67-quater, co.8, L. n. 134/2012; art. 11, co.1, L. n. 125/2015). La procedura, a far data dal gennaio 2019, avviene interamente on line.

Al 31 Dicembre 2024 risultano acquisiti contratti in numero di **16.487** relativi a 3.807 richieste di contributo e a 125 Comuni, per un importo complessivo di **€ 3.861.413.509,35**.

8.4 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

L'USRC ha approvato il **Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza** per il triennio **2024-2026 confluente nel P.I.A.O.**

Il Piano sposa un'interpretazione ampia del concetto di fenomeno corruttivo al fine di reprimere ed ancor prima prevenire ogni fenomeno di *maladministration*, idoneo anche solo potenzialmente a sviare il corretto esercizio del potere pubblico nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ufficio. Il PTPCT è accessibile in formato aperto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'USRC.

Le principali peculiarità del nuovo Piano Anticorruzione dell'Ufficio sono costituite da una maggiore compartecipazione dell'intera platea di lavoratori alla strategia anti corruttiva attraverso:

- La responsabilizzazione di ciascuna Area nell'attuazione, monitoraggio ed eventuale correzione delle misure programmate;
- La compartecipazione di ciascuna Area all'annuale formazione obbligatoria in materia, mediante assegnazione di argomenti specifici, elaborazione del materiale ed erogazione di una giornata di co-formazione conclusa con un dibattito su etica e legalità per i dipendenti pubblici e, in particolare, per i funzionari USRC.

9. GESTIONE APPALTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

In considerazione del rilevante incremento cui si è assistito negli ultimi anni in riferimento ai contratti pubblici stipulati dall'USRC, l'Ufficio si è determinato nel senso di dotarsi di una stabile organizzazione preposta alla gestione di tali procedure. Nello specifico, oltre alle necessarie dotazioni tecnologiche, materiali e di competenze da acquisire mediante specifici processi formativi, è in via di formalizzazione la costituzione di due differenti unità organizzative preposte alla gestione di appalti delegati da enti terzi e di appalti necessari per le esigenze dell'USRC, nonché la costituzione di due unità serventi delle prime e rispettivamente dedicate alla gestione delle numerose piattaforme in uso ed all'espletamento dell'attività amministrativa necessaria. Alle diverse unità organizzative saranno assegnati stabilmente funzionari dell'USRC.

APPALTI DI BENI E SERVIZI

Come conseguenza delle accresciute funzioni dell'USRC il settore adibito alla programmazione, attuazione ed esecuzione degli acquisti di beni e servizi ha visto notevolmente espandersi la propria attività.

Nell'ambito di un intervento sistematico volto ad implementare la **qualità amministrativa** e dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le proprie esigenze, l'USRC ha proseguito nell'ormai consolidata strategia d'azione in questo delicato settore, principalmente svolta sulle seguenti direttrici:

- Maggior cura della fase della **programmazione della spesa**: è in via di approvazione l'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. A complemento dell'obbligo normativo, l'Ufficio ha elaborato uno strumento di programmazione delle spese di qualsiasi tipologia stilato su un arco triennale come valido supporto per l'adozione delle scelte strategiche di allocazione delle risorse disponibili.
- Maggior **trasparenza e controllo** nelle varie fasi delle procedure di appalto, prevedendo sempre l'utilizzo di piattaforme elettroniche ed in particolare del MePA anche per affidamenti diretti di modico importo, salvo cause di estrema urgenza esplicitate nella determinazione a contrarre. Per i pochi acquisti operati al di fuori del mercato elettronico si è comunque operata una ricerca di mercato in linea con le indicazioni fornite nel tempo da ANAC;
- **Riduzione dei micro affidamenti** mediante stipula di convenzioni con operatori di diversi settori utili a scongiurare la reiterazione di affidamenti diretti;
- **Approvazione di atti di natura generale e/o regolamentare** utili a supportare ed indirizzare l'attività del personale addetto all'Ufficio competente alla gestione degli appalti. E' attualmente in via di emendamento il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi per una maggiore efficienza delle relative procedure.

Nel corso del 2024 l'USRC ha posto in essere **72 procedure d'appalto** di varia tipologia per fornitura di beni e servizi per un valore complessivo di circa **706 mila euro**. Congiuntamente con USRA, è stata inoltre

pubblicata una gara europea a procedura aperta per l'individuazione di un'Agenzia di somministrazione di lavoro a tempo determinato con cui sottoscrivere un Accordo Quadro del valore massimo di **5 MLN di euro**.

APPALTI DI LAVORI

In materia di appalti pubblici, dall'estate 2021, l'USRC può esercitare il ruolo di soggetto attuatore, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il continuo incremento dell'attività dell'ufficio nell'ambito degli appalti pubblici ha indotto l'USRC in occasione della recente approvazione della nuova macrostruttura avvenuta con determina n. 2002 del 23/12/2024, a definire una più efficiente organizzazione deputata esclusivamente alla gestione degli appalti e della consistente attività tecnico amministrativa ad essa correlata, anche mediante l'assegnazione di personale in via non più occasionale ma stabile ed esclusiva all'espletamento di tale attività sempre più rilevante.



L'U.S.R.C. in particolare ha accolto sino al 31/12/2024 richieste di delega per n. 21 appalti per un importo complessivo da Q.T.E. di oltre 30 milioni di euro di cui:

N. 4 interventi per il recupero e la valorizzazione di Cammini storici per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR. 42 Comuni coinvolti, di cui 31 rientranti nel Cratere sismico 2009, circa 400 km di tracciati, per un'azione volta non solo al recupero fisico dei tracciati ma anche allo sviluppo culturale e turistico;



N. 12 interventi di manutenzione, consolidamento e restauro di chiese danneggiate dagli eventi sismici e dislocate sul territorio abruzzese per un importo complessivo pari a circa 12 milioni di euro nell'ambito di accordi con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo e la Prefettura;

N. 5 interventi di Ricostruzione Pubblica a seguito del Sisma 2009 tra cui:

- La realizzazione di un polo scolastico nel Comune di Tornimparte per un importo di circa 3,2 milioni di euro;
- La fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza all'interno dei Comuni dell'Area Omogenea 8 e di Prata D'Ansidonia per un importo di circa 0,8 milioni di euro;
- L'implementazione del sistema di videosorveglianza dei 56 Comuni del Cratere per un importo di circa 2 milioni di euro;
- Il recupero e la valorizzazione dell'ex complesso conventuale di San Domenico nel Comune di Popoli per un importo di circa 6,4 milioni di euro;
- Un aggregato a Montereale per un importo di circa 3,5 milioni di euro.

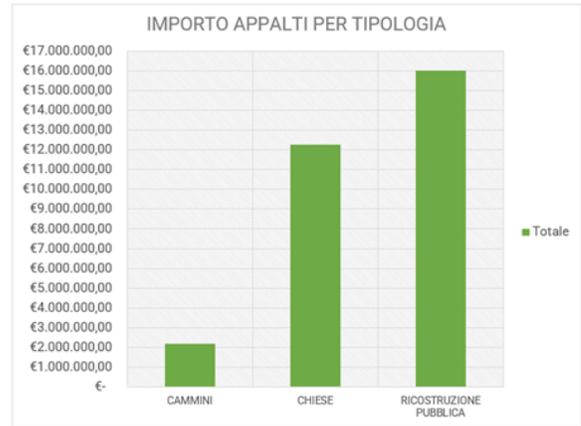
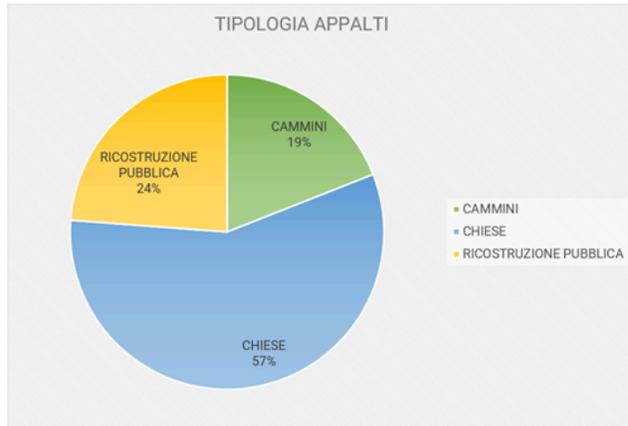


Di seguito si riportano i grafici degli appalti gestiti dall'USRC con evidenziati gli importi da Q.T.E., la tipologia d'appalto, i R.U.P. e lo stato d'avanzamento a dicembre 2024:

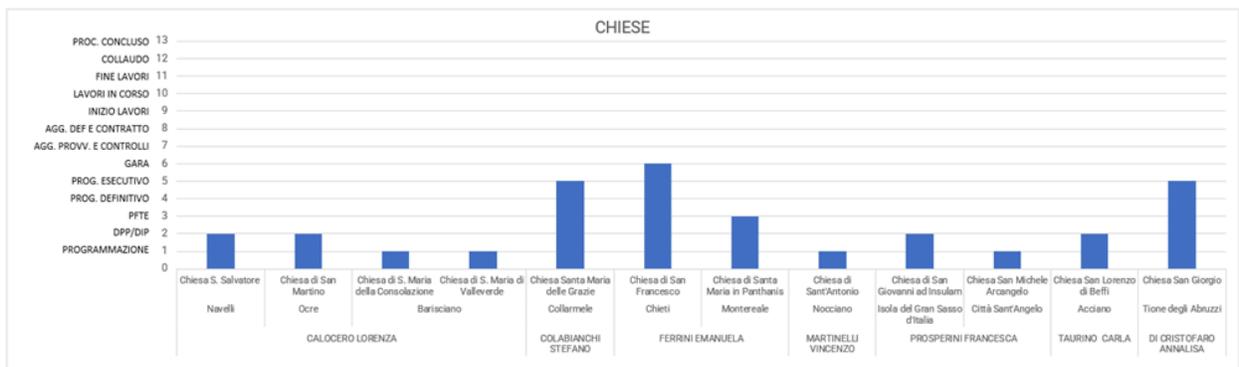
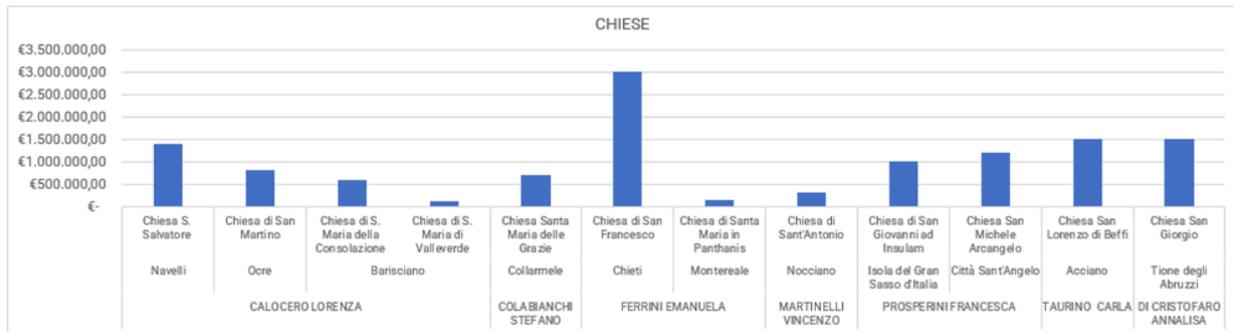


APPALTI CHIESE	STATO D'AVANZAMENTO A DICEMBRE 2024
CHIESA S. SALVATORE – NAVELLI RUP L. Calocero	In corso di completamento il PFTE.
CHIESA S. MARTINO – OCRE RUP L. Calocero	Affidata la progettazione.
CHIESA S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE – BARISCIANO RUP L. Calocero	Richiesta di accertamento al Segretariato di eventuali progetti esistenti.
CHIESA S. MARIA DI VALLEVERDE – BARISCIANO RUP L. Calocero	Richiesta di accertamento al Segretariato di eventuali progetti esistenti.
CHIESA S. M. DELLE GRAZIE – COLLARMELE	Predisposti i documenti di gara per l'affidamento dei lavori.

RUP S. Colabianchi	
CHIESA S. FRANCESCO – CHETI RUP E. Ferrini	In corso la gara per l'affidamento lavori.
CHIESA S. M. IN PANTHANIS – MONTEREALE RUP E. Ferrini	Redatto il PFTE. Concluso quanto di competenza, in attesa di nuovi finanziamenti.
CHIESA S. ANTONIO – NOCCIANO RUP V. Martinelli	In attesa della donazione del progetto da parte della Curia.
CHIESA DI S. GIOVANNI– ISOLA GRAN SASSO RUP F. Prosperini	In attesa dell'approvazione del piano di indagini da parte della Soprintendenza.
CHIESA S. M. ARCANGELO – CITTA' S. ANGELO RUP F. Prosperini	In attesa della donazione del progetto da parte della Curia.
CHIESA S. LORENZO – ACCIANO RUP C. Taurino	Predisposti i documenti di gara per l'affidamento della progettazione.
CHIESA S. GIORGIO – TIONE DEGLI ABRUZZI RUP A. Di Cristofaro	Trasmesso il progetto esecutivo.

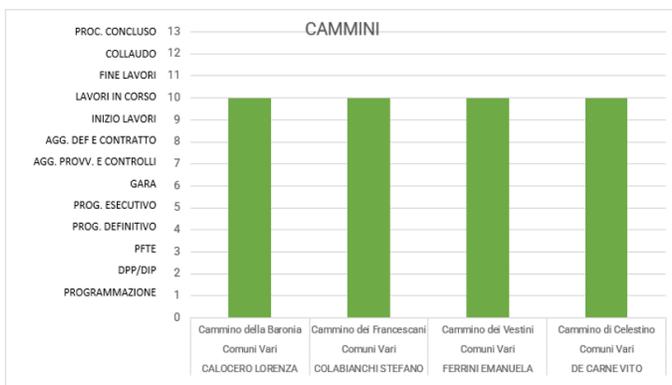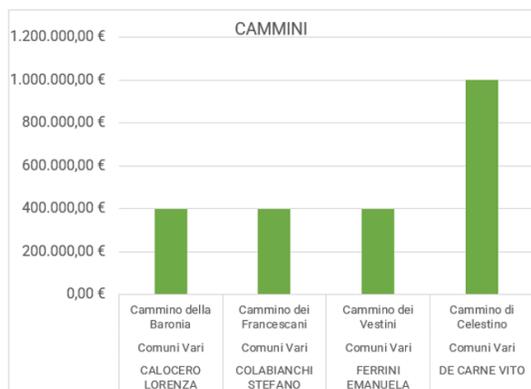

<u>APPALTI CAMMINI</u>	<u>STATO D'AVANZAMENTO A DICEMBRE 2024</u>
CAMMINO BARONIA RUP L. Calocero	Lavori in corso: marcatura del cammino.
CAMMINO FRANCESCANI RUP S. Colabianchi	Lavori in corso: marcatura del cammino completata, in corso la posa in opera della segnaletica direzionale.
CAMMINO TRA I VESTINI RUP E. Ferrini	Lavori in corso: marcatura del cammino completata, in corso la posa in opera della segnaletica direzionale.
CAMMINO DI CELESTINO RUP V. De Carne	Lavori in corso: marcatura del cammino e segnaletica direzionale pressoché completata.

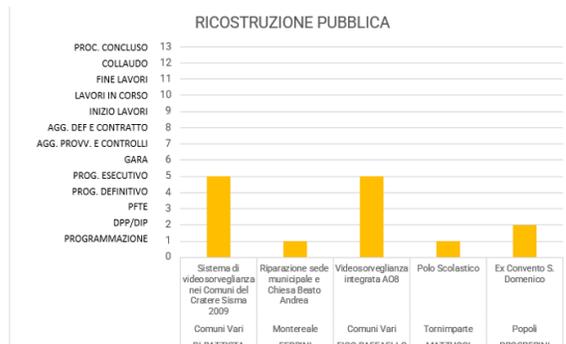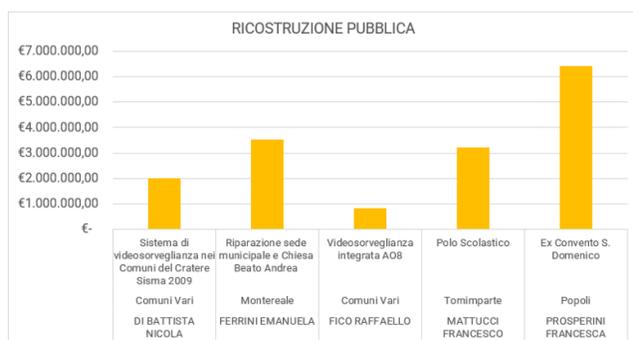

APPALTI RICOSTRUZIONE PUBBLICA	STATO D'AVANZAMENTO A DICEMBRE 2024
VIDEOSORVEGLIANZA 56 COMUNI DEL CRATERE RUP N. Di Battista	Lotto 1: Conferenza di servizi chiusa. Lotto 2: Affidati gli incarichi esterni per relazione archeologica e paesaggistica ad integrazione del progetto per indizione conferenza di servizi. Lotto 3: Conclusi i sopralluoghi propedeutici alla redazione del progetto di fornitura.
VIDEOSORVEGLIANZA AREA OMOGENEA 8 RUP R. Fico	Affidati gli incarichi esterni per relazione archeologica e paesaggistica ad integrazione del progetto per indizione conferenza di servizi.
POLO SCOLASTICO - TORNIMPARTE RUP F. Mattucci	Predisposto il DIP.
Ex CONVENTO S. DOMENICO – POPOLI RUP F. Prosperini	Predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della progettazione.
MUNICIPIO E CHIESA BEATO ANDREA - MONTEREALE RUP E. Ferrini	In corso la redazione del DIP.

Sempre mediante apposite deleghe sottoscritte ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, l'U.S.R.C. esercita anche il ruolo di soggetto delegato per l'espletamento di singole procedure di gara, mettendo a disposizione del territorio la propria consolidata esperienza in questo specifico ambito di attività, oltreché le proprie dotazioni strumentali e tecniche che hanno consentito in poco più di due anni di portare a conclusione n. 16 procedure di gara di valore complessivo di circa 6,5 milioni di euro.

Nel corso del 2024 l'ufficio ha sottoscritto convenzioni per la gestione di n. 4 procedure di gara come di seguito indicate:

- Gagliano Aterno: n. 3 gare per un importo lavori complessivo di circa 1,1 milioni di euro (1 gara conclusa e 2 in corso);
- Rocca di Botte: n. 1 gara per un importo lavori complessivo di circa 0,7 milioni di euro (in corso).

Competenze maturate negli anni, propensione alla gestione di processi complessi e disponibilità di adeguate strutture interne per l'esecuzione, il controllo e la rendicontazione delle varie fasi di appalti



complessi, hanno consentito all'Ufficio di meritare in breve tempo la fiducia e l'attenzione da parte delle amministrazioni del territorio abruzzese. I numeri maturati in questo specifico e delicato ambito consentono di guardare con ottimismo al futuro prosieguo dell'attività, attestato peraltro, anche dalle continue e numerose richieste di delega all' USRC di ulteriori interventi anche in ambiti innovativi e sfidanti sia per tipologie di intervento estese anche agli appalti di servizi, sia per soggetti deleganti.

Per il report completo relativo agli appalti USRC, si rimanda al seguente link del sito internet USRC: <https://www.usrc.it/home/attivita-e-brochure-usrc>

10. SVILUPPO DEL TERRITORIO

10.1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RESTART

La L. 134/2012 individua tra le finalità della gestione ordinaria della ricostruzione quella di assicurare l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (art.67-ter, co.1) ed assegna all'USRC la competenza anche in ordine allo sviluppo dei territori (art.67-ter, co.2).

Allo scopo, l'art. 11, co. 12, del D.L. n. 78/2015, ha destinato una quota (fino al 4%) delle risorse finanziarie stanziare per la ricostruzione al **Programma di sviluppo RESTART**, predisposto dalla SdM – Struttura di Missione (ex DPCM 1 giugno 2014, confermata con modificazioni dal DPCM 4 ottobre 2019) ed approvato con **Delibera CIPESS n. 49/2016**, per interventi da attuarsi nel territorio del Cratere sismico abruzzese.

Con successive delibere CIPESS n. 70/2017, 115/2017, 25/2018, 56/2018, 20/2019, 54/2019, 16/2020, 17/2020, 70/2020, 43/2021, 69/2021, 89/2021, 19/2022, 51/2022, 20/2023 e 42/2023, sono stati approvati ulteriori interventi del Programma di sviluppo RESTART ed assegnate ulteriori risorse agli interventi del programma.

La delibera CIPESS n.89/2021 ha rimodulato il piano finanziario del Programma di sviluppo RESTART, riducendo la dotazione finanziaria complessiva dai precedenti 219,7 Mln € approvati con Delibera CIPESS n.49/2016 agli attuali **217,06 Mln €**. Tali risorse sono aggiuntive a quelle già assegnate allo sviluppo del Cratere sismico con **Delibera CIPESS n. 135/2012**, pari a **100 Mln €**. Un'ulteriore rimodulazione è stata approvata dalla Delibera CIPESS n.42/2023.

Nella Tabella che segue è riportato lo stato di avanzamento del Programma per ciascuna delle Priorità o Ambiti tematici, con riferimento alle Delibere CIPESS sopra richiamate:

RIEPILOGO PROGRAMMA SVILUPPO (DELIBERA CIPE N. 49/2016 + DELIBERA CIPE N. 135/2012, E SUCCESSIVE RIMODULAZIONI)						
PRIORITA' - AMBITI TEMATICI RESTART	RIPARTO FINANZIARIO / DOTAZIONE PRIORITA'	INCIDENZA SUL TOTALE PROGRAMMA	TOTALE RISORSE APPROVATE	% RISORSE APPROVATE SU DOTAZIONE PRIORITA'	RISORSE RESIDUE	% RISORSE RESIDUE SU DOTAZIONE PRIORITA'
	mIn€	%	mIn€	%	mIn€	%
A - Sistema imprenditoriale e produttivo	110,1	35%	95,7	87%	14,4	13%
B - Turismo e ambiente	98,6	31%	75,8	77%	22,9	23%
C - Cultura	22,8	7%	22,8	100%	0,0	0%
D - Alta formazione	15,5	5%	15,5	100%	0,0	0%
E - Ricerca e innovazione tecnologica	58,8	19%	58,8	100%	0,0	0%
F - Agenda digitale	6,8	2%	6,8	100%	0,0	0%
G- Governance, monitoraggio e valutazione del programma di Sviluppo	4,4	1%	4,4	100%	0,0	0%
TOTALE	317,0	100%	279,8	88%	37,3	12%

Il prospetto tiene conto della deliberazione del Comitato di indirizzo del 25 settembre 2024 (rimodulazione risorse ed approvazione nuovi interventi)



Nell'ambito della procedura di approvazione degli interventi del programma RESTART, l'USRC supporta la SdM - Struttura di Missione Sisma Abruzzo 2009 nella definizione delle proposte d'intervento di competenza dei 56 Comuni del Cratere (ad esclusione di L'Aquila) e fa parte del **Comitato di Indirizzo**, nella figura del Titolare. Ai sensi della normativa sopra richiamata, l'USRC in fase di attuazione del programma è inoltre competente

al **trasferimento delle risorse destinate agli interventi di RESTART a titolarità dei Comuni del Cratere sismico**, ad esclusione di L'Aquila, previa istruttoria positiva da parte della SdM e trasferimento delle relative risorse da parte del MEF – Dipartimento del Tesoro.

A far data dall'anno 2019, l'USRC sta affiancando la Struttura di Missione ed i 56 Comuni del Cratere nella predisposizione, da parte delle Aree Omogenee (AO) del Cratere, di **8 PIT – Progetti Integrati per il Turismo**, a valere sulle risorse disponibili per la **Priorità B – Turismo e Ambiente**.

I PIT hanno l'obiettivo di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico del territorio del Cratere, a completamento e valorizzazione delle azioni di ricostruzione dei borghi, in linea con la vocazione turistica prevalente dell'Area omogenea di appartenenza, mediante interventi fisici affiancati da interventi immateriali di marketing territoriale, volti a conseguire la riconoscibilità dell'offerta territoriale. I **PIT - Progetti integrati per il Turismo** sono diretti a potenziare:

1. **Turismo storico culturale e religioso;**
2. **Turismo naturalistico;**
3. **Turismo dei borghi, delle tradizioni popolari ed enogastronomico.**



Con delibera CIPESS n. 16/2020 è stato approvato il primo PIT, "**Terre della Baronìa**", proposto da 5 Comuni del Cratere appartenenti prevalentemente all'**AO n. 4**, per un importo pari a **€ 5.353.716,39**. A partire dal 2021 l'USRC ha supportato la Struttura di Missione nell'istruttoria tecnica degli ulteriori 7 PIT delle restanti Aree Omogenee, propedeutica all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo e del CIPESS. In esito a tale attività, sono stati portati a definizione ed approvati a valere sulla Priorità B del Programma di Sviluppo RESTART:

- il PIT "**Terre della Pescara**", proposto da 7 Comuni dell'**AO n.5**, per un importo di **7.647.733,78 €**, approvato con Delibera CIPESS n.69/2021;
- il PIT "**Altopiano d'Abruzzo: un museo all'aperto**", proposto dai 5 Comuni dell'**AO n.6**, per un importo di **9.474.771,15 €**, approvato con Delibera CIPESS n.19/2022.

In relazione alle proposte progettuali dei **PIT delle AO n. 2, 3, 7, 8 e 9** a partire dal 2023, a seguito della formalizzazione da parte della Struttura di Missione delle osservazioni emerse dall'istruttoria di competenza, l'USRC ha avviato un'azione di supporto delle Aree omogenee per l'implementazione delle schede progetto ai fini del raggiungimento della completezza formale richiesta dalla SdM per il parere di ammissibilità tecnico-finanziaria propedeutico all'approvazione del Comitato di Indirizzo.

In esito a tale azione di supporto, i **Comuni delle AO n.2, n.3, e n.9** (a fine 2023) e, a seguire, quelli dell'**AO n.7** (nel luglio 2024), hanno perfezionato la propria proposta di candidatura ed **hanno sottoposto alla Struttura di Missione Sisma Abruzzo 2009 le schede progetto dei rispettivi PIT, per l'istruttoria di ammissibilità a finanziamento a valere sulle risorse RESTART**. I Comuni dell'AO n.8 stanno attualmente

lavorando al completamento dell'integrazione del relativo PIT, a seguito dei chiarimenti richiesti dalla SdM.

Per i 5 PIT non ancora finanziati, ad inizio 2024, si sono svolte le interlocuzioni tecniche con la SdM attinenti alla congruità dei QTE - Quadri Tecnico-Economici degli interventi, in esito alle quali **le AO n.2 e n.9 hanno rimesso alla SdM un ulteriore aggiornamento del PIT in recepimento dell'adeguamento dei QTE ai criteri di verifica indicati da SdM**, sulla base di un modello unificato di verifica dei costi reso disponibile dall'USRC, strutturato sui criteri di congruità stabiliti da SdM.

A tale aggiornamento ha fatto seguito, per l'**AO n.2**, una formale richiesta di integrazioni da parte della SdM alla quale i Comuni hanno dato riscontro, con il sostegno dell'USRC, inviando le integrazioni al PIT 2 in data 24/9/2024.

In recepimento delle ulteriori osservazioni di merito formulate dalla SdM nell'incontro tenutosi con le AO in data 17 ottobre 2024 relative ai PIT n.2, 3 e 9, attinenti alla compiuta definizione degli interventi nei vari profili istruttori, l'USRC ha supportato i Comuni capofila nel corretto inquadramento degli elementi integrativi da fornire, rendendo possibile la **definizione delle integrazioni per la successiva trasmissione alla SdM delle proposte progettuali aggiornate, avvenuta per i PIT n.2 e n.9** nel periodo novembre-dicembre 2024.

Il **fabbisogno finanziario** complessivamente espresso dai PIT delle 8 Aree omogenee ammonta a circa **70,23 Mln€**, come da dettaglio che segue:

PIT – Progetti Integrato per il Turismo	PIT IN CORSO Fabbisogno espresso		PIT APPROVATI Importo approvato	
PIT AO2 - "Il Ponte tra i Parchi"	10,02	Mln €		
PIT AO3 - "Gran Sasso outdoor e benessere"	8,28	Mln €		
PIT AO4 - "Terre della Baronìa"			5,35	Mln €
PIT AO5 - "Le Terre della Pescara"			7,65	Mln €
PIT AO6 - "Altopiano d'Abruzzo: un museo all'aperto"			9,50	Mln €
PIT AO7 - "Il Cammino delle genti"	9,90	Mln €		
PIT AO8 - "La rinascita"	14,64	Mln €		
PIT AO9 - "Altopiano delle Rocche. Terre montane tra sport e natura"	4,89	Mln €		
TOTALE	47,73	Mln €	22,50	Mln €
FABBISOGNO FINANZIARIO TOTALE:	70,23		Mln €	

Il lavoro dell'USRC condotto nell'anno 2024, in costante affiancamento ai Comuni, ha reso possibile la **formalizzazione alla SdM dei Progetti Integrati per il Turismo di 4 Aree Omogenee**, per un fabbisogno finanziario complessivo espresso pari a circa **33 Mln€**.

Relativamente all'intervento *"Potenziamento del curriculum in ambito linguistico e scientifico"*, a titolarità del Comune di Scoppito, finanziato a valere sulla Priorità D con Delibera CIPESS n.70/2017 per un importo di 642.000,00 €, l'USRC ha supportato il Comune di Scoppito, l'Istituto Comprensivo Statale Comenio e

l'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo per la formulazione della proposta di rimodulazione del progetto per le annualità 2024-2028, presentata alla SdM in data 18/9/2024 per l'istruttoria di competenza e la successiva sottoposizione al Comitato di indirizzo.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Restart, per quanto di competenza, **ad oggi**, l'USRC ha effettuato il **trasferimento di risorse** a favore delle Amministrazioni titolari degli interventi nei 56 Comuni minori del Cratere per un importo complessivo pari a **€ 9.464.602,21**.

Il sito internet istituzionale dell'USRC rende disponibile l'informativa in ordine allo stato di attuazione del Programma RESTART, al link che segue: [Programma di sviluppo RESTART](#)

10.2 PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR

A far data dal settembre 2021, l'USRC sta lavorando congiuntamente alla Struttura di Missione, al Commissario straordinario per il sisma 2016 ed ai Comuni del Cratere al **Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016**, finanziato per un importo pari a **1,780 Mld€** a valere sulle risorse del **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR** di cui al D.L. n. 59/2021.

La Cabina di coordinamento integrata, istituita ai sensi dell'art.14-bis del D.L. n. 77/2021, presieduta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016, della quale fanno parte il Capo Dipartimento Casa Italia, il Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, i Presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed i rappresentanti dei Comuni del Cratere 2009 e 2016, nella riunione del 30 settembre 2021 ha approvato il **Programma Unitario di Intervento**, articolato nelle seguenti Macromisure:

- **Macromisura A**, "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi", per la quale sono stanziati **1,08 Mld€**;
- **Macromisura B**, "Rilancio economico e sociale", per la quale sono stanziati **0,70 Mld€**.

Il Programma Unitario di Intervento e le Schede di dettaglio degli interventi finanziabili afferenti alle Macromisure A e B sono pubblicati sul sito del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, ai seguenti link: [Recovery Fund Aree Sisma. ecco tutti gli interventi finanziabili -](#)

Nella definizione del Programma, l'USRC ha effettuato il raccordo tecnico-amministrativo tra il territorio del Cratere ed i Soggetti attuatori del Programma, individuati nel Commissario Straordinario per il sisma 2016 e nella Struttura di missione sisma 2009.

MACROMISURA A

Con riferimento al territorio del Cratere sismico 2009, nella prima fase di attività svolta da ottobre a dicembre 2021, l'USRC ha coordinato la ricognizione degli interventi approvati con Ordinanza commissariale nel dicembre 2021 dalla Cabina di coordinamento integrata (Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 n. 6, 7, 8, 9 del 30 dicembre 2021, n.15 del 31 dicembre 2021), con particolare riguardo alle seguenti linee di intervento della **Misura A** del Programma Unitario di Intervento:

- **sub-misura A.2, obiettivo 1** – *"Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici pubblici"*;
- **sub-misura A.3, obiettivo 1** - *"Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"*;

- **sub-misura A.3, obiettivo 3.A** – *“Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici”*;
- **sub-misura A.3, obiettivo 3.C** – *“Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”*;
- **sub-misura A.4, obiettivo 5** - *“Investimenti sulla rete stradale comunale”*.

Le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 di ammissione a finanziamento degli interventi del Programma a valere sulle risorse del Fondo complementare al PNRR sono pubblicate al seguente link: [Ordinanze attuative Fondo PNC Area Sisma](#).

L’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 n. 17 del 14 aprile 2022, come modificata dalla n.32 del 30 giugno 2022 e dalla n.104 del 11 settembre 2024, ha disciplinato le procedure per il trasferimento delle risorse alle Amministrazioni responsabili degli interventi finanziati a valere sulla Misura A ed ha individuato gli adempimenti in capo agli Uffici Speciali. Il decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 n.26/PNC del 9 novembre 2022 ha individuato gli interventi ricadenti nei Comuni del doppio Cratere per i quali l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo è competente al trasferimento delle risorse.

Nell’ambito della Misura A del Programma Unitario di Intervento, l’USRC cura il monitoraggio attuativo degli interventi, il trasferimento delle risorse ed il raccordo tra i Comuni ed i Soggetti attuatori del Programma, individuati nella Struttura di Missione Sisma 2009 e nel Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016. Con Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 n. 15 del 31/12/2021 e ss.mm.ii., sono stati finanziati 274 interventi a responsabilità dei 56 Comuni del Cratere 2009 e dell’USRC per complessivi 123,53 Mln€, dei quali l’USRC ha effettuato il monitoraggio procedurale al fine della certificazione delle milestone previste dal DM MEF 15/7/2021. Con nota congiunta del Titolare dell’USRC e del Direttore dell’USR Abruzzo 2016 del 16/12/2022, in adeguamento al decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.26/PNC del 9/11/2022 (attinente all’erogazione delle risorse PNC a favore dei Comuni del “doppio cratere”), è stata rimodulata la competenza tra l’USRC 2009 e l’USR Abruzzo 2016 anche relativamente al monitoraggio procedurale degli interventi, mentre con Decreto PNC N. 3 del 15 gennaio 2024 l’USRC è stato incaricato del trasferimento delle risorse per ulteriori due interventi a responsabilità di ANAS S.p.A., portando a **238 gli interventi** nel Cratere sisma 2009 di competenza dell’USRC e a **58 gli Enti responsabili degli interventi** a gestione USRC. A seguito della parziale riallocazione delle risorse della Macro-Misura A disposta con Ordinanze n.86 del 29/12/2023 e n. 100 del 28/6/2024, gli interventi di competenza dell’USRC ammontano a **complessivi 119,01 Mln€**, aumentati a **131,51 Mln€** con l’assegnazione delle risorse aggiuntive per far fronte all’**adeguamento prezzi a seguito dell’aumento dei costi delle materie prime** a valere sul FOI - Fondo per l’avvio di opere indifferibili ai sensi dell’art. 26, co. 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (assegnazione definitiva approvata con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 2/3/2023 n. 52; rinunce al FOI approvate con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18/7/2024 n. 197). Gli interventi afferiscono alle seguenti Linee di intervento:

In ottemperanza alle **milestone** previste dal cronoprogramma di cui all’Allegato n.1 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, per i suddetti interventi le Amministrazioni Responsabili degli interventi hanno posto in essere gli adempimenti necessari all’aggiudicazione della gara di appalto e all’avvio delle prestazioni entro il 31/12/2022; l’Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 n.41 del 31/12/2022 ha stabilito come termine definitivo per i suddetti adempimenti il 31/3/2023. Nel corso del 2023, gli Enti responsabili degli interventi hanno avviato


l'attuazione dell'appalto lavori o dell'appalto integrato, con l'obiettivo di conseguire il 25% dei SAL entro il 31/12/2023. L'Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 n.84 del 28/12/2023 ha stabilito il 31/3/2024 come termine definitivo per i target fissati al IV trimestre 2023. L'Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 n.106 del 23/12/2024, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024 e nell'esercizio dei poteri di deroga commissariali stabiliti dalla normativa vigente, ha rimodulato il cronoprogramma previsto dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, a decorrere dal Quarto trimestre 2024 incluso, con il solo termine del quarto trimestre 2026, entro il quale, per tutti gli interventi della macro-misura A, occorre conseguire la conclusione dei lavori-collauda.

LINEA DI INTERVENTO	N. INTERVENTI APPROVATI	IMPORTO APPROVATO CON (ORDINANZA N.15/2021)	IMPORTO RISORSE AGGIUNTIVE PER ADEGUAMENTO PREZZI (DECRETO MEF 52/2023)
Sub-misura A.2, obiettivo 1 <i>"Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici pubblici"</i>	55	22.502.557,60€	23.748.400,97€
Sub-misura A.3, obiettivo 1 <i>"Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"</i>	66	37.976.421,71€	40.746.158,62€
Sub-misura A.3, obiettivo 3.A <i>"Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici"</i>	4	2.200.000,00€	2.200.000,00€
Sub-misura A.3, obiettivo 3.C <i>"Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita"</i>	55	22.671.354,41€	24.618.714,74€
Sub-misura A.4, obiettivo 4 <i>"Investimenti sulla rete stradale statale"</i> (ANAS)	2	18.614.824,27€	24.000.000,00€

Sub-misura A.4, obiettivo 5 "Investimenti sulla rete stradale comunale"	56	15.048.013,37€	16.197.795,79€
TOTALE	238	119.013.171,36€	131.511.070,12€


L'USRC ha provveduto alla trasmissione ai Soggetti attuatori dell'**avanzamento procedurale degli interventi al 31 gennaio 2024 e al 31 marzo 2024** (ai sensi dell'Ordinanza commissariale n.84 del 28/12/2023). Inoltre, come da richiesta del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 e della Struttura di Missione post sisma 2009 di cui alla nota prot. CGRTS-0011547-P-25/03/2024, l'USRC ha rimesso ai Soggetti attuatori **n.5 Report bimestrali dell'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi**, nel corso del periodo aprile-dicembre 2024.

Per i 238 interventi finanziati, dal monitoraggio al 30 novembre 2024 risulta un **avanzamento medio delle erogazioni** delle risorse effettuate dall' USRC pari al **64%**, mentre l'**avanzamento procedurale medio** degli interventi è di poco inferiore al **70% dei lavori**.

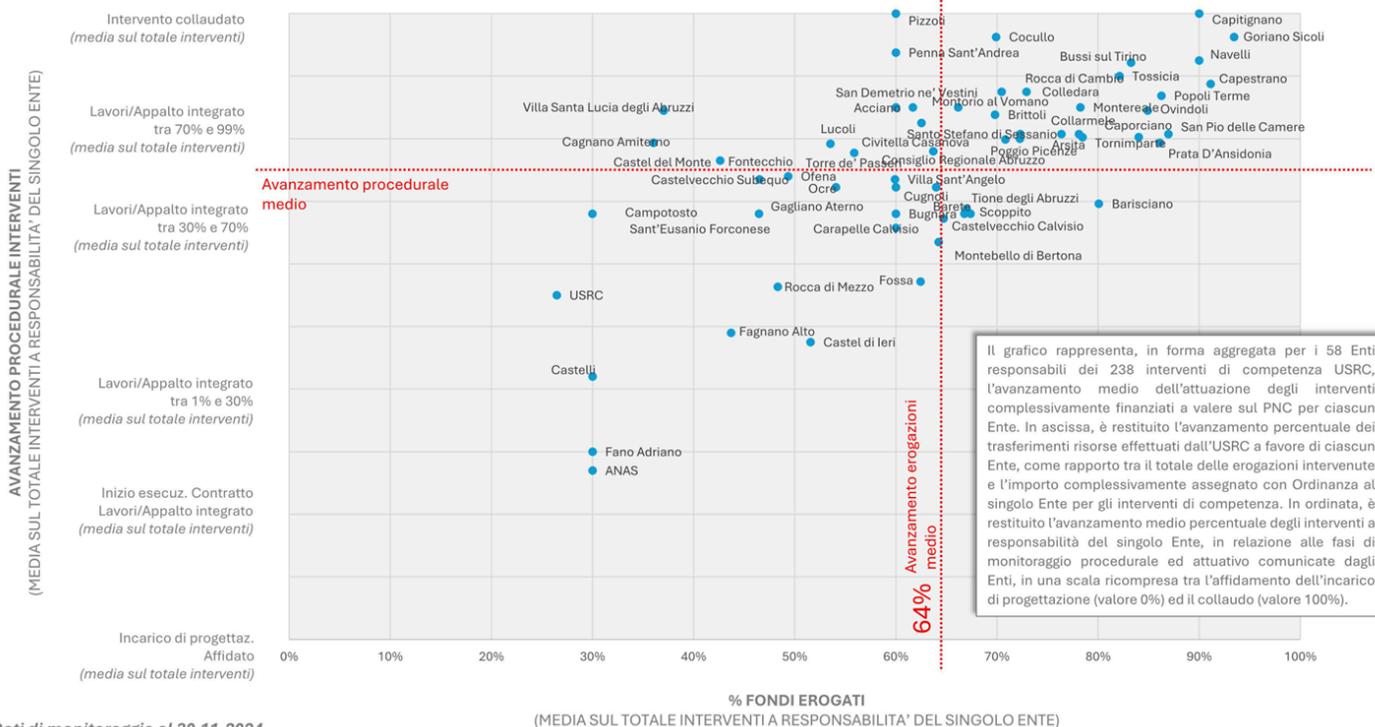

Gli interventi della **Macromisura A** intendono accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale attraverso l'innalzamento della sicurezza degli edifici, delle comunità e del territorio, e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Le risorse finanziarie gestite da USRC, per complessivi **131,51 Mil€**, sono destinate per il **19%** ad interventi su impianti sportivi, ricreativi e di risalita (linea di intervento **A3.3c**), per

il **18%** ad interventi di rifunzionalizzazione sismica e/o energetica di edifici pubblici (linea di intervento **A2.1**), per il **12%** ad investimenti per l'adeguamento della rete stradale comunale, finalizzati alla realizzazione, adeguamento, riqualificazione o messa in sicurezza della viabilità di proprietà comunale, per il **18%** ad investimenti per l'adeguamento della rete stradale statale a titolarità di ANAS. Il **2%** delle risorse è destinato all'implementazione dei 4 interventi sui **Cammini culturali, tematici e storici** (linea di intervento **A3.3a**), che interessano il territorio di 34 Comuni del Cratere, attraversando il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, per i quali l'USRC è Responsabile dell'intervento (descritti in dettaglio nella sezione 12. Cammini). La quota prevalente delle risorse, pari al **31%** del totale finanziato, è destinata ad interventi di **rigenerazione urbana dei borghi** (linea di intervento **A3.1**), da progettare e realizzare nell'ambito di un programma unitario comprensivo anche degli interventi finanziati a valere sulle risorse della ricostruzione. Tipologicamente, gli interventi di rigenerazione urbana sono orientati per il 71% alla riqualificazione dello spazio pubblico urbano, per il 28% all'implementazione di infrastrutture verdi, sportive, di mobilità lenta e pedonalità e per una residuale quota dell'1% all'implementazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. La dotazione della Linea di intervento A3.1 - *"Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"*, su iniziativa dei Soggetti attuatori del Programma, è stata incrementata con ulteriori risorse a valere sui fondi della ricostruzione 2009 e 2016, per assicurare agli interventi la dimensione finanziaria ottimale per conseguire l'obiettivo di miglioramento della qualità dei luoghi. Per i Comuni del Cratere 2009, gli interventi di rigenerazione urbana già finanziati a valere sulle risorse del PNC saranno pertanto sinergicamente integrati, nell'ambito di un Programma unitario di Rigenerazione urbana, con interventi da finanziare a valere su ulteriori risorse per la ricostruzione 2009.

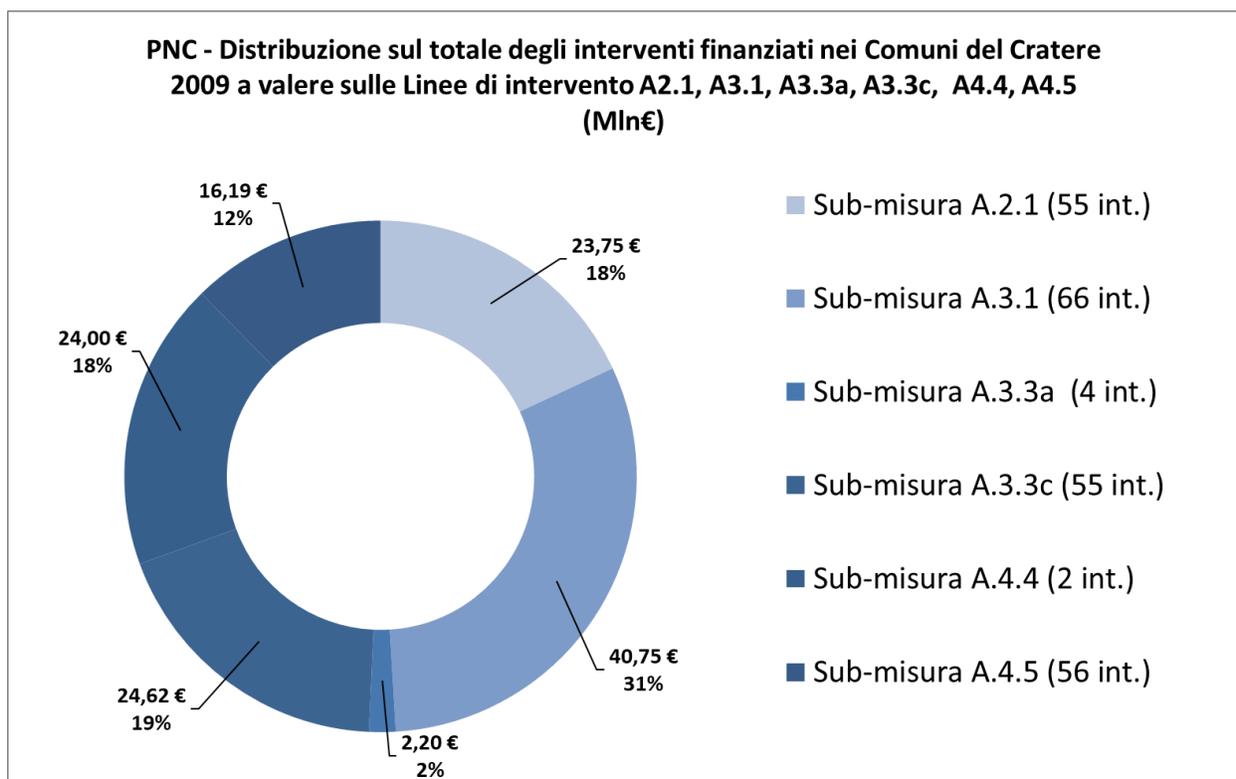

Nel 2024 l'USRC, d'intesa con l'USRA, ha adottato una **modulistica unificata** per la formulazione, da parte degli Enti responsabili degli interventi, dell'**istanza per l'utilizzo delle economie rinvenibili nei QTE degli interventi afferenti alle linee di intervento A3.1 e A4.5, ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 104/PNC del 11/9/2024**. Per la medesima tipologia di istanze, con l'USR Abruzzo 2016 è stata adottata una procedura unificata per la gestione degli interventi PNC a responsabilità dei Comuni del doppio Cratere.

Al **31 dicembre 2024** l'USRC ha trasferito a favore degli Enti responsabili dei 238 interventi risorse per un importo complessivo pari a **71.163.799,25 €**, a fronte di un valore di 39.871.004,11 € a fine anno 2023. L'avanzamento finanziario del trasferimento delle risorse PNC dall'USRC agli Enti responsabili dei **238 interventi**, è il seguente:

- Per n. 40 interventi è stata trasferita l'anticipazione (30%), per un importo complessivo trasferito pari a 10.599.553,96 €;
- Per n. 104 interventi è stato trasferito anche il primo acconto successivo all'anticipazione (ulteriore 30%), per un importo complessivo trasferito pari a 27.749.260,64 €;
- Per n. 81 interventi è stato trasferito anche il secondo acconto successivo all'anticipazione (ulteriore 30%), per un importo complessivo trasferito pari a 29.951.571,00 €;
- Per n. 12 interventi è stato trasferito anche il saldo (10% finale), per un importo complessivo trasferito pari a 2.863.413,65 €;
- Per n. 1 intervento non è intervenuto alcun trasferimento risorse.

Le informazioni e gli aggiornamenti relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR sono inoltre disponibili anche nella sezione "Sviluppo del territorio" del sito istituzionale dell'USRC, nelle pagine dedicate, ai seguenti link:

[Misure per il Rilancio e lo Sviluppo Interventi Approvati - Misura A](#)

MACROMISURA B

Gli interventi della **Macromisura B** sono destinati al rilancio economico e sociale del territorio. Intendono promuovere e sostenere investimenti in grado di far emergere e rafforzare le potenzialità economiche del territorio, e di valorizzare al tempo stesso le specificità economiche locali e le diverse forme di innovazione, attraverso interventi dedicati, differenziati per obiettivi, beneficiari, procedure di accesso, regimi di aiuto sottostanti, attività e spese ammissibili, forma e intensità delle agevolazioni.

Il pacchetto di investimenti della Macromisura B introduce misure a sostegno dell'economia dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016 e mira a favorire lo sviluppo, la crescita occupazionale, l'inclusione sociale, anche attraverso il terzo settore, il turismo, la cultura, l'economia circolare, il riuso delle macerie, la filiera del legno ed agroalimentare e le comunità energetiche nei due crateri sismici 2009 e 2016. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016.

Nel novembre 2022 si sono chiusi i bandi del programma NextAppennino destinati alle imprese dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016. Nei due Crateri sismici, a fronte di 615 mln€ resi disponibili sotto forma di agevolazioni sui nuovi investimenti, sono stati presentati 2.541 progetti di investimento, per un valore complessivo di 2,3 Mld€, con la richiesta di 1,49 Mld€ di contributi, relativi ai

seguenti bandi (fonte: Commissario ricostruzione sisma 2016, *Rapporto PNC Esito Bandi*, Novembre 2022, [NextAppennino: chiusi i bandi per le imprese, presentati 2.541 progetti per 2,3 miliardi](#)):

- **B.1.1** "Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria" (dotazione finanziaria: 80 mln€);
- **B.1.2** "Interventi per progettualità di dimensione intermedia"/ **B.3.3** "Ciclo delle macerie" (dotazione finanziaria: 110 mln€);
- **B.1.3a** "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori"(dotazione finanziaria: 100 mln€);
- **B.1.3b** "Interventi per l'innovazione diffusa"(dotazione finanziaria: 58 mln€);
- **B.1.3c** "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" (dotazione finanziaria: 40 mln€);
- **B.2.1** "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore" (dotazione finanziaria: 60 mln€);
- **B.2.2** "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" (dotazione finanziaria: 80 mln€);
- **B.2.3** "Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità" (dotazione finanziaria: 40 mln€);
- **B.3.2** "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica" (dotazione finanziaria: 47 mln€).

A far data dall'aprile 2023 sono state pubblicate le prime graduatorie dedicate alle misure B del Piano nazionale Complementare aree sisma 2009 -2016 e le relative Ordinanze. Nel mese di maggio 2023, sono state approvate le graduatorie relative agli incentivi B2.1, con 33 progetti, per un valore di 15 milioni di euro, e B2.3 con 14 progetti, per un totale di circa 3 milioni di euro. Nel mese di ottobre 2023 sono state pubblicate le linee guida relative alle sub-misure B1.3a, B1.3b e B1.3c del programma del Piano complementare al Pnrr dedicato alle aree del sisma 2009 e 2016, con le indicazioni relative alla fase attuativa dei progetti. Viene così avviata la concessione dei fondi destinati alle imprese dei due crateri, che consente di far partire gli investimenti relativi ad "Avvio, crescita e rientro di microimprese" (B1.3a), "Investimenti innovativi delle Pmi" (B1.3b), "Avvio, crescita e rientro delle Pmi" (B1.3c). (cfr. sito [Next Appennino](#)).

Nel mese di febbraio 2024 sono state approvate le indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato con l'indicazione dei relativi costi ammissibili inerenti alla linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio". Nel mese di marzo 2024 sono state pubblicate le Linee Guida della linea di intervento B3.2 "Economia circolare e filiere agroalimentari". Con l'Ordinanza n.91 dell'aprile 2024 è stata revocata la sub-misura B3.1, recante "Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali". Nello stesso mese, sono state pubblicate le FAQ di chiarimento per le linee di intervento B1.3a e B3.2. Nel mese di maggio 2024 sono state riallocate le risorse di tutte le sub-misure afferenti alla macro misura B. A giugno 2024 è stata approvata la proroga dei termini per l'attuazione dei progetti di cui al Bando B1.3b – "Investimenti innovativi delle Pmi". A luglio 2024 sono state fornite le indicazioni per l'elaborazione della proposta progettuale definitiva per la linea di intervento B2.2.

[10.3 PROGETTO DI ASCOLTO PARTECIPATO NELLE TERRE DELLA BARONIA](#)


Nell'esercizio delle proprie competenze in tema di Sviluppo del territorio, nel 2023 l'USRC e il Comune di Santo Stefano di Sessanio hanno posto in essere, con il supporto di un esperto in rigenerazione urbana, un progetto sperimentale di **Ascolto partecipato**, che mira ad individuare azioni per la **"rigenerazione urbana"** e la **"rigenerazione di comunità"**, con il coinvolgimento attivo della popolazione, degli attori istituzionali e degli operatori economici operanti nel territorio di Santo Stefano di Sessanio.

In esito al predetto progetto, confluito nel *"Documento di Inquadramento per la Rigenerazione urbana e la partecipazione a Santo Stefano di Sessanio"*, presentato il 16 dicembre 2023 a Santo Stefano di Sessanio e pubblicato sul sito istituzionale USRC (al link: [Documento di Inquadramento](#)), gli 8 Comuni di Barisciano, Calascio, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvechio Calvisio, Ofena, Santo Stefano di Sessanio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi, hanno espresso la comune volontà di intraprendere una fase successiva del progetto, estendendo l'Ascolto partecipato all'area vasta della Baronia, con l'obiettivo di individuare azioni di più ampia portata, capaci di incidere in maniera sistemica sulle criticità locali, sperimentando una collaborazione intercomunale per la costruzione delle strategie ed identificazione delle scelte progettuali, affiancata e sostenuta dall'USRC e dalla Regione Abruzzo.



In tal senso, il **"Progetto di Ascolto Partecipato nelle Terre della Baronia"**, su richiesta dell'USRC e degli 8 Comuni aderenti, ha ottenuto il patrocinio da parte della Presidenza del Consiglio Regionale (Deliberazione n. 31 del 5 marzo 2024), nonché l'alto patrocinio della Regione Abruzzo (DGR n. 364 del 25/06/2024).

Il Progetto ha l'obiettivo di costruire un quadro conoscitivo delle esigenze e delle proposte specificamente rivolte alla rigenerazione urbana, orientate alla riqualificazione urbana, architettonica e naturalistica, alla socialità ed alle relazioni urbane, al turismo ed alla cultura, allo sviluppo dell'economia e delle produzioni locali, all'occupazione, e destinate alla comunità locale, con l'obiettivo di contrastare il progressivo spopolamento che interessa i Comuni e di favorire l'abitare ed il senso di appartenenza ai luoghi.



Il Progetto intende pervenire alla definizione di un quadro programmatico "partecipato" di proposte e/o progettualità che i Comuni, anche in maniera integrata, potranno assumere a riferimento per futuri interventi da proporre a valere su risorse provenienti sia dalle fonti finanziarie dedicate alla ricostruzione ed allo sviluppo già disponibili, sia da eventuali e diverse fonti finanziarie.

Nel corso dell'anno 2024, l'USRC ha lavorato all'**identità visiva** del progetto, ideando il logo, ha predisposto e condiviso con le Amministrazioni comunali un **Questionario delle percezioni sui temi urbani, ambientali e socio-economici**, in duplice formato cartaceo e digitale, rivolto agli abitanti, ai frequentatori abituali e ai visitatori dei Comuni della Baronia, ed ha sviluppato un'**Analisi di contesto del territorio degli 8 Comuni della Baronia**, costruendo il quadro conoscitivo del territorio di intervento, da porre alla base delle successive attività di progetto, relativamente ai seguenti temi:

1. Inquadramento territoriale;

2. Scenario demografico e occupazionale;
3. Patrimonio costruito e condizione abitativa;
4. Offerta territoriale.

L'USRC, in affiancamento alle Amministrazioni comunali, sosterrà l'accompagnamento sul campo del territorio della Baronìa in un percorso di co-progettazione con le comunità e con gli attori istituzionali e socio-economici interessati, orientato a:

- individuare linee d'azione e proposte per lo sviluppo e la rigenerazione territoriale dell'area vasta rispondenti alle reali esigenze dei luoghi;
- definire tematiche, strategie e progettualità integrate, attivando sinergie e complementarità tra i Comuni.

10.4 PROGETTO DI CRESCITA ECONOMICA E PROGRESSO SOCIALE PER L'AREA INTERNA «GRAN SASSO – VALLE SUBEQUANA»

A far data dal giugno 2023, l'USRC ha attivato una collaborazione con il "Dottorato comunale di ricerca" in Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia per l'Area interna "Gran Sasso - Valle Subequana", coordinato dall'omonimo Dipartimento dell'Università dell'Aquila, finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Tale progetto di ricerca – della durata di tre anni – prevede la definizione di un piano di sviluppo economico per il territorio dell'Area interna "Gran Sasso - Valle Subequana. Il Prof. Luciano Fratocchi è responsabile scientifico del progetto, mentre la Dott.ssa Sabrina Di Flauro è titolare della borsa di studio.

Nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca, l'USRC e il Gruppo di ricerca UnivAQ hanno condotto un'indagine conoscitiva delle aziende operanti nei **macro-settori agro-alimentare** (inteso come l'intera filiera che va da agricoltura/zootecnia/silvicoltura alla trasformazione dei prodotti agricoli e alla produzione di alimentari e bevande) e **turistico-ricettivo** (inteso come servizi alberghieri e di alloggio, ristorazione, operatori turistici e pubblici servizi), aventi sede legale o unità locali nel territorio di 24 Comuni dell'Area interna, 19 dei quali appartenenti al Cratere sismico 2009.

Obiettivo del progetto è l'identificazione dei fabbisogni di innovazione (di prodotto, processo, organizzativa e di marketing) delle imprese delle due filiere, nonché delle criticità – settoriali e trasversali – che caratterizzano i processi di sviluppo delle stesse imprese. Sulla base delle evidenze empiriche raccolte, il Gruppo di ricerca UnivAQ individuerà delle possibili linee di sviluppo a supporto del tessuto economico locale - anche nella forma di collaborazioni tra aziende – e definirà delle linee di intervento per le amministrazioni locali.

L'indagine è stata realizzata mediante interviste semi-strutturate svolte, nella maggior parte dei casi, presso le imprese; talvolta, in modalità telematica. Tali interviste sono state svolte da un gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Fratocchi e composto dalla dottoranda e dal personale dell'USRC assegnato come supporto operativo al progetto.

Le **quasi 300 interviste**, condotte prevalentemente nel periodo luglio 2023 – febbraio 2024, hanno permesso di acquisire dati sistematicamente registrati in un *database*, accessibile in modalità condivisa alle due istituzioni (UnivAQ e USRC) mediante Sharepoint, nel periodo ottobre 2023 - agosto 2024.

L'USRC ha sostenuto il progetto mettendo a disposizione le proprie professionalità per:

- la realizzazione di strumenti informatici di lavoro, quali:
 - uno *sharepoint* per la condivisione dei documenti e materiali di lavoro tra il gruppo di lavoro USRC ed il gruppo di lavoro UnivAQ;
 - un foglio di gestione dati per l'implementazione del *database* delle interviste, che permette il caricamento di informazioni in forma strutturata e, allo stesso tempo, l'analisi/agggregazione dei dati secondo specifici criteri;
- la realizzazione di strumenti gestionali per la programmazione delle attività di progetto ed il monitoraggio dell'avanzamento;
- il raccordo istituzionale con i Comuni coinvolti, per l'acquisizione dei riferimenti delle aziende con sede nel territorio comunale e la programmazione degli incontri;
- l'attività di segreteria organizzativa per la calendarizzazione delle interviste mediante contatto diretto degli operatori economici;
- la partecipazione diretta alle interviste;
- il supporto operativo all'Università degli Studi dell'Aquila-DIIE per il caricamento dei dati sul *database* sviluppato *ad hoc*.

L'USRC ha inoltre messo in condivisione dell'Università i dati relativi ai progetti (es. cammini, progetti PIT), potenzialmente utili per un più esaustivo inquadramento del contesto territoriale negli aspetti di maggiore interesse per le due filiere produttive oggetto di indagine.

Le attività svolte ed i risultati preliminari dell'attività di ascolto delle imprese sono stati presentati agli Amministratori comunali nell'incontro svolto a Secinaro in data 29/11/2024, in presenza di USRC e dei componenti del Gruppo di ricerca UnivAQ-DIIE, in esito al quale si è tenuto un primo confronto tra gli Amministratori presenti in ordine alle opportunità e alle criticità emerse dall'indagine e alle iniziali proposte di intervento.

A partire dai dati acquisiti dalle interviste, l'USRC ha inoltre effettuato un'analisi attinente alla tipologia di attività svolte e di servizi offerti dalle aziende dei due macro-settori di indagine localizzate nei 22 Comuni dell'Area interna "Gran Sasso-Valle Subequana" attraversati dai 4 Cammini finanziati sul PNC a responsabilità dell'USRC, quale quadro conoscitivo presupposto ad azioni di valorizzazione della fruizione, anche esperienziale, dell'infrastruttura culturale dei *Cammini degli altipiani*.

10.5 PROGETTUALITA' PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

In tema di **valorizzazione turistica del territorio**, l'USRC già dal 2020 ha dato avvio all'implementazione di **"STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE"**, un quadro di area vasta delle risorse turistiche del territorio del Cratere, composto dall'analisi dei principali tematismi/valori e dalla sintesi degli stessi in una Visione guida, che mette a sistema le emergenze puntuali di valore storico, architettonico e naturalistico ed i percorsi fisici e tematici che le collegano, con

l'obiettivo di delineare un sistema integrato di fruizione e conoscenza dei luoghi, funzionale a consolidare l'identità e la cultura del territorio.

La Visione guida e le analisi ad essa presupposte sono rese disponibili ai Comuni del Cratere, quale strumento a supporto delle decisioni e delle proposte di intervento in materia di sviluppo del territorio, sul sito istituzionale dell'USRC, al seguente link: [Strategie sviluppo turistico](#)

Sulla base delle "STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE", l'USRC ha predisposto nel 2021 il Progetto «**Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani**», per un importo previsionale di 70 Mln €, entrato a far parte, insieme ad altre 73 proposte progettuali regionali, della "Banca progetti" della Regione Abruzzo, oggetto della proposta-contributo al **PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** "L'Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese", inviata il 15 ottobre 2020 dalla Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri agli Affari europei e agli Affari regionali. Il documento è disponibile al seguente link: [Regione Abruzzo. L' Abruzzo e il PNRR.](#)


11. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE



L'USRC gestisce le attività di rilevazione dei fabbisogni finanziari e di programmazione della spesa in raccordo con le Strutture Centrali ed alloca le risorse agli Enti beneficiari dei trasferimenti/contributi tramite emissione di ordinativi secondari di contabilità speciale, ottemperando alle prescrizioni normative circa le modalità e i termini di rendicontazione alla competente RTS.

Ad oggi sono stati eseguiti complessivamente n. **18.753** mandati di pagamento per un totale **€ 2.275.857.771,27**.

Nel corso del 2024 sono stati eseguiti n. **2504** mandati di pagamento per complessivi **€ 224.862.098,99**. Per il dettaglio si veda il sito <http://www.usrc.it/ammtrasparente.aspx>. Si riporta nel sottostante la composizione della spesa relativamente alle principali categorie di spesa

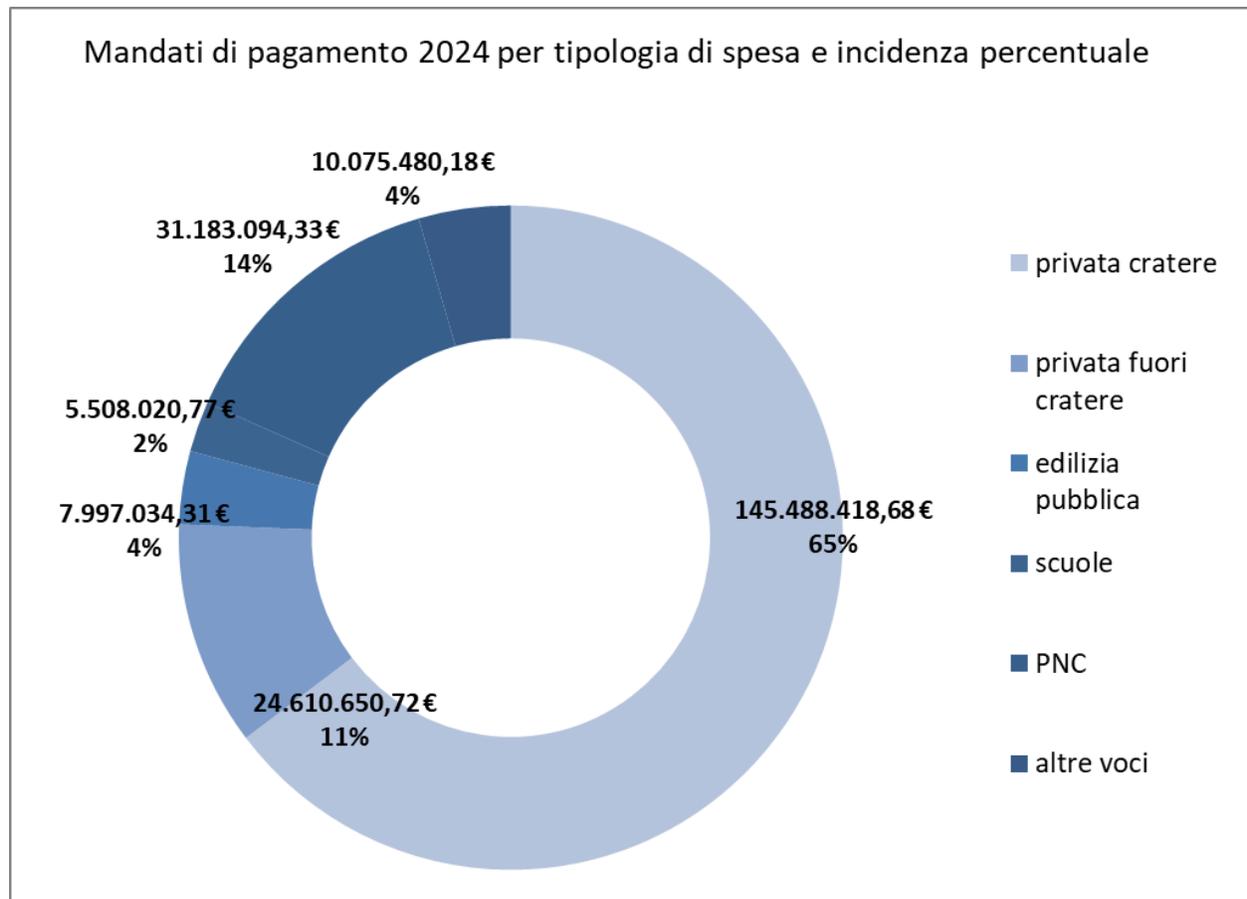

Di seguito alcune delle principali attività di gestione fondi dell'USRC oltre quelli della ricostruzione privata, OO.PP., ed edilizia scolastica.

11.1 SPESE OBBLIGATORIE

L'USRC esegue l'istruttoria delle rendicontazioni effettuate dai Comuni sul portale di interscambio AVEIANET dove gli stessi possono compilare le schede relative alle diverse tipologie di spesa (CAS, LOCAZIONE TEMPORANEA ALLOGGI, TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO, CONTRATTI DI LOCAZIONE) al fine di richiedere il trasferimento dei fondi.

L'attuale normativa non prevede forme di finanziamento per le misure assistenziali "C.A.S." e "Locazioni/Affitti concordati" relativamente alle annualità successive al 2019. L'Ufficio pertanto istruisce le sole istanze tardivamente pervenute dagli Enti di riferimento.

La delibera Cipess n. 48 del 9 luglio 2024 - Sisma Abruzzo 2009 dispone l'assegnazione complessiva a favore dell'Ufficio Speciale di risorse pari a 722.269,00 euro, destinato alla voce di spesa indennizzo per traslochi e deposito di mobilio per le annualità 2024/2026.

Nel corso del 2024 è stato trasferito in favore di 24i Comuni del Cratere e Fuori Cratere l'importo di € **299.896,81** per trasloco e deposito temporaneo del mobilio.

11.2 CO.CO.CO.

Viene confermato dalla Legge di Bilancio 2023 il finanziamento delle spese del personale assunto ai sensi della normativa emergenziale dai Comuni del Cratere.

Nel 2024 è stato trasferito dall'USRC agli Enti titolari dei rapporti di lavoro l'importo di € **769.260,75** ripartito come segue:

- co.co.co. comuni cratere - competenza anno 2020 € 21.600,00;
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2021 € 21.600,00;
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2022 € 75.003,31;
- co.co.co. comuni cratere - competenza anno 2023 € 525.057,44;
- co.co.co. comuni cratere - competenza anno 2024 € 126.000,00.

11.3 VIDEOSORVEGLIANZA

Nel corso del 2024 sono stati erogati fondi per il finanziamento del *“Safe Community – Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico”* per un importo complessivo pari ad € **138.118,49**.

11.4 TRASFERIMENTI PNC/PNRR

Nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR l'USRC, dopo aver verificato la completezza degli atti approvati dagli Enti Responsabili degli interventi, trasferisce a questi ultimi le risorse finanziarie nelle misure stabilite con Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e tiene una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati. NEL CORSO DEL 2024 l'USRC ha trasferito a favore di 52 Enti responsabili degli interventi risorse per un importo complessivo pari a **30.684.959,54 €**.


11.5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'USRC

Nel corso del 2024 sono state gestite **406 fatture** emesse a seguito di affidamenti di appalti di forniture e servizi per un importo complessivo di circa € **450,63 mila oltre IVA**, gestite con un tempo di liquidazione mediamente inferiore rispetto alla scadenza della fattura. Gli indici di tempestività dei pagamenti sono consultabili al link

<https://www.halleyweb.com/cusprdcc/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/132>

Sul piano organizzativo, l'attività di liquidazione è stata incanalata in un processo disciplinato con disposizione di servizio del Dirigente dell'Area Giuridico-Finanziaria la cui caratteristica essenziale è la

previsione di tre livelli di controllo interno da attuarsi su l'istruttoria tecnico-amministrativa, sulla proposta di determinazione e sugli adempimenti obbligatori in tema di trasparenza e pubblicità. I tre livelli di controllo ormai ampiamente collaudati, non comportano rallentamenti del processo di liquidazione il cui tempo medio di conclusione è pari, **nel 2024, a 29 giorni**.

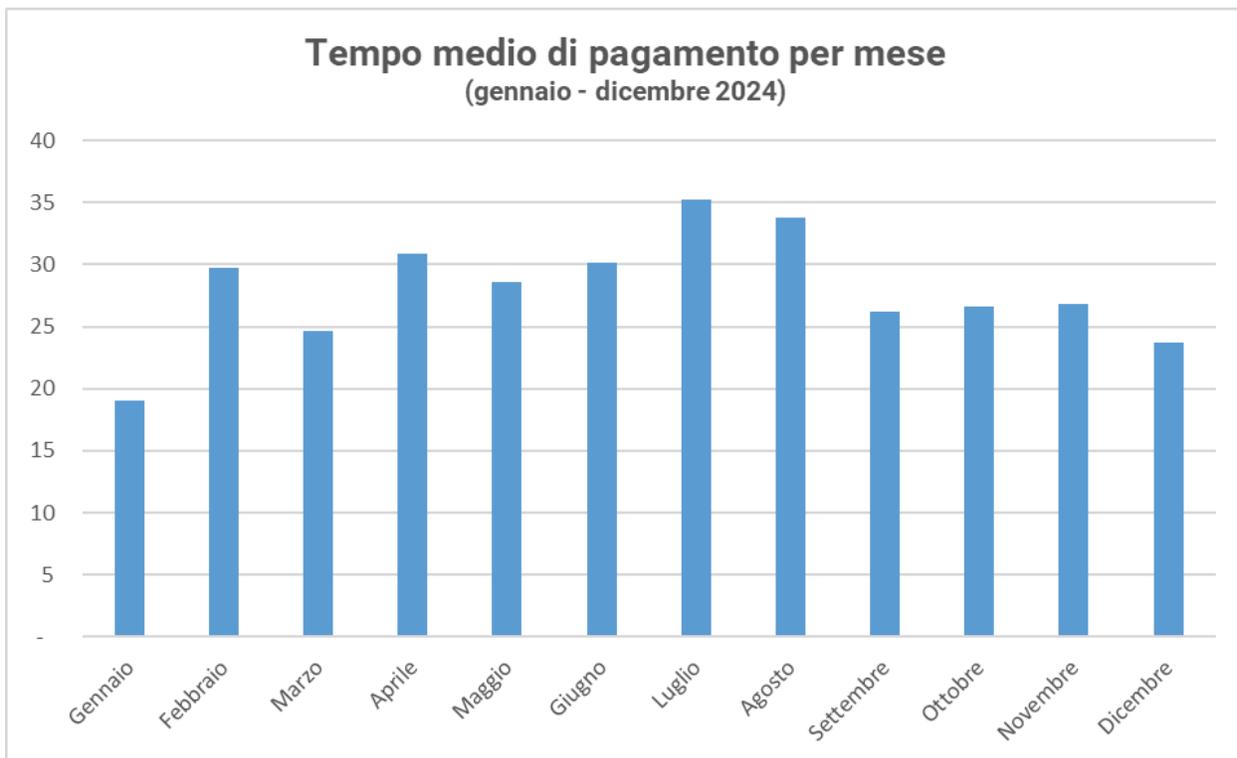

12. CAMMINI

L'USRC, nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, è stato individuato come **Soggetto Responsabile per l'attuazione di quattro interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016**, Sub-misura A3, *"Rigenerazione urbana e territoriale"*, Linea di intervento 3, intitolata *"Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita"* ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

Gli interventi riguardano la valorizzazione di percorsi di fruizione del territorio e sono il frutto di proposte progettuali ideate da i Comuni coinvolti e dall'Ufficio, sulla base delle **"STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE"**, un quadro di area vasta delle risorse turistiche del territorio del Cratere sviluppato dall'Ufficio (§ 10.4).

Sono stati identificati quattro cammini che mettono in relazione tra loro circa **40 comuni del Cratere e Fuori Cratere 2009, 3 parchi, di cui due nazionali e uno regionale, circa 400 Km di tracciati, per un valore pari a 2,2 milioni di euro.**

"Il Cammino grande di Celestino" nasce su iniziativa del Parco Nazionale della Majella e attraversa i Comuni di L'Aquila, Ocre, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, San Demetrio Ne' Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Acciano, oltre ai Comuni fuori cratere di Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Raiano, Corfinio, Roccacasale, Pratola Peligna e Sulmona;

"Il Cammino della Baronìa", nasce su proposta dei Comuni di Castelvecchio Calvisio (capofila), Calascio, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Ofena, Santo Stefano Di Sessanio e Villa Santa Lucia e attraversa gli stessi Comuni e quello di Capestrano;

"Il Cammino tra i Vestini", nasce su iniziativa del Comune di Navelli (AQ) e attraversa i Comuni di Fossa, Villa Sant'Angelo, Sant'Eusanio Forconese, San Demetrio Ne' Vestini, Poggio Picenze, Barisciano, San Pio delle Camere, Navelli, Acciano, Caporciano e Prata D'Ansidonia;

"Il Cammino dei Francescani", nasce su proposta del Comune di Gagliano Aterno (AQ) e attraversa i Comuni di Rocca di Mezzo, Ovindoli, Celano, Aielli, Collarmele, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo e Secinaro.

L'USRC, in quanto soggetto responsabile dell'intervento, ha redatto internamente, con proprio personale tecnico e con il contributo degli amministratori dei Comuni interessati, il progetto di fattibilità tecnico economica (P.F.T.E.) posto a base di gara per la procedura di appalto integrato, in linea con il Programma unitario di interventi per le aree del sisma 2009 e 2016 approvati dalla Cabina di Coordinamento Integrata con Delibera del 30/09/2021.

A Dicembre 2022 sono state aggiudicate le 4 gare d'appalto attraverso cui si sono affidate le 4 progettazioni definitive/esecutive ed i relativi lavori. A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni necessarie nel 2024 sono stati avviati i lavori di implementazione e consolidamento dei quattro cammini.



Con riferimento ai principali interventi infrastrutturali previsti, a fine Dicembre possono ritenersi conclusi, la sistemazione del fondo dei sentieri esistenti e la riapertura e ripristino di quelli impraticabili, il taglio della vegetazione arbustiva, la posa in opera della segnaletica direzionale.

Si prevede nella prossima annualità il completamento dei lavori ed in particolare la posa in opera di ulteriore segnaletica verticale informativa in prossimità di siti di interesse storico-culturale ambientale, di bacheche descrittive dei Cammini e dei comuni interessati, e aree di sosta poste in posizioni strategiche e utili alla comunicazione di informazioni territoriali, culturali e per la sicurezza del camminatore. È prevista inoltre la realizzazione di attraversamenti pedonali in corrispondenza delle intersezioni con le strade provinciali interessate e la fornitura e posa in opera di colonnine di ricarica per e-bike con l'obiettivo di potenziare la mobilità sostenibile e aumentare la qualità del servizio offerto ai fruitori del Cammino.

La principale innovazione introdotta nel Cammino è di **carattere culturale oltre che digitale e tecnologica**: la segnaletica sarà infatti implementata con un sistema basato sulla tecnologia smart dei Beacons virtuali, dispositivi digitali geo-referenziati posizionati lungo il tracciato attraverso cui restituire al viaggiatore un'esperienza di performing heritage nella quale emerge il valore del patrimonio materiale ed immateriale della comunità. Il camminatore una volta entrato nel raggio di trasmissione del Beacon, verrà raggiunto da una notifica per accedere all'app dedicata, indipendentemente dai segnali di rete, spesso deboli in tali zone, e per essa ai contenuti culturali selezionati. Nell'ottica di una maggiore inclusività, i contenuti multimediali associati ad ogni punto di interesse (layer narrativi, schede testuali, foto, tracce audio e video) saranno flessibili, multilingua, implementabili e modificabili periodicamente attraverso la piattaforma digitale di gestione. La piattaforma permetterà inoltre di monitorare i flussi, ottenendo statistiche utili per definire strategie e azioni di perfezionamento dell'offerta turistica.

Nel 2024 è stata completata la redazione dei contenuti sul patrimonio materiale e il caricamento sull'applicazione dedicata che sarà a breve rilasciata per l'uso dei camminatori.

La metodologia sperimentale applicata per l'implementazione del racconto innovativo, attraverso i contenuti sul patrimonio immateriale, ha previsto un lavoro sinergico con le amministrazioni e il coinvolgimento di stakeholder locali ed è tuttora in corso.

L'obiettivo principale del progetto nella sua unitarietà consiste nell'identificazione e valorizzazione dei percorsi con azioni volte a promuovere:

- lo **sviluppo e l'aumento dell'offerta turistica** dei territori comunali interessati, ampliandone la conoscenza sotto l'aspetto naturalistico, storico-culturale, architettonico, sportivo e gastronomico;
- la qualità funzionale della **mobilità lenta**, con il noleggio di biciclette e mountain bike, favorendo il trekking a cavallo, con l'opportunità di costruire una rete di connessioni intercomunali mediante l'integrazione del cammino con il sistema delle strade poderali e vicinali ad esso collegate;
- l'**accessibilità**, per favorire la percorrenza del cammino nell'ottica dell'inclusività sociale;
- la **conoscenza del territorio**, per scoprire le testimonianze storiche, le tradizioni e le peculiarità dei luoghi attraversati.

A questo proposito, l'USRC sta mettendo in atto contestualmente all'espletamento dell'appalto integrato un sistema di pratiche e di iniziative per promuovere la conoscenza del territorio, tra cui l'attivazione di un **processo di formazione, informazione e comunicazione**, ovvero di **azioni mediatiche, attività di divulgazione dell'operato dell'Ufficio e processi partecipativi**. Per lo sviluppo di queste azioni è stata necessaria una **pianificazione multilivello e multiattoriale** basata su una metodologia di lavoro sinergica con le istituzioni locali di messa in rete e raccordo di amministrazioni, enti locali, associazioni e stakeholder per analizzare e discutere in maniera partecipativa i bisogni relativi alla gestione condivisa dei Cammini e le prospettive per una sostenibilità futura.

Inoltre, è stata realizzata una **collaborazione con il Club Alpino Italiano** Sezione di L'Aquila per le attività di supporto operativo e logistico all'interno delle operazioni di consolidamento e implementazione per lo svolgimento di giornate di percorrenza (tappe). L'obiettivo è stato quello di fare sopralluoghi sul campo per rilevare lo stato di fatto e le previsioni progettuali degli interventi previsti per i quattro cammini, e ha visto la collaborazione dei dipendenti USRC e di accompagnatori CAI e sviluppato una storia di racconti dalla testimonianza di chi ha preso parte all'iniziativa.

Le azioni sopra indicate, sono state funzionali e propedeutiche all'avvio di un **percorso di strutturazione di una gestione condivisa dei Cammini degli Altipiani e della definizione di un modello di governance** iniziato con riflessioni sulla necessità di restituire alla comunità la capacità di governare il progetto dei cammini nel lungo periodo. Infatti, dagli incontri di formazione, informazione e scambio con gli stakeholder locali, iniziati nel 2023 e proseguiti nel 2024 (maggiormente dettagliati nel paragrafo 13.2), è emersa in maniera significativa l'esigenza collettiva di un coordinamento nel tempo da parte di un soggetto pubblico di tutti gli attori dei 4 percorsi, non solo per quello che riguarda la dimensione manutentiva, ma anche quella legata alla promozione del territorio. Nell'ottica di apprendimento e scambio di buone pratiche e in continuità con le attività di collaborazione con il CAI L'Aquila, l'USRC ha partecipato agli **"Stati Generali del Turismo Outdoor - Camminare l'Italia verso una visione comune"**, organizzati a Venezia il 23-24 Novembre 2024, dal CAI con il patrocinio del Ministero del Turismo, Sport e salute. Un'importante occasione di condivisione e dialogo fra gli operatori e le istituzioni (Ministero del Turismo, Regioni, Comuni e altri Enti Pubblici) per approfondire le tematiche strategiche, fondamentali per governare lo sviluppo del camminare in Italia.

Per maggiori info e dettagli si rimanda al seguente link del sito internet USRC: <https://www.usrc.it/attivita/cammini-degli-altipiani/progetto>.

13. PROMOZIONE CULTURALE E COMUNICAZIONE

13.1 CEC: CARTELLONE CONDIVISO DEGLI EVENTI CULTURALI DEI COMUNI DEL CRATERE

Il **CEC: il Cartellone Condiviso degli Eventi Culturali del Cratere** rappresenta una base di dati per la raccolta, la categorizzazione e la calendarizzazione degli eventi culturali che l'USRC ha creato nel 2023. Il CEC raccoglie alla data odierna oltre 1500 eventi, già avvenuti o in programmazione, in 64 diversi Comuni raccolti tra marzo 2023 e dicembre 2024.

Il lavoro svolto fino ad adesso ha incluso le seguenti tappe:

Nel **primo semestre del 2023** con nota Prot. 4529 l'USRC ha dato vita ad un'**attività di ricognizione** degli eventi culturali programmati su base annuale e pluriennale attraverso l'organizzazione di una giornata formativa rivolta ai 56 Comuni del Cratere di introduzione al CEC. L'avvio della ricognizione per la creazione del CEC risponde all'esigenza espressa a più voci di compiere uno sforzo comune per instaurare un livello di coordinamento tra tutte le amministrazioni comunali del Cratere, al fine di concertare una programmazione temporale a più ampio respiro e di creare opportune sinergie tra i molteplici piani di comunicazione esistenti sul territorio.

Tra la **fine del primo semestre e la prima parte del secondo semestre 2023** l'Ufficio ha fatto **attività di promozione e divulgazione del CEC** tramite eventi, iniziative pubbliche e una campagna di raccolta dati e informazioni destinati ai Comuni che ha portato alla fine del secondo semestre del 2023 ad avere più di 400 eventi raccolti nel CEC.

Nell'ultima parte del **secondo semestre 2023** l'Ufficio ha dato avvio ad uno **studio quanti-qualitativo dei dati raccolti con il CEC**, oltre ad un'analisi delle sfide e opportunità dello strumento per capire come arrivare ad un suo potenziamento e ad una sua maggiore diffusione e utilizzo da parte degli utenti.

Nel primo semestre 2024, è stato creato un documento di strategia di promozione, che ha preso le mosse dagli esiti delle attività di studio e analisi, nel quale sono state impostate alcune delle azioni prioritarie per lo sviluppo ulteriore e la promozione della piattaforma. In questo contesto, è nata la **CulturalHack, organizzata dall'USRC ad aprile 2024 nell'ambito del TedXAquila (13-14 aprile 2024)**. Con l'intento di verificare le azioni prioritarie per l'ampliamento del CEC con un target di giovani studenti e professionisti e portare idee innovative nel modus operandi e visione del CEC sono state organizzate due giornate di hackathon sui temi dello sviluppo territoriale a base culturale. L'iniziativa ha mirato a ragionare insieme a 21 professionisti, studenti e ricercatori riuniti in 4 team multidisciplinari su tre obiettivi: (1) la fidelizzazione e l'ingaggio di nuovi utenti, (2) l'integrazione dello strumento con altre piattaforme e

progettualità USRC (es. webgis e progetto Cammini degli Altipiani), (3) la comunicazione e la maggiore visibilità per il CEC.

La CulturalHack ha permesso la validazione di parte degli esiti del lavoro di studio e analisi e ha portato nuovi spunti di idee progettuali che l'Ufficio è in fase di elaborazione e sistematizzazione, per arrivare ad una **proposta progettuale per lo sviluppo del Cartellone degli Eventi Culturali del Cratere** in cui si **intende ampliare il CEC per sviluppare ambiti di azione innovativi** (tra questi, lo sviluppo di una piattaforma tecnologica integrata, la realizzazione di azioni di marketing turistico, un piano di comunicazione, la creazione di reti e collaborazioni formative e informative). In parallelo, la messa a verifica e i nuovi input hanno avviato una **nuova fase di raccolta informazioni e popolamento della base dati del CEC** portata avanti nel 2024 dal personale interno USRC che ha portato il numero di eventi raccolti, categorizzati e diffusi tramite il CEC a più di 1500.



CARTELLONE CONDIVISO DEGLI EVENTI CULTURALI

Vuoi conoscere gli eventi del tuo territorio?
Sei in vacanza in Abruzzo e vuoi vivere un'esperienza unica con le attività organizzate nei nostri paesi?
La cultura, lo spettacolo, la natura, sono a tua disposizione sul CEC! In questo sito troverai le indicazioni per conoscere, prenotare e raggiungere gli eventi di oltre 50 comuni, impegnati nella ricostruzione anche attraverso la cultura, l'accoglienza e la condivisione.



Tra gli obiettivi del CEC si annoverano quelli di:

- garantire l'**ecologia dell'informazione**, ossia la correttezza, l'omogeneità e la non sovrapposizione delle informazioni;
- **concentrare l'intera offerta culturale** in un unico contenitore di libera consultazione;
- evidenziare potenzialità e criticità tramite l'**analisi dei dati raccolti**;
- **suggerire sinergie** tra i diversi operatori/territori/vocazioni;
- arricchire l'offerta per gli utenti del territorio e delle **nuove infrastrutture del «turismo lento»**;
- consentire una distribuzione cronologicamente più uniforme ed estesa dell'offerta culturale;
- facilitare l'**accesso degli utenti** (eventi accessibili/non accessibili, gratuiti/a pagamento...);
- **amplificare la circolazione delle informazioni** tramite un rapido rilancio sui social network.

Alla data del 31 dicembre 2024 **risultano inserite per il 2024 più di 1100 iniziative concluse o in programmazione da parte di 64 Comuni**, complete di tutte le informazioni e consultabili tramite smartphone, tablet e pc.

Le azioni di promozione della piattaforma per aumentare la visibilità delle iniziative in essa promosse, consistono nella



condivisione degli eventi sui profili social dell'USRC e dei Comuni interessati dall'iniziativa, nonché l'adesione da parte di alcuni di questi ultimi all'iniziativa di pubblicazione del link di accesso al portale sui propri siti istituzionali.

Gli eventi e le relative schede-evento sono in continuo aggiornamento grazie allo sforzo congiunto tra i Comuni interessati, le diverse associazioni operanti sul territorio e l'USRC, con l'**obiettivo di raggiungere una programmazione coordinata e strategica dei progetti e degli eventi culturali sviluppati nel territorio.**

13.2 PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI

Nell'ambito dell'iniziativa Cammini, l'ufficio ha lavorato allo sviluppo di un Piano di Formazione, Informazione e Comunicazione che **sta prevedendo l'implementazione di azioni per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e la conoscenza del territorio** da un punto di vista naturalistico, storico-culturale, architettonico, sportivo e gastronomico, puntando l'attenzione sulla valorizzazione di beni pubblici riconducibili sia al patrimonio minore che al patrimonio culturale di pregio.

Le azioni includono: una **narrazione innovativa** dei Cammini che parte da una ricerca etnografica condotta da antropologi nelle aree dei quattro cammini seguendo una *metodologia sperimentale*, sviluppata a partire dai requisiti del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO e utile ad effettuare un racconto innovativo del territorio lungo i quattro cammini che mette insieme supporti fisici tradizionali e supporti narrativi digitali audio e video. Il racconto innovativo ha l'**obiettivo di accompagnare le persone che percorrono i cammini nella scoperta o riscoperta della storia e delle storie che rendono unico il territorio.** Si sviluppa lungo i 400 km dei cammini grazie alla segnalazione di circa 200 punti di interesse che raccolgono informazioni su beni materiali e immateriali archeologici, storici, culturali, naturali e architettonici e sono consultabili dal camminatore in appositi sostegni fisici e digitali presenti durante il percorso.

Inoltre, si è lavorato alla creazione di un'**identità visiva** per l'intero progetto (con l'ideazione di un logo identificativo per i Cammini degli Altopiani e una specifica caratterizzazione grafica per ciascun Cammino), che ha l'obiettivo di **facilitare la percorrenza e la riconoscibilità del tracciato** ai camminatori e alle camminatrici. L'ideazione e la declinazione del sistema d'identità visiva generale per i 4 cammini è stata accompagnata da un lavoro di ricerca della storia e delle peculiarità che caratterizzano i 4 cammini dedicata alla storia delle origini dei cammini in particolare alle figure storico religiose di Celestino, dei Francescani e alle terre della Baronia e dei Vestini. Questo ha permesso la creazione di un'**identità visiva che con segni, colori, immagini, forme, spazi, messaggi, possa restituire e comunicare suggestioni ed emozioni legate alla storia del territorio.**

L'ulteriore azione innovativa consiste nell'**implementazione della segnaletica con tecnologia smart** per offrire un'**esperienza immersiva del cammino, in sicurezza e nell'ottica di una massima inclusività e accessibilità.** Per mezzo di segnalatori fisici e virtuali viene creata una rete attiva di punti di informazione che erogano contenuti testuali e multimediali (video, audio e immagini) consultabili tramite smartphone e tablet. Il servizio di implementazione tecnologica attraverso il sistema beacons fa riferimento ad un sistema che, attraverso l'utilizzo di un dispositivo bluetooth, definisce un'area fisica di dimensioni configurabili.

Per lo sviluppo di queste azioni è stata necessaria una **pianificazione multilivello e multiattoriale** basata su una metodologia di lavoro sinergica con le istituzioni locali di messa in rete e raccordo di amministrazioni, enti locali, associazioni e stakeholder. In parallelo e grazie all'infrastruttura attoriale

creata, è stato portato avanti un percorso di ricerca, sviluppo e lavoro sul territorio facilitato dal supporto di società di consulenza esterne.

L'Ufficio si è inoltre dedicato alla creazione di una **sezione del sito istituzionale USRC dedicata ai Cammini degli Altipiani** per la diffusione e visibilità delle diverse azioni che compongono il progetto, tanto dal punto di vista dell'implementazione strutturale dei tracciati, come da quello delle attività complementari sopra descritte e degli incontri di formazione e informazioni parte del piano di comunicazione.

Infatti, nell'ottica di una **gestione condivisa e della definizione di una governance dei Cammini**, sono stati organizzati ulteriori momenti di formazione e informazione sul patrimonio culturale materiale e immateriale e sui modelli di gestione collaborativa dei cammini in continuità con quelli organizzati nel 2023 con l'obiettivo di discutere, analizzare e condividere le esigenze, le proposte del territorio e di tutti gli attori coinvolti.

Tra questi, vi sono l'evento **"Cammini degli Altipiani: natura, patrimonio e tecnologia come strategia di rigenerazione territoriale"** organizzato il **28 maggio 2024**, frutto della collaborazione tra il centro di documentazione Territori aperti UnivAQ e l'USRC, all'interno del Festival dello sviluppo sostenibile di Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), rete di oltre 300 soggetti impegnati per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite e dei suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

Inoltre, nel 2024, ci sono state le **conferenze stampa di avvio dei lavori di implementazione e consolidamento dei quattro cammini**. Il **22 maggio quella del Cammino tra i Vestini**, 85 Km di percorso che incrocia 11 Comuni legati alla storia del popolo Vestino. Il **24 giugno la Conferenza Stampa di consegna dei lavori del Cammino Grande di Celestino**, 90 Km di percorso, suddiviso in 4 tappe, che incrocia 19 Comuni, e che ripercorre il viaggio compiuto nel Luglio 1294 dall'eremita della Maiella Pietro Angeleri, che dall'eremo del Morrone raggiunse l'Aquila per essere incoronato Papa con il nome di Celestino V. Il **19 luglio**, la conferenza stampa **di avvio lavori di implementazione e consolidamento del Cammino dei Francescani**, 80 Km di percorso, suddiviso in 10 tappe, che intercetta 10 Comuni attraversando alcuni dei luoghi storici più significativi percorsi da San Francesco e Beato Tommaso da Celano. E infine, il **2 Agosto si è svolta la conferenza stampa di avvio lavori del Cammino della Baronia**, 100 Km di percorso, suddiviso in 11 tappe che incrocia 8 Comuni nell'area che apparteneva alla cosiddetta "Baronia di Carapelle" un bacino pastorale tra i più importanti d'Italia situato in posizione strategica rispetto ai percorsi della transumanza ed ai traffici commerciali della Via degli Abruzzi.

In parallelo, tra **giugno e settembre 2024** si è realizzato il **progetto formativo CAI-USRC** nell'ambito dei lavori per la realizzazione e implementazione dei Cammini. Ci sono stati due incontri di formazione tenuti dagli operatori CAI per trasferire conoscenze di settore al personale dell'USRC per i lavori di campo, realizzati per simulare l'esperienza del camminatore e renderla un'occasione di conoscenza del territorio, oltre ad un viaggio personale. . La ricognizione tecnica dei tracciati effettuata congiuntamente da parte di dipendenti USRC e accompagnatori CAI è consistita in 33 uscite effettuate tra il 13 giugno e il 19 settembre 2024 per percorrere le 40 tappe dei 400 Km di cammini. Ed infine una tavola rotonda di confronto sul lavoro compiuto, i risultati raggiunti e le opportunità future.

Tra il **17 e il 19 settembre**, l'USRC ha attivamente partecipato a **RemTech 2024 a Ferrara**, tre giornate dedicate al confronto internazionale sui temi della rigenerazione urbana e dello sviluppo sostenibile del territorio. "Transizione tra fase emergenziale e fase di ricostruzione, contabilità speciale, i ruoli di

coordinamento e le attività di monitoraggio” il tema al centro del dibattito sul Codice della Ricostruzione nella fase attuativa, che ha visto tra i protagonisti l’esperienza di USRC, oltre a USRA e USR2016.

L’**1,2,3 novembre** si è svolta all’Aquila la manifestazione "**L’Aquila Città di Montagna**" a cui hanno preso parte USRC e USRA con l’obiettivo di promuovere il patrimonio naturalistico, culturale ed economico locale raccontando e mostrando i progetti di riqualificazione dei cammini e dei sentieri.

Infine, in coordinamento con le attività legate al CEC, l’Ufficio sta raccogliendo e categorizzando gli eventi culturali presenti sul territorio dei cammini.

13.3 BANDI E FORMAZIONE

Nell’ambito delle azioni volte a promuovere lo sviluppo dei territori tramite la valorizzazione culturale per lo sviluppo sostenibile, l’Ufficio, grazie alle conoscenze crescenti del contesto territoriale in merito a sfide, esigenze e opportunità per le ricognizioni e un sempre maggiore contatto con gli attori locali, si è dedicato alla ricerca, disamina e **diffusione tra le amministrazioni dei Comuni del Cratere di opportunità di formazione, progettazione e finanziamento** a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per enti locali e attori del territorio sui temi dello sviluppo locale e della progettazione in ambito culturale in senso ampio.

Come ulteriore azione l’Ufficio ha iniziato a supportare i Comuni, in caso di richiesta diretta, nelle **attività di lettura di bandi e impostazione di candidature per progetti sullo sviluppo territoriale a base culturale**.

L’ufficio ha inoltre attivato collaborazioni con università per la **produzione di letteratura accademica e scientifica di informazione e divulgazione del lavoro dell’USRC**, con particolare focus sullo sviluppo territoriale con accento ai temi della sostenibilità sociale, economica e ambientale in occasione di workshop e conferenze internazionali. Tra queste, la partecipazione dell’ufficio alla scrittura del paper “Territorial Regeneration in the Crater Municipalities after the Earthquake of L’Aquila: Social Challenges and Innovative Approaches” di cui l’autrice principale è stata una dottoranda Univaq-USRC che è stato selezionato per la presentazione alla conferenza internazionale The 24th International Conference on Computational Science and Its Applications - ICCSA, tenutasi in Vietnam tra il 1-4 luglio 2024.

13.4 DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' UFFICIO

Nel 2024 l’Ufficio ha organizzato eventi istituzionali locali, nazionali ed europei per la diffusione dell’operato e la promozione del lavoro dell’USRC. Tra questi, la **mostra itinerante fotografica e video** organizzata a **Bruxelles il 19 giugno 2024**, intitolata "**2009-2024: quindici anni dal sisma in Abruzzo**" sullo stato della ricostruzione nel Comune dell’Aquila e nei Comuni del cratere sismico, organizzata dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (Usra e Usrc) presso la sede della Regione nella sede delle Istituzioni Europee. Un momento istituzionale di alto livello, a cui hanno preso parte esponenti del corpo diplomatico, parlamentari e rappresentanti delle istituzioni ed enti europei, oltre a molti cittadini europei di origini abruzzesi, con l’obiettivo di condividere con il pubblico il progresso e la resilienza dimostrata dalla nostra regione negli ultimi quindici anni.

L’Ufficio ha proseguito nel 2024 al supporto, assistenza e/o organizzazione diretta di incontri sul territorio con il coinvolgimento degli attori locali che contribuiscono alla divulgazione e diffusione dell’operato e attività dell’USRC.

Tra questi la partecipazione e il patrocinio al seminario internazionale **Slower, Closer, Wiser: Walking at High Altitudes** che si è tenuto a **Calascio l'11 luglio**, nell'ambito della **Gran Sasso Summer School 2024** del DICEAA UnivAQ. Inoltre, il supporto all'organizzazione e promozione dell'evento promosso dall'Associazione **GESTA (Gestione EcoSostenibile del Territorio in Abruzzo)** il **30 maggio** a Fossa, una giornata di incontro con i sindaci sul tema dell'energia rinnovabile da legno e altri residui vegetali.

Le attività di divulgazione e diffusione delle attività vengono condivise dall'Ufficio nella crescente **rete di contatti locali, regionali e nazionali** che l'USRC ha iniziato a raccogliere con la ricognizione fatta in occasione del Mapping Operativo organizzato nell'ambito degli incontri di Formazione e Informazione dei Cammini degli Altipiani organizzato a novembre 2023, momento che ha portato ad una approfondita mappatura di attori del territorio. Questa attività, ha infatti permesso di arricchire l'agenda di contatti creata con la raccolta di informazioni ed eventi del CEC, con una profilazione e targettizzazione del network dell'Ufficio composto di figure locali, regionali e nazionali con expertise diverse, focus tematici e campi di azioni legati allo sviluppo territoriale a base culturale.

CREDITS

- Immagine di copertina, courtesy of Alessandro Chiappanuvoli
<https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/castelli-di-fondazione-dellaquila-fossa-il-baronato-del-gran-rifiuto.html>

- pag.19 [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centro_storico_Navelli.jpg - Sayatek, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons]
- pag.26 [<https://www.giulianova.it/localita/santo-stefano-sessanio/>]
- pag.38
[https://abruzzoturismo.it/sites/default/files/2020-09/800px-Corno_grande_e_Pietracamela%2C_Gran_Sasso%2C_Provincie_of_Teramo%2C_Abruzzo%2C_Italy_-_panoramio.jpg]
- pag.49
[<https://i0.wp.com/www.abruzzo-segreto.it/wp-content/uploads/Veduta-aerea-Chiesa-di-Madonna-del-Campo-03.jpg?fit=1920%2C1280&ssl=1>]
- Tutte le illustrazioni [<https://www.freepik.com/pch-vector/>]
