

USRA - USRC
UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROFILO

Ufficio Centralizzato Espropri

C/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della G. di F.

Viale delle Fiamme Gialle

67100 L'Aquila

Tel.: 0862.345212

Telefax: 0862.345213

Posta elettronica certificata: uce@pec.it

Coordinatore: Arch. Fausto Pedetta Peccia

PRESENTAZIONE

Il Dipartimento della Protezione Civile, a seguito del sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la Regione Abruzzo, ha istituito la Struttura di missione ex articolo 4 della O.P.C.M. 17 settembre 2010, n. 3898 al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni finalizzate agli interventi residenziali, di edilizia scolastica e alle connesse opere di urbanizzazione.

In questa veste la struttura ha operato fino alla cessazione dello stato d'emergenza del 31/08/2012 disposta dall'art. 67bis del DL sviluppo n. 83/2012 convertito nella L. 134/2012.

La struttura con la denominazione "Ufficio Centralizzato Espropri" è stata ricostituita in data 18 gennaio 2013, giusta convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e della Città dell'Aquila e i sindaci del Cratere e della Città dell'Aquila e con le stesse finalità è nuovamente operativa dal 1° giugno 2013.

OBIETTIVI

Gestione delle procedure amministrative finalizzate alla liquidazione delle indennità di esproprio, di occupazione temporanea e ristoro dei danni e delle aree di accoglienza

L'attività si sviluppa su aree determinate attraverso le seguenti operazioni:

1. Individuazione delle particelle con verifica della natura e delle estensioni;
2. Determinazione delle tipologie di intervento: esproprio, occupazione temporanea, Servitù, Acquisizione senza titolo, ristoro danni, collaborazione con

- i preposti uffici comunali, USRA e USRC per il ristoro danni dei campi d'accoglienza;
3. Determinazione delle indennità sulla base delle stime fornite dall'Agenzia del Territorio;
 4. Comunicazione delle indennità agli intestatari catastali mediante plico raccomandato ovvero avviso pubblico;
 5. Richiesta fondi;
 6. Gestione della pratica con la raccolta e la ricerca della documentazione probatoria del diritto dei richiedenti;
 7. Redazione verbale di cessione volontaria;
 8. Redazione determinazione di pagamento delle indennità accettate;
 9. Deposito delle indennità non accettate ovvero derivanti da acquisizioni ex art. 42 bis;
 10. Redazione del decreto di esproprio;
 11. Redazione dell'atto di acquisizione;
 12. Trascrizione del decreto di esproprio definitivo e dell'atto di acquisizione;
 13. Notifica;
 14. Nulla osta allo svincolo delle somme depositate.

SETTORI OPERATIVI

Le procedure inerenti le attività espropriative sono suddivise secondo quattro macroprogetti:

Attività espropriativa su base territoriale (Comune dell'Aquila)

- C.A.S.E.
"Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili" realizzati nel Comune dell'Aquila;
- M.A.P. e M.U.S.P. L'Aquila
"Moduli Abitativi Provvisori" e "Moduli Uso Scolastico Provvisori" realizzati nel Comune dell'Aquila;
- G8
Ampliamento aeroportuale e relativa viabilità di collegamento dell'Aeroporto dei Parchi dell'Aquila;
- Aree di accoglienza del Comune dell'Aquila

Attività espropriativa su base territoriale (Comune del Cratere)


- M.A.P. e M.U.S.P.
"Moduli Abitativi Provvisori" e "Moduli Uso Scolastico Provvisori" realizzati nei Comuni del Cratere;
- Aree di accoglienza dei Comuni del Cratere.


ORGANIGRAMMA


area/settore		mansione	nome
Generale		coordinatore	Pedetta Peccia, Fausto
Segreteria	1	segretaria	Ferrauto, Silvia
	2	segretaria	Riddei, Manuela
MAP Cratere	3	istruttore	Calarco, Francesca
	4	istruttore	De Simone, Sheila
	5	istruttore	Pasta, Paola
	6	istruttore	Tomassi, Ilaria
MAP MUSP L'Aquila	7	istruttore	De Rubeis, Marina
	8	istruttore	Pezzopane, Fabrizio
CASE L'Aquila	9	istruttore	D'Alfonso, Enrica
	10	istruttore	Di Braccio, Marina
	11	istruttore	Di Rocco, Fabio Vincenzo
G8	12	istruttore	Gwozdz, Arianna
Cessioni volontarie, Ricorsi	13	istruttore	Marinaro, Luisa
Attività catastali Ipotecarie	14	istruttore	Pietrucci, Valerio
	15	istruttore	Accili, Pierluigi
Generale		Accertamento del diritto	Massimo, Felice


ATTIVITA'


diagramma di flusso

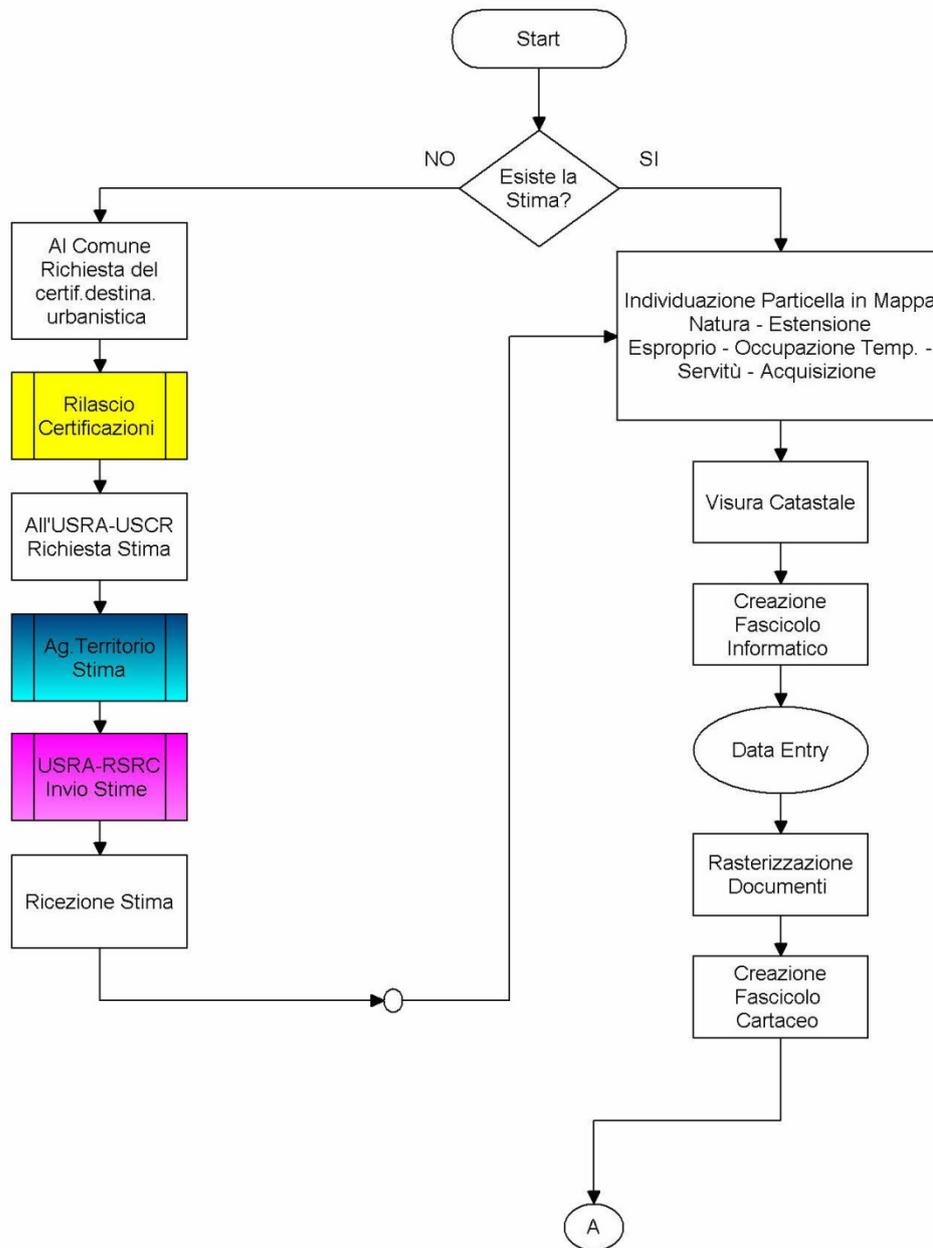


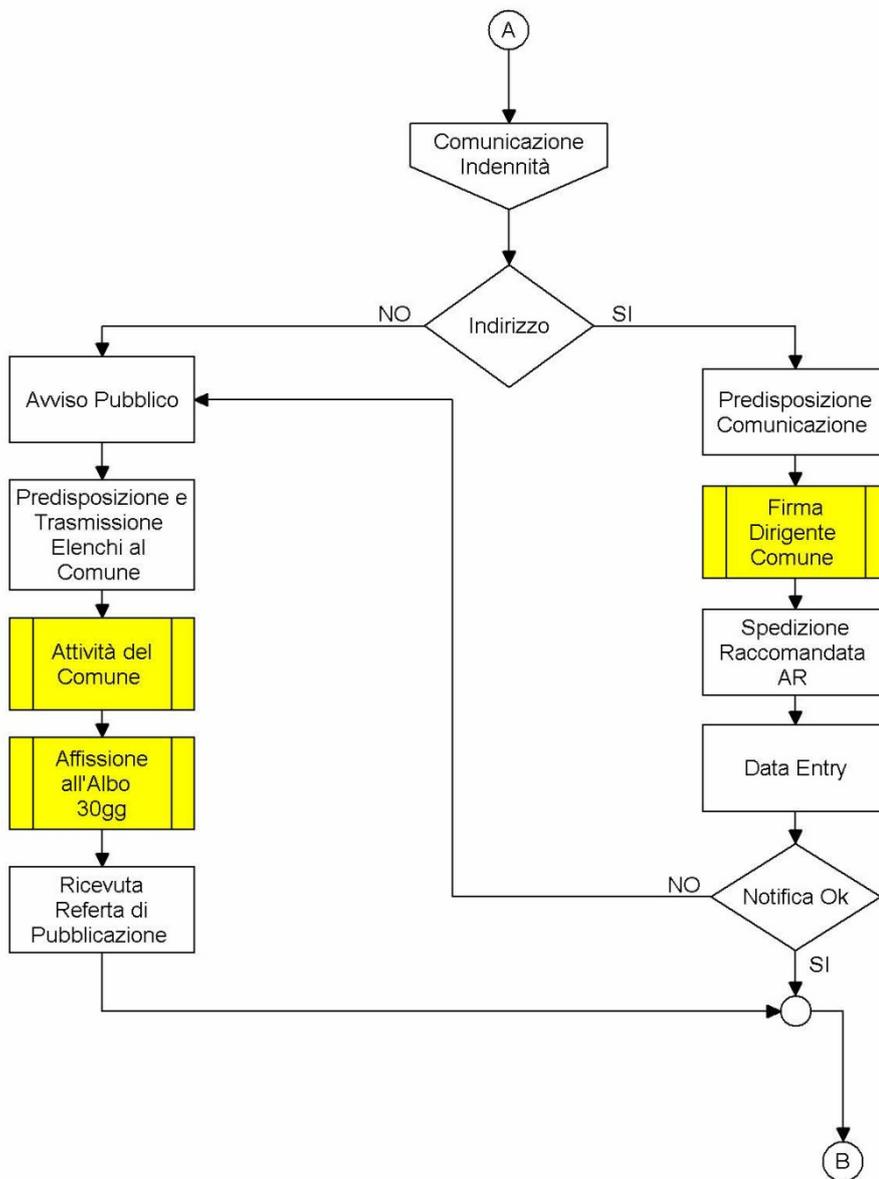






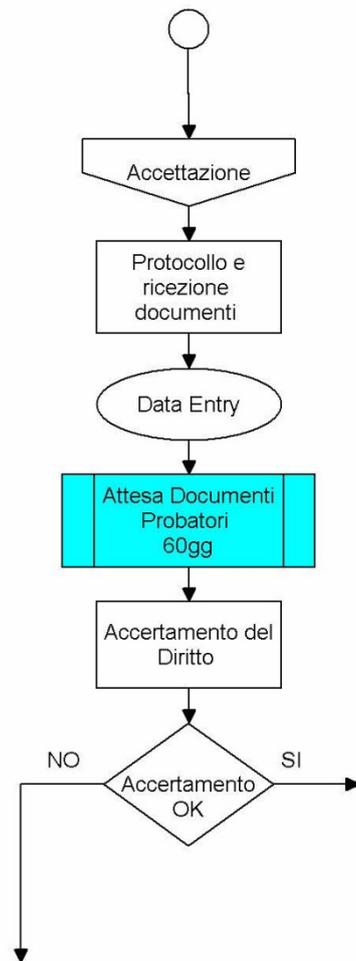

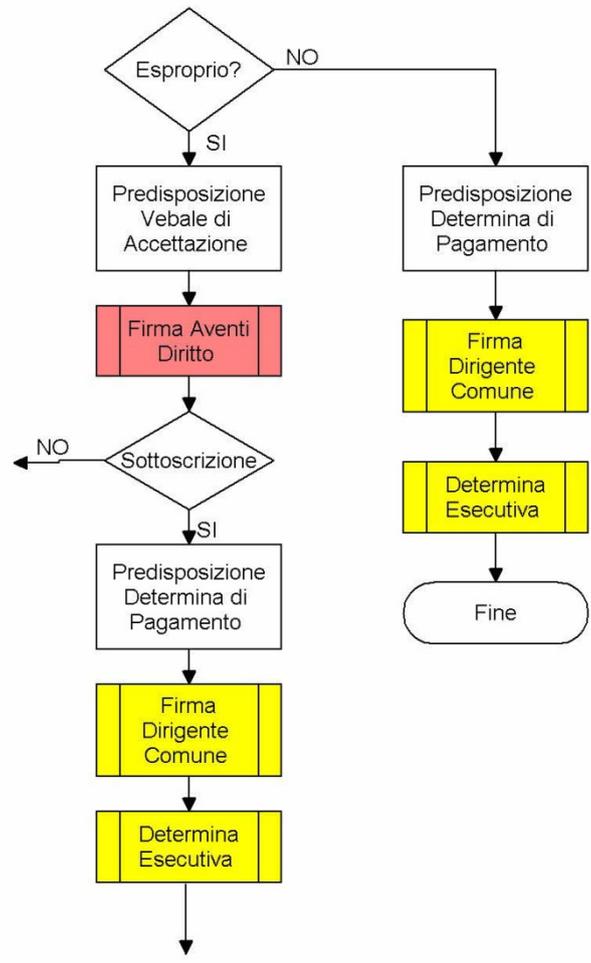

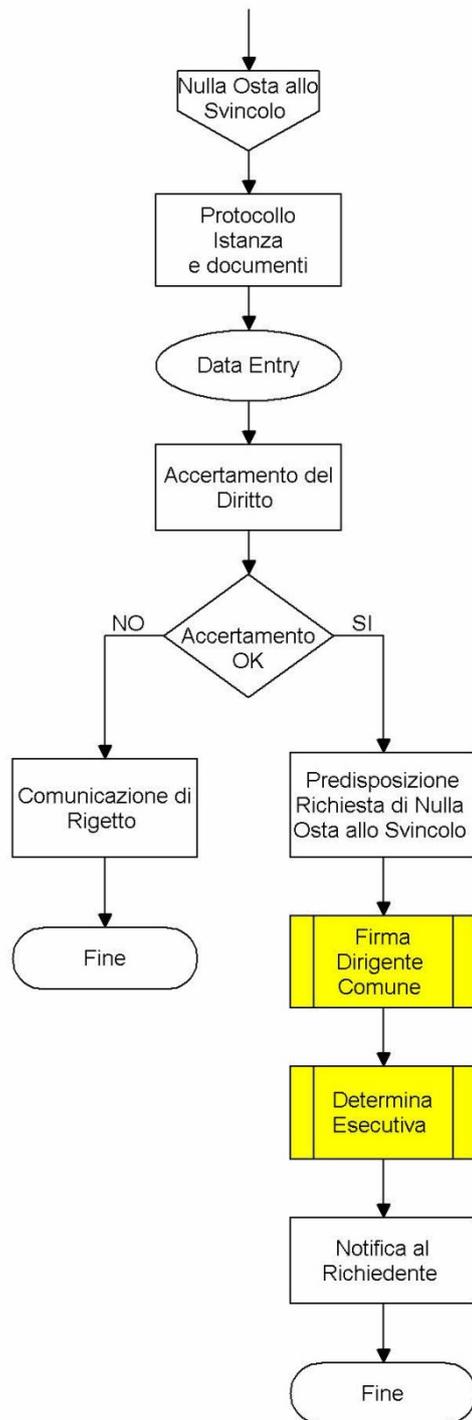

ANALISI DELLE CRITICITÀ CON IL COMUNE DELL'AQUILA

1. Emissione dei decreti di esproprio nel termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità a maggio 2016.

Come segnalato in precedenti colloqui, si evidenzia che le procedure espropriative adottate da questa Struttura subiscono significativi rallentamenti soprattutto nelle fasi relative al perfezionamento dei decreti di esproprio.

Dal diagramma di flusso contraddistinto con la lettera A) si nota che le operazioni che accumulano i maggiori ritardi sono soprattutto quelle relative ai pagamenti delle spese e degli oneri fiscali relativi agli adempimenti connessi al decreto di esproprio (Punti n. 4, 5, 6 e 7 dell'allegato A).

La Ragioneria del Comune dell'Aquila, interpellata in proposito, ha fatto sapere, per le vie brevi, che i modelli F23 per il pagamento dei tributi dovuti (Punto 6 dell'allegato A) vengono inviati alla Tesoreria del Comune presso la Banca BPER sede dell'Aquila la quale restituisce i modelli pagati soltanto dopo 2/3 mesi a causa del trasferimento dei documenti prima ad un centro di Avellino e successivamente ad un altro situato a Sassari.

Tali ritardi, unitamente ai tempi tecnici dell'intera procedura, comportano allungamenti inaccettabili che, ad oggi, rischiano di vanificare il lavoro svolto in quanto i decreti di esproprio predisposti potrebbero non perfezionarsi nel termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità a maggio 2016.

Per cercare di ovviare a tale problema si propongono le modifiche procedurali, sommariamente descritte nel diagramma contraddistinto con la lettera B, di seguito elencate:


- Contemporanea apposizione della firma del dirigente sia sul decreto di esproprio che sulla determina di pagamento delle spese e oneri fiscali;
- Successiva scissione della procedura del decreto di esproprio in due tronconi: il primo a cura della struttura U.C.E. riguardante gli adempimenti della trascrizione, della voltura, della notifica ai proprietari e/o della pubblicazione del decreto sull'Albo Pretorio e della pubblicazione sul BURA, il secondo di esclusiva competenza del Comune relativo al pagamento degli oneri fiscali e alla registrazione all'Agenzia delle Entrate.


Tale soluzione, anticipando la notifica ai proprietari, comporterebbe il vantaggio di rendere i decreti di esproprio pienamente efficaci in tempi più brevi, fermo restando la necessità che il Comune proceda nei termini di legge al pagamento degli oneri fiscali.

È, pertanto, di fondamentale importanza che le modifiche procedurali proposte trovino immediato accoglimento e che venga concordato e predisposto un efficace servizio di ragioneria per il pagamento degli oneri relativi alla registrazione e alla trascrizione dei provvedimenti di esproprio onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste per il ritardo nel pagamento di tali oneri mediante i moduli F23.

Si evidenzia, inoltre, che, nonostante l'adozione delle procedure semplificate sopra esposte, è probabile che, per una parte dei decreti di esproprio non venga emanata entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Si andrebbe, così, a configurare la condizione prevista dalla normativa riguardante gli espropri (DPR 8 giugno 2001 n. 327) di cui all'art. 42-bis - Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico - e conseguentemente andrebbe adottata la procedura di acquisizione dei beni immobili al patrimonio indisponibile del comune.

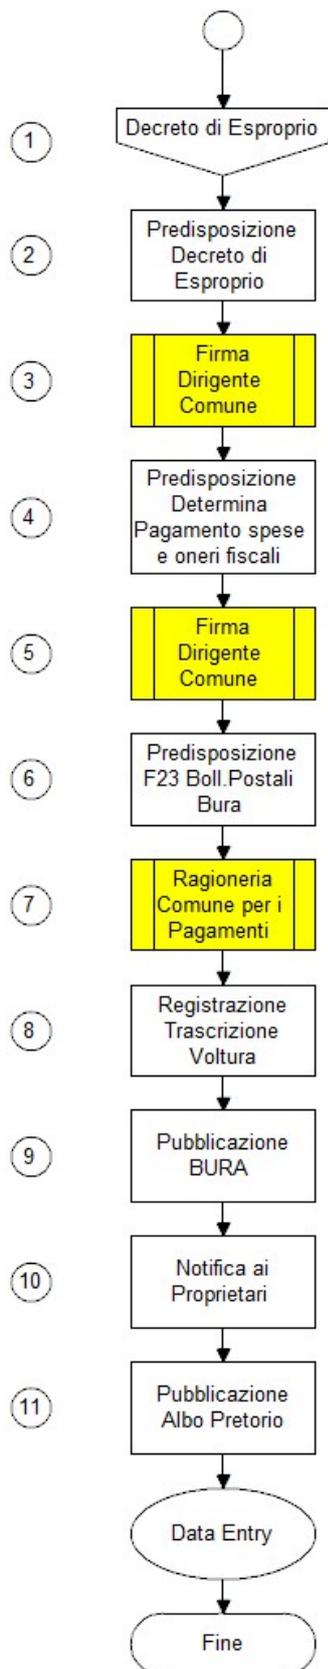

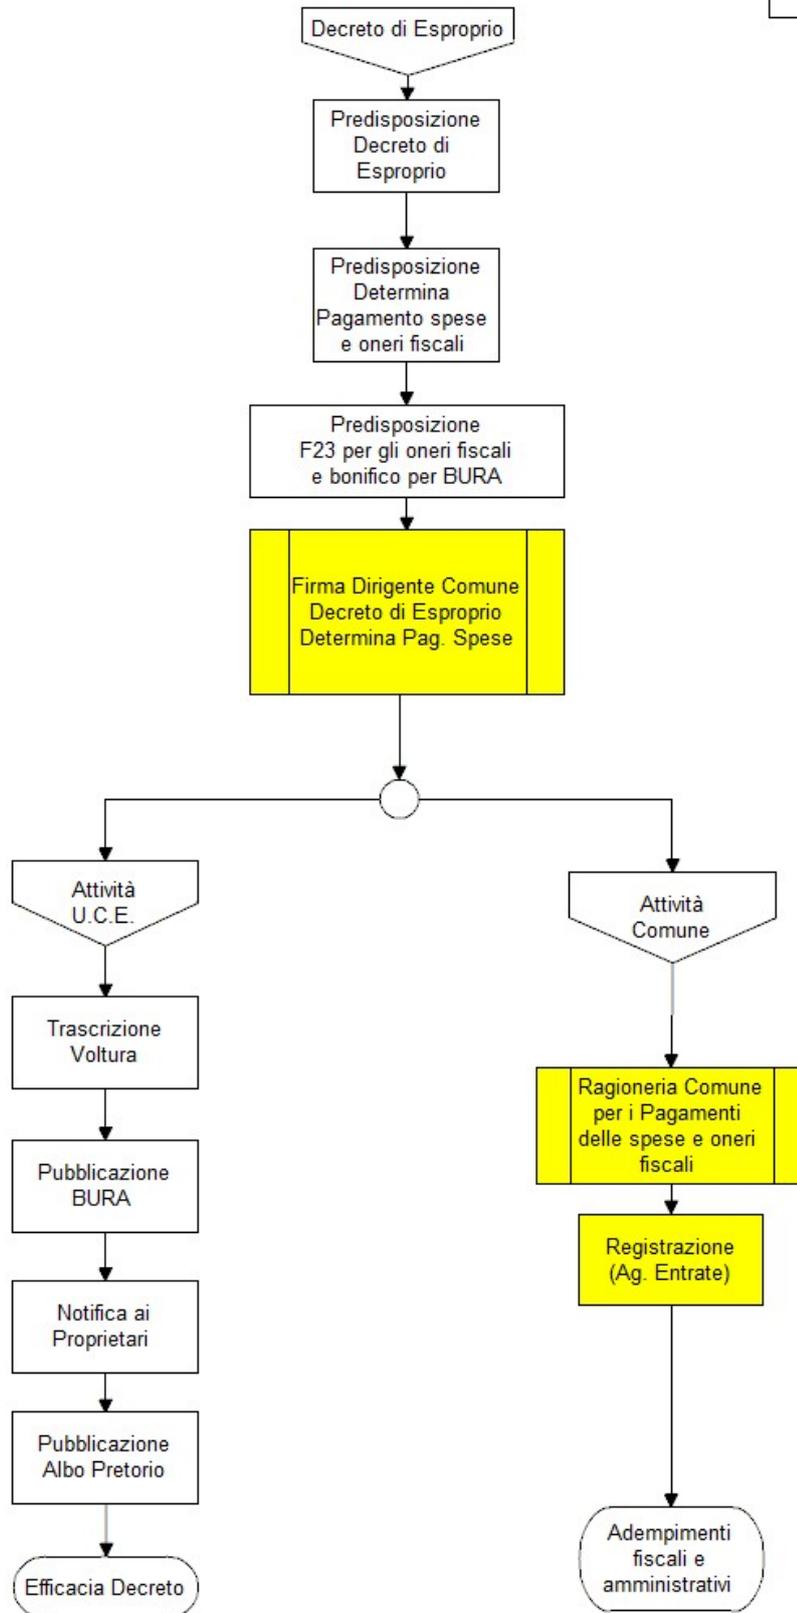

2. Altre problematiche inerenti il completamento delle procedure di esproprio.

Si rileva che alla data odierna continuano a permanere alcuni dei motivi che hanno determinato la richiesta di proroga per il completamento delle procedure espropriative e segnatamente:

- la dimensione territoriale e numerica delle particelle catastali interessate dalle procedure espropriative continua a rivestire carattere di eccezionale quantità e complessità;
- la dispersione sul territorio, a seguito dei noti eventi sismici, degli intestatari delle aree soggette alle attività espropriative rende difficoltose le procedure di notifica, comunicazione e corresponsione delle relative indennità.

ANALISI DELLE CRITICITÀ CON I COMUNI DEL CRATERE

1. Problematiche inerenti il completamento delle procedure di esproprio.

Si rileva che alla data odierna continuano a permanere alcuni dei motivi che hanno determinato la richiesta di proroga per il completamento delle procedure espropriative e segnatamente:

- la dimensione territoriale e numerica delle particelle catastali interessate dalle procedure espropriative continua a rivestire carattere di eccezionale quantità e complessità;
- la dispersione sul territorio, a seguito dei noti eventi sismici, degli intestatari delle aree soggette alle attività espropriative r
- ende difficoltose le procedure di notifica, comunicazione e corresponsione delle relative indennità;
- i comuni non riescono a fornire, nei tempi previsti, le informazioni e le documentazioni necessarie all'espletamento delle procedure espropriative, tanto che ad oggi per alcuni comuni del cratere non si dispone ancora della esatta individuazione delle aree da espropriare e delle stime per il calcolo delle indennità;
- in alcuni comuni le operazioni catastali e di rilievo degli insediamenti M.A.P. e dai M.U.S.P. , interrotte a seguito del D.L. 83/2012 e riprese con l'istituzione degli Uffici Speciali, sono ancora in corso di completamento.

2. Emissione dei decreti di esproprio nel termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità a luglio 2016.

Si porta, inoltre, all'attenzione che a causa delle problematiche sopra riportate, una parte dei decreti di esproprio non verrà emanata entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, diverso per ogni Comune in base alla data di pubblicazione dei decreti che dispongono la localizzazione delle aree da espropriare, la dichiarazione di pubblica utilità nonché l'occupazione d'urgenza.

Si andrebbe, pertanto, a configurare la condizione prevista dalla normativa riguardante gli espropri (DPR 8 giugno 2001 n. 327) di cui all'art. 42-bis - Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico - e conseguentemente andrebbe adottata la procedura di acquisizione dei beni immobili al patrimonio indisponibile del comune.



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

L'Aquila 31 Dicembre 2015

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
AGGIORNATO AL 31/12/2015**

Sommario

TABELLA 1 STIMA RISORSE.....	4
------------------------------	---

ALLEGATI

ALL.1/SINTESI PROGETTO C.A.S.E.

ALL.2/SINTESI MAP L'AQUILA

ALL.3/SINTESI MUSP L'AQUILA

ALL.4/SINTESI COMUNI CRATERE MAP E MUSP

ALL.5/ SINTESI AREA CESSIONI

ALL.6/SINTESI DEPOSITO INERTI

ALL.7/SINTESI G8

Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 31/12/2015

PROGETTI	IMPEGNATI		PREVISTI			
	2013/2014	2015	2015	2016	TOTALE	
CASE	€ 29.700.986,22	€ 3.906.755,20	€ 4.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 35.700.986,22	
MAP AQ	€ 4.443.340,26	€ 2.034.965,21	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 9.443.340,26	
MUSP AQ	€ 5.156.736,61	€ 1.633.304,50	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 7.156.736,61	
CRATERE	ONERI FISCALI	€ 269.098,52	€ 84.625,25	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 1.269.098,52
	ESPROPRI	€ 9.001.880,17	€ 1.765.569,13	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 13.001.880,17
CAVE INERTI	€ 587.644,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 987.644,39	
G8	€ 1.890.111,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.890.111,95	
ACCOGLIENZA/SISTEMAZIONI	€ 544.386,11	€ 403.271,09	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 2.044.386,11	
ONERI FISCALI	€ 1.514.893,37	€ 99.771,21	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.514.893,37	
TOT	€ 53.109.077,60	€ 9.928.261,59	€ 12.400.000,00	€ 9.500.000,00	€ 75.009.077,60	

VARIAZIONI rispetto a Novembre 2015

PROGETTO C.A.S.E.										
AREA	LOCALITA'	A	B	A-B=D+C	C	D	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	FASE 3 (SVINCOLO)	DECRETO DI ESPROPRIO
		P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	DA LAVORARE (TOT-ARCH.)	OCC. TEMP.+ SERVITU	ESPROPRI + ACQUISIZ.	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	
1	S.ANTONIO	140	64	76	12	64	100%	100%	54%	58
2	COLLEBRINCIONI	92	36	56	27	29	100%	91%	5%	0
3	CESE DI PRETURO	160	62	98	28	70	94%	93%	75%	41
4	PAGLIARE DI SASSA	54	20	34	15	19	100%	100%	29%	12
5 - 11	PAGANICA	118	33	85	77	8	12%	12%	100%	1
6	SAN GIACOMO	89	24	65	65	0	23%	23%	0%	0
7	TEMPERA	135	22	113	80	33	98%	97%	11%	10
8	BAZZANO	44	13	31	23	8	100%	100%	89%	5
9	S.ELIA 1	107	50	57	35	22	90%	91%	82%	10
10	S.ELIA 2	34	19	15	12	3	100%	80%	86%	0
12	ROIO PIANO	81	18	63	63	0	100%	100%	5%	0
13	COPPITO NORD	59	18	41	41	0	3%	2%	0%	0
14	SASSA ZONA POL. NSI	26	4	22	8	14	100%	100%	100%	13
15	PAGANICA NORD	57	0	57	57	0	0%	0%	0%	0
16	CAMARDA	318	40	278	44	234	70%	51%	9%	71
17	MONTICCHIO	199	63	136	136	0	47%	46%	19%	0
18	PIANOLA	71	36	35	35	0	50%	0%	0%	0
19	ASSERGI	64	4	60	60	0	100%	100%	0%	0
20	ARISCHIA	198	49	149	93	56	7%	11%	100%	0
21	ROIO POGGIO	58	8	50	6	44	100%	100%	3%	3
22	ROIO 2	77	16	61	27	34	100%	90%	19%	10
23	ASSERGI 2	140	20	120	55	65	33%	33%	0%	16
24	PAGANICA 2	422	92	330	187	143	65%	31%	5%	10
25	GIGNANO	85	31	54	44	10	100%	50%	0%	0
26	COPPITO 2	209	66	143	82	61	100%	90%	26%	13
27	COPPITO 3	456	23	433	335	98	20%	8%	0%	0
TOT.		3493	831	2662	1647	1015				

FASE 1
FASE 2
FASE 3

Notifica indennità C+D
Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

VARIAZIONI rispetto a Novembre 2015

PROGETTO M.A.P. AQ									
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO	NOTE
						STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE		
1	SASSA	2	0	1	1	100%	100%		
2	COLLE DI SASSA	5	0	5	0	100%	0%		
3	POGGIO SANTA MARIA	24	3	8	13	91%	20%		
4	MONTICCHIO	86	5	31	50	52%	0%	0	
5	TEMPERA SAN BIAGIO	2	0	1	1	100%	100%	0	
6	TEMPERA SANT'ANGELO	5	0	2	3	100%	0%	0	
7	ARISCHIA	67	0	46	21	97%	3%	0	
8	CANSATESSA - SAN VITTORINO	89	7	55	27	52%	18%	0	
9	PESCOMAGGIORE	5	0	2	3	100%	100%	3	
10	PIANOLA	42	4	17	21	100%	89%	12	
12	BAGNO	39	0	29	10	100%	58%	1	
13	CIVITA DI BAGNO	2	0	2	0	100%	0%	0	
14	CAMARDA	27	2	5	20	100%	12%	0	
15	FILETTO	10	1	9	0	100%	11%	0	
16	FILETTO 2	14	0	7	7	100%	7%	1	
17	SAN GIACOMO	14	1	6	7	100%	30%	0	
18	COLLEBRINCIONI	42	0	20	22	100%	64%	0	
19	SANTA RUFINA	24	0	10	14	100%	66%	1	
20	COLLE DI ROIO	29	0	15	14	100%	0%	0	
21	ROIO POGGIO	26	0	12	14	4%	0%	0	
22	PRETURO	29	0	3	26	100%	0%	0	
23	BAZZANO	34	1	24	9	97%	84%	2	
24	PAGANICA	13	0	4	9	39%	30%	4	
TOT.		630	24	314	292			24	

PROGETTO M.U.S.P. AQ									
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO	NOTE
						STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE		
1	MUSP 30_13_31_14	20	1	3	16	100%	74%	3	
2	MUSP CANADA	18	7	3	8	100%	100%	8	
3	MUSP IPSIASAR	29	5	7	17	96%	96%	12	
4	MUSP 32_1	9	1	8	0	100%	100%	0	
5	MUSP 49_3	22	0	3	19	100%	100%	16	
6	MUSP 11_2	50	0	18	32	100%	68%	11	
7	MUSP 6_7	9	1	1	7	100%	100%	6	
8	MUSP 2_2	33	21	1	11	100%	17%	0	
9	MUSP 22_4	4	0	2	2	100%	100%	2	
10	MUSP 50_4	2	0	1	1	100%	100%	1	
12	MUSP 52_6	46	40	3	3	100%	100%	0	
13	MUSP 29_12	10	10	0	0	0%	0%	0	
14	MUSP ARISCHIA_DEC	42	0	11	31	100%	7%	1	
15	MUSP CASETTA FANTASIA	2	1	0	1	100%	0%	0	
16	MUSP CAMARDA	7	7	0	0	0%	0%	0	
17	MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	3	3	0	0	0%	0%	0	
18	MUSP ITAS	2	2	0	0	0%	0%	0	
19	MUSP PAGANICA	8	0	3	5	100%	25%	1	
20	MUSP SP4_SP5	30	4	6	20	96%	96%	14	
21	MUSP CONSERVATORIO CASELLA	15	1	7	7	100%	100%	7	
22	MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI	17	3	4	10	100%	100%	10	
23	MUSP 51_5	27	0	13	14	100%	100%	10	
24	MUSP 9_10_58_3_57_2	29	4	6	19	100%	96%	18	
25	MUSP 34_3	5	0	1	4	100%	100%	4	
26	MUSP SP1_SP2	15	0	11	4	100%	80%	1	
27	MUSP VIA FICARA	50	0	1	49	100%	100%	45	
TOT.		504	111	113	280			170	

PROGETTO M.A.P.-M.U.S.P. CRATERE									
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAATE	OCC. TEMP.	ACQUISIZ.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO
							STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	
1	Acciano (AQ)	4	0	0	0	4	0%	0%	0
2	Aielli (AQ)	4	0	0	0	4	100%	0%	0
3	Arsita (TE)	10	0	3	1	6	100%	100%	7
4	Barete (AQ)	21	1	4	1	15	100%	100%	16
5	Barisciano (AQ)	165	0	29	13	123	50%	0%	0
6	Brittoli (PE)	4	0	0	0	4	100%	70%	0
7	Bugnara (AQ)	4	0	1	0	3	100%	100%	3
8	Bussi (PE)	5	0	2	0	3	100%	0%	0
9	Cagnano Amiterno (AQ)	2	0	2	0	0	100%	100%	0
10	Campotosto (AQ)	68	1	24	5	38	0%	0%	0
11	Capestrano (AQ)	9	4	2	0	3	100%	100%	0
12	Caporciano (AQ)	12	1	2	0	9	90%	0%	0
13	Carapelle Calvisio (AQ)	10	0	5	0	5	90%	90%	0
14	Castel di Ieri (AQ)	2	0	1	0	1	100%	100%	1
15	Castelli (TE)	6	0	1	0	5	100%	100%	5
16	Castelvecchio Calvisio (AQ)	3	0	0	0	3	0%	0%	0
17	Castelvecchio Sub.(AQ)	6	0	3	1	2	100%	100%	3
18	Civitella Casanova (PE)	7	5	0	0	2	100%	100%	2
19	Crognaleto (AQ)	10	10	0	0	0	100%	100%	0
20	Cugnoli (PE)	7	4	0	0	3	100%	100%	3
21	Fagnano Alto (AQ)	121	0	0	0	121	0%	0%	0
22	Fontecchio (AQ)	44	1	0	0	43	100%	33%	0
23	Fossa (AQ)	27	19	3	0	5	100%	100%	2
24	Goriano Sicoli (AQ)	2	0	0	0	2	0%	0%	0
25	Isola del Gran Sasso (TE)	4	0	0	0	4	100%	100%	4
26	Lucoli (AQ)	83	2	35	14	32	0%	0%	0
27	Montebello di Bertona (PE)	4	0	0	0	4	100%	100%	4
28	Monte reale (AQ)	34	5	14	0	15	100%	30%	0
29	Montorio al Vomano (TE)	24	5	8	0	11	100%	100%	11
30	Navelli (AQ)	74	8	30	2	34	100%	100%	32
31	Ocre (AQ)	126	0	15	5	106	80%	80%	33
32	Pietracamela (TE)	14	0	0	0	14	0%	0%	0
33	Pizzoli (AQ)	354	19	122	29	184	99%	90%	0
34	Poggio Picenze (AQ)	88	0	0	0	88	0%	0%	0
35	Prata d' Ansidonia (AQ)	70	5	2	0	63	30%	10%	0
36	Rocca di Cambio (AQ)	38	4	14	0	20	100%	50%	0
37	Rocca di Mezzo (AQ)	3	0	0	0	3	50%	30%	0
38	San Benedetto In Perillis (AQ)	40	0	0	0	40	0%	0%	0
39	San Demetrio Né Vestini	81	1	57	0	23	100%	100%	2
40	San Pio delle Camere (AQ)	190	10	19	39	122	90%	0%	0
41	Sant' Eusanio Forconease (AQ)	70	8	26	1	35	90%	30%	0
42	Scoppito (AQ)	41	8	15	6	12	100%	0%	0
43	Secinaro (AQ)	4	0	0	0	4	0%	0%	0
44	Tione degli Abruzzi (AQ)	53	0	0	0	53	0%	0%	0
45	Tornimparte (AQ)	48	0	0	0	48	0%	0%	0
46	Tossicia (TE)	4	0	2	0	2	100%	100%	2
47	Villa S. Angelo (AQ)	179	20	55	2	102	95%	67%	0
48	Vittorito (AQ)	9	1	0	0	8	100%	100%	8
TOT.		2188	142	496	119	1431			138
VARIAZIONI rispetto a Novembre 2015									

Servizio Cessioni Volontarie L'Aquila/Cratere

Pratiche (Mappali)	Mappali Atti pubblici	Verbali Sottoscritti	Mappali con verbali fatti	Progetti di Determina di Pagamento	Determine di Pagamento Esecutive	Progetti di Decreti di Esproprio	Decreti di Esproprio Esecutivi	Verbali da sottoscrivere	Progetti di Determine di pagamento da preparare	Progetti di Decreti di Espropri da preparare
963	42	1604	732	447	447	269	87	263	67	109

Servizio Accertamento del Diritto L'Aquila/Cratere

Accertamenti
1058

Supporto Tecnico/amministrativo Contenzioso USRA/USRC

Ricorsi	Relazioni
40	45

VARIAZIONI rispetto a Novembre 2015

DEPOSITO INERTI											
		A	B	A-B=D+C	C	D		FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	FASE 3 (SVINCOLO)	DECRETO DI ESPROPRIO
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	DA LAVORARE (TOT-ARCH.)	OCC. TEMP.+ SERVITU	ESPROPRI + ACQUISIZ.		STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	
1	INVASO 1	42	0	42	0	42		100%	100%	100%	42
2	INVASO 2	26	0	26	ND	ND		0%	0%	0%	0
3	VIABILITA' DI ACCESSO	53	0	53	ND	ND		0%	0%	0%	0
TOT.		121	0	121	ND	ND					

FASE 1

Notifica indennità C+D

FASE 2

Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D

FASE 3

Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

PROGETTO G8							
					FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	TRASCRIZIONI ACQUISIZIONI
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	ACQUISIZ.	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	
	Preturo	436	60	376	100%	75%	360
TOT.		436	60	376			
