

# LE ATTIVITÀ DI USRC AD OGGI

NOTA INFORMATIVA  
ANNO 2022



# SOMMARIO

## **USRC: PRINCIPALI RISULTATI ANNO 2022**

### **1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE**

### **2. PIANI DI RICOSTRUZIONE**

### **3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE**

3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

3.2 MIC – MODELLO INTEGRATO CRATERE

3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

### **4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE**

### **5. GESTIONE FONDI**

5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

### **6. RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

### **7. EDILIZIA SCOLASTICA**

### **8. TRASPARENZA**

8.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

8.2 WEB-GIS

8.3 CONTRATTI

8.4 ANTICORRUZIONE

### **9. GESTIONE APPALTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

### **10. SVILUPPO DEL TERRITORIO**

10.1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RESTART

10.2 PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR

10.3 PROGETTUALITA' PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

### **11. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE**

11.1 SPESE OBBLIGATORIE

11.2 CO.CO.CO.

11.3 VIDEOSORVEGLIANZA

11.4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'USRC

### **12. EVENTI ISTITUZIONALI, CONVEGNI E RELAZIONI ESTERNE**

# USRC: PRINCIPALI RISULTATI ANNO 2022



Il 2022 ha registrato concreti risultati in ogni settore di attività dell'USRC, con una continua innovazione e digitalizzazione nella gestione dei processi interni ed esterni. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti salienti.

## NUOVE ATTIVITÀ DELL'USRC

La riorganizzazione dell'USRC avviata nel 2021 ha previsto una **nuova macro-struttura**, con un dirigente di Area Tecnica e 6 posizioni organizzative: 2 tecniche per la ricostruzione privata, 1 amministrativa per il patrimonio e il contenzioso, 1 contabile per l'ufficio finanziario, 1 per il personale e l'ultima per i servizi informatici e l'ufficio digitalizzazione. La riorganizzazione e la certificazione del fondo apposto per l'incentivo al personale è servita a garantire una gestione più efficace e performante, che hanno consentito di avviare nuove attività su esigenze manifestate dal territorio:

- La necessità di accelerare la ricostruzione pubblica, con l'introduzione, ai sensi del co. 2-bis, art. 54, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, della possibilità che

l'**USRC** eserciti il ruolo di **oggetto attuttore degli appalti pubblici**, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- La necessità di assicurare il raccordo tra la Cabina di coordinamento integrata, i Soggetti attuatori del programma e gli Enti locali nella attuazione degli interventi finanziati a valere sul **fondo complementare al PNRR di cui al DL 59/2021**;
- La rigenerazione urbana nei centri storici del cratere: ai sensi della L.172/2017 e della **determina** del Titolare dell'USRC n. **1097/2021**, l'USRC, in collaborazione con la Struttura di Missione sisma 2009, ha avviato una importante operazione di sensibilizzazione e ricognizione delle idee progettuali dei 56 comuni del cratere, che porterà l'investimento di ben **300 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana nei borghi**.

Nel seguito si descriveranno queste nuove attività più in dettaglio.

## RISORSE UMANE

Dopo la stabilizzazione delle circa 20 unità con contratto a tempo indeterminato, parte delle quali continuano ad operare per USRC in virtù di una convenzione col Comune dell'Aquila e del Comune di Cugnoli, nel primo semestre 2022 l'USRC ha indetto e svolto un concorso pubblico per 22 figure professionali a tempo determinato,

arrivando alla relativa assunzione nel giugno 2022. Altre risorse sono state reclutate attraverso la stipula di convenzioni che hanno consentito degli scorrimenti di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti.

Durante il 2022 si è provveduto alla liquidazione di tutti gli emolumenti accessori del personale relativi alle annualità dal 2019 al 2022 recuperando di fatto tutto il pregresso non liquidato. Resta da risolvere il problema delle evidenti disparità di trattamento economico tra figure analoghe per mansioni ma con contratti diversi (MIT; RIPAM EELL; Tempi Determinati; Interinali), che determinano disomogeneità che non aiutano una gestione fluida del personale, anche se la certificazione di due fondi per le risorse decentrate a favore di tutte le categorie di personale e la stipula di un unico Contratto Collettivo Integrativo per il personale assegnato all'USRC ha consentito un parziale allineamento.

Il 2022, ormai in un'ottica post-pandemica e per indirizzo del Titolare, ha introdotto nuovi valori nella gestione delle risorse umane di Usrc volti alla promozione del benessere personale e organizzativo. Si è ritenuto, infatti, che alcuni soft benefits come il lavoro agile, la flessibilità oraria e un orientamento al risultato, avrebbero reso sempre più sostenibile, dinamica e di conseguenza più efficace ed efficiente la pratica lavorativa. Per queste ragioni, nel corso del 2022 lo smart working è divenuto strumento ordinario per la gestione del lavoro con lo scopo di bilanciare il lavoro con la vita privata, è stata adottata una nuova circolare organizzativa sulla flessibilità oraria volta a restituire ai lavoratori flessibilità e autonomia, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati e sono in corso di valutazione ulteriori iniziative che puntino all'accrescimento della performance e del benessere organizzativo.

## CONTABILITA' SPECIALE

Dal 2021 l'Ufficio adotta in via sperimentale un nuovo sistema di contabilità unificata per la gestione della C.S. 5731. Nell'ambito di tale progetto e nell'ottica di una profonda revisione delle procedure di gestione delle attività afferenti alla contabilità, agli atti amministrativi e alla conservazione del flusso documentale è stato acquistato un **nuovo software gestionale** che permette l'integrazione di tali procedure garantendo la massima efficienza del sistema informativo e il raggiungimento di sempre più elevati livelli di performance organizzativa.

Nel corso del 2022 viene conclusa la complessa attività di informatizzazione della tenuta della contabilità. L'adozione del recente sistema permette di conoscere esattamente ed in tempo reale la situazione finanziaria, superando anche alcuni dei tipici problemi di gestione delle contabilità speciali quali la rappresentazione dei rendiconti finanziari e la riduzione di elevate giacenze di cassa, perseguendo il più generale principio di **razionalizzazione della spesa pubblica**.

Il nuovo sistema gestionale ha consentito di operare puntuali ricognizioni finanziarie volte all'accertamento di residui passivi ed economie su determinate fonti di finanziamento, utili ai fini della riprogrammazione delle risorse o alla copertura di specifiche e cogenti esigenze finanziarie.

Nell'anno si consolida altresì l'adozione di nuovi processi gestionali relativi principalmente all'adozione degli atti amministrativi e alle modalità di liquidazione e pagamento di spese inerenti agli acquisti di beni/servizi, alle prestazioni professionali e ai trasferimenti agli Enti coinvolti a vario titolo nel processo di ricostruzione.

L'informatizzazione e più in generale la revisione delle procedure di spesa/trasferimento ha

permesso una considerevole riduzione dei tempi di pagamento, garantendo costantemente il rispetto dei tempi previsti dalle norme. E' indicativo in tal senso il dato relativo agli indici di tempestività dei pagamenti che si conferma negativo anche nel 2022 (rappresentativo di pagamenti effettuati prima delle scadenze delle relative fatture).

## DIGITALIZZAZIONE

L'ufficio Digitalizzazione e Progetti Tecnologici ha accolto nel corso dell'anno corrente le indicazioni Agid relative alla Digitalizzazione dei processi, attivandosi, nella seconda metà del 2022, con l'avvio di un'indagine di mercato per la digitalizzazione di tutti gli archivi cartacei e predisponendo la Dichiarazione di Accessibilità del sito web dell'ufficio secondo quanto previsto. A tal proposito sono state effettuate delle modifiche minimali sulla struttura delle informazioni per aumentare l'accessibilità delle informazioni contenute. La digitalizzazione dei processi resta uno degli obiettivi per l'annualità 2023 su cui si dovrà concentrare l'ufficio Digitalizzazione con il fattivo supporto degli altri uffici.

Sempre nella seconda metà dell'anno 2022, sono state consolidate tutte le pratiche avviate nel primo semestre portando a maturità quanto rilasciato in ambito digitalizzazione. L'ingresso di nuovi dipendenti è stato agevolato con servizi puntuali sin dal primo giorno e la fruibilità di sessioni registrate dove ogni ufficio ha illustrato ed approfondito le caratteristiche dell'USRC e dei relativi compiti.

Lo sportello digitale è stato ampliato con l'integrazione del processo "short list" che ha permesso sia all'ufficio sia ai tecnici esterni interessati di avere un'unica piattaforma centralizzata per l'invio della documentazione ed il monitoraggio delle singole attività.

E' stato avviato lo sviluppo di una nuova piattaforma per centralizzare ed efficientare la gestione delle richieste di contributo (pratiche), le richieste di avanzamento dei lavori (SAL) e l'erogazione dei fondi verso i comuni. Questo lavoro diventerà effettivo ad inizio 2023.

Sono stati avviati studi di fattibilità per il potenziamento e miglioramento del sistema di videosorveglianza e per l'efficientamento energetico della sala server dell'USRC. Infine è stata avviata una collaborazione con l'Università degli Studi di L'Aquila per l'ottimizzazione del sistema georeferenziato della ricostruzione del cratere e fuori cratere.

In questo periodo di transizione l'Ufficio Digitalizzazione e Progetti Tecnologici, formalizzato nel mese di Settembre 2022, ha preso consistenza ed una sua struttura. Gli studi di fattibilità realizzati hanno creato i presupposti per la realizzazione degli obiettivi digitali del 2023.

## RICOSTRUZIONE PRIVATA

Questi alcuni dei **principali risultati raggiunti nel 2022** (dati relativi a comuni del Cratere e Fuori Cratere):

- **426 ulteriori istruttorie avviate** in totale dall'USRC e dai suoi Sportelli su progetti di riparazione con miglioramento sismico di aggregati/edifici ricadenti nel Cratere, relative a 3400 immobili;
- **634 pratiche** ricadenti nel Cratere **con cantiere in corso**;
- **201 con cantieri in corso nei comuni Fuori Cratere**;
- **83 pratiche** ricadenti nel Cratere **con lavori avviati** nel 2022 relativi a circa 784 immobili per un valore di **89 Mln €**;

- **6 pratiche con lavori avviati nel 2022 Fuori Cratere;**
- **lavori conclusi per 854 immobili** nel Cratere;
- **lavori conclusi per 184 immobili** nei comuni Fuori Cratere.

Relativamente alla ricostruzione dei comuni colpiti anche dagli eventi del sisma Centro Italia, dopo una prima fase di rallentamento dovuto alla assenza di una normativa speciale per la quantificazione dei danni aggiuntivi, grazie all'introduzione e completa attuazione del Decreto USRC n. 6 pubblicato nel mese di maggio 2020 i comuni colpiti dai due eventi sismici del 2009 e del 2016 sono tra quelli maggiormente attivi in termini istruttori e di ammissioni a contributo. Le ammissioni dal 01/01/2022 al 15/12/2022 per le aree 2 e 3, ammontano infatti a 38 milioni di euro.

A partire da aprile 2021 e ogni bimestre, l'USRC pubblica un report sintetico inviato ai comuni del Cratere, anche le immagini di cantieri in partenza e con lavori appena conclusi, al fine di dare diffusione degli esiti della ricostruzione nei centri storici.

#### MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

Al fine di **accelerare e semplificare le verifiche amministrative** sulle richieste di contributo per gli immobili privati danneggiati dal sisma, l'Ufficio ha ritenuto opportuno chiarire, con specifica **circolare 15 del 27/06/2022**, la valenza delle informazioni desumibili dal catasto e la rilevanza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte dai proprietari degli immobili al fine di attestarne legittimità e destinazioni d'uso.

In particolare, la circolare introdotta chiarisce che ai fini della concessione dei contributi le autocertificazioni prodotte secondo i modelli

standard non devono essere necessariamente corredate di documentazione comprovante la veridicità delle stesse, essendo le dichiarazioni stesse sufficienti ai fini delle verifiche di competenza. Vengono evidenziati altresì i casi nei quali si rende necessario un allineamento del catasto prima della concessione del contributo e quelli nei quali invece è possibile procedere al termine dei lavori.

La successiva **circolare 16 del 07/12/2022**, ha introdotto nuove procedure per semplificare le istruttorie dei SAL, che, per i SAL tecnici, SAL intermedi e SAL Finali non estratti, si baseranno sulle dichiarazioni rese da parte dei soggetti che ordinariamente assumono le responsabilità in riferimento alle procedure di liquidazione del contributo (ovvero Direttore Lavori, Presidente, Commissario incaricato...). La presentazione delle istanze liquidazione sarà agevolata attraverso una modulistica semplificata che anticipa le procedure che presto saranno "automatizzate" con la messa online della nuova versione dello sportello digitale.

Particolare attenzione è stata posta nella liquidazione dello Stato Finale dei Lavori non estratto: l'USRC provvederà ad istruire le istanze di liquidazione e a trasmettere il nulla osta al pagamento al Comune **anche in assenza della Segnalazione Certificata di Agibilità**, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori circa il ricorrere dei presupposti tecnici propedeutici all'agibilità. Il Comune territorialmente competente provvederà alla liquidazione del SAL comprensivo della quota lavori, dell'IVA, delle competenze tecniche con esclusione delle spettanze relative al Presidente del Consorzio/Commissario/Rappresentante Parti Comuni/Procuratore Speciale, la cui liquidazione sarà disposta solo a seguito della chiusura del procedimento urbanistico attraverso l'acquisizione della Segnalazione Certificata di Agibilità. Viene infine introdotta la possibilità di

formulare istanza di liquidazione del **SAL tecnico** (per le spese effettivamente sostenute ovvero indagini, spese tecniche per progettazione e relazione geologica, acconto per il presidente o commissario) successivamente al provvedimento di ammissione da parte di USRC e nelle more della predisposizione del decreto di concessione da parte del Comune.

## ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE

Con atto congiunto dei due Uffici Speciali, Decreto congiunto USRA/USRC n. 2 del 21/10/2020, è stato disciplinato il riconoscimento dell'adeguamento del prezzo unitario delle lavorazioni per gli interventi di ricostruzione privata ubicati sia nei centri storici dei comuni del cratere che al di fuori di essi.

La norma, in applicazione delle previsioni dell'art. 17 comma 7 del decreto-legge n. 115 del 2022 convertito in legge 142 del 2022, definisce le finalità, l'ambito di applicazione e le modalità di applicazione della disciplina generale per la rimodulazione dei contributi nella misura massima del 20%.

Le procedure attuative sono state disciplinate con 2 distinti avvisi: il primo relativo alla casistica delle pratiche in corso di istruttoria e il secondo relativo alle pratiche già ammesse a contributo. Complessivamente sono pervenute **451 istanze di adeguamento del contributo**, di cui 340 per le pratiche in istruttoria e 111 per le pratiche già ammesse a contributo (40 senza inizio lavori e 71 con inizio lavori).

A distanza di meno di un mese dalla definizione delle modalità con le quali presentare la richiesta di adeguamento contributo per la ricostruzione post sisma, ovvero l'indicizzazione del 20%, si sono concretizzate le ammissioni dei primi contributi indicizzati. Sono state infatti

ammesse **10 istanze** di contributo per la ricostruzione privata per un importo complessivo di circa **12 milioni di euro**. Le pratiche, ricadenti nei comuni di Scoppito, Popoli, Arsita, Montorio al Vomano, Barisciano, Castel di Ieri, Goriano Sicoli e Tossicia, sono state aggiornate dai progettisti incaricati con l'applicazione dell'ultimo aggiornamento infra annuale del prezzario regionale Abruzzo.

## SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE 2022

Il 30 settembre 2022 è decorso il termine per la presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata all'interno dei centri storici dei comuni del cratere. Complessivamente sono state presentate **1.200 nuove domande di contributo**, 400 delle quali già caricate con la documentazione progettuale sullo Sportello Digitale USRC. Le rimanenti 800 domande depositate entro il termine presso i comuni territorialmente competenti, dovranno essere caricate sullo sportello digitale USRC, complete della documentazione minima da check list, entro il 31/03/2023 ai fini delle verifiche istruttorie.

## APPALTI PUBBLICI

L'**USRC** dall'**estate 2021**, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, **può esercitare il ruolo di soggetto attuatore degli appalti pubblici**, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Ufficio ha sottoscritto convenzioni per la gestione di **15 procedure di gara** in qualità di stazione appaltante. Alla convenzione sottoscritta di recente con il Segretariato

Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo per la progettazione e l'esecuzione di lavori di recupero di **10 chiese danneggiate** dagli eventi sismici e dislocate sul territorio abruzzese per un importo complessivo pari a circa 10 milioni di euro, ha fatto seguito l'accordo con la Prefettura de L'Aquila e la Soprintendenza per i beni culturali dell'Aquila per un ulteriore intervento a valere sui fondi per l'edilizia di culto (F.E.C.) del valore di euro 1,5 milioni.

Nel dicembre 2021 l'USRC è stato inoltre individuato quale soggetto attuatore per il recupero e la valorizzazione di **4 Cammini storici per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro** nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR, interventi già in fase attuativa.

Sono attualmente in via di finalizzazione diverse convenzioni con comuni del cratere che porteranno nelle prossime settimane all'individuazione dell'USRC quale soggetto attuatore o stazione appaltante per ulteriori 9 interventi afferenti al campo della rigenerazione urbana, della messa in sicurezza di territori colpiti da dissesto idrogeologico, del recupero del patrimonio pubblico e scolastico di valore complessivo di circa 8 milioni di euro.

Le funzioni delegate in materia di appalti pubblici di lavori coinvolgono complessivamente **39 dipendenti** incaricati delle diverse attività tecniche da svolgere di cui **19** nominati formalmente RUP ai sensi del D.lgs n. 50 del 2016.

## EDILIZIA SCOLASTICA

Nel corso del 2022 sono state trasferite risorse per **€ 8.712.176,14** € ed assegnate risorse per **€ 13.334.537,19** per l'attuazione degli interventi in corso.

Nel corso del 2022 è stata condotta un'attività istruttoria in sinergia con la Struttura di Missione, volta a completare la programmazione della seconda annualità per interventi di edilizia scolastica, parzialmente finalizzata con la deliberazione CIPE 72/2020: l'ulteriore proposta da portare in CIPESS prevede il finanziamento di **6 interventi su altrettanti comuni**, in parte volti al completamento di opere già avviate e in parte per nuovi progetti per un costo complessivo di **ca. 16 milioni di euro**.

Nel **2022** sono stati conclusi **6 interventi** per oltre **13 Mln €**, per una popolazione studentesca di oltre 1600 alunni:

- Comune di Avezzano: istituto comprensivo di via Puglie, € 7.200.000,00
- Comune di Castilenti: Scuola Media, € 878.388,00
- Comune di Scafa: Scuola Media, € 1.306.171,36
- Comune di Sulmona: Scuola Media Serafini, € 2.905.716,36
- Comune di Lecce nei Marsi: Scuola Materna, € 460.000,00
- Comune di Popoli: Complesso Paolini Ala Ovest, € 350.000,00

## SVILUPPO DEL TERRITORIO

Nell'ambito del **Programma di Sviluppo RESTART**, dopo l'approvazione, nel 2020, del primo PIT - Progetto Integrato per il Turismo (Area Omogenea 4, "*Terre della Baronìa*", per un importo di € 5.353.716,39), a far data dal 2021 l'USRC ha affiancato la Struttura di Missione nell'istruttoria dei **PIT - Progetti Integrati per il Turismo** proposti dalle Aree Omogenee del Cratere 2009, portando a definizione la proposta progettuale dei PIT dell'Area Omogenea n.5, "*Terre della Pescara*", per un importo di 7.647.733,78 €, e dell'Area Omogenea n.6,

“Altopiano d’Abruzzo: un museo all’aperto”, per un importo di 9.474.771,15 €. Nel corso dell’anno 2022 l’USRC ha effettuato il **trasferimento di risorse** a favore delle Amministrazioni titolari degli interventi RESTART nei 56 Comuni del Cratere per € **839.455,95** (Comune di Pizzoli).

Dal settembre 2021 l’Ufficio sta lavorando congiuntamente alla Struttura di Missione, al Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ed ai Comuni del Cratere sul **Programma unitario di “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”**, che ha una dotazione di complessivi 1,78 miliardi € a valere sulle risorse del **Fondo complementare al PNRR**. Alla data del **30 giugno 2022**, in linea con la **milestone** stabilita dal DM MEF 15/7/2021, nei 56 Comuni del Cratere 2009 sono state approvate, dai Responsabili degli interventi, le progettazioni da porre a base della gara di appalto di **274 interventi** riguardanti la rigenerazione urbana, le strade, gli impianti sportivi e la rifunzionalizzazione di edifici pubblici, finanziati a valere sulle **Linee di intervento A2.1, A3.1, A3.3 e A4.5** della **Misura A** del Programma, per un importo complessivo di oltre **123 Mln€**. L’Ufficio ha inoltre curato la ricognizione delle modalità di attuazione assunte dagli Enti responsabili degli interventi per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, ai sensi del DL Aiuti e del DL Aiuti-ter, finalizzata all’assegnazione, con Ordinanza n. 40/2022 e Decreto MEF 18/11/2022, delle **risorse aggiuntive** rispetto all’importo degli interventi approvato con le Ordinanze di dicembre 2021. L’USRC ha provveduto al **trasferimento** a favore di 46 Enti responsabili degli interventi delle **risorse in anticipazione**, pari al **30%** dell’importo finanziato, per un importo complessivo pari a **23,45 Mln€**. L’Ufficio ha inoltre effettuato il monitoraggio della **milestone** del 31 dicembre 2022, termine stabilito dal DM MEF 15/7/2021 per

l’aggiudicazione e l’avvio dei lavori o delle prestazioni oggetto d’appalto da parte degli Enti responsabili degli interventi.

## **RIGENERAZIONE URBANA - PICC Piano di Interventi Connessi e Complementari**

Il 31 maggio 2022 è scaduto il termine per la presentazione da parte dei comuni delle schede volte a richiedere i finanziamenti per opere rientranti nell’ambito dei Piani di Interventi Connessi e Complementari agli Interventi di ricostruzione Pubblica e Privata:

- Interventi su spazi pubblici
- Interventi su reti di infrastrutture e servizi
- Interventi su dissesti idrogeologici e messa in sicurezza di cavità antropiche rese instabili dal sisma

Sono state complessivamente prodotte **220 schede** da **53 Comuni** per circa **330 milioni di euro**. In sinergia con la Struttura di Missione, è stata effettuata una prima istruttoria sul materiale fornito dai comuni, al fine di valutarne i contenuti e la corrispondenza ai criteri di finanziamento. Le richieste sono state riscontrate da 17 comuni per 55 interventi in totale per un importo complessivo di 88 milioni di euro.

Tali interventi sono volti a dare completa attuazione al processo di ricostruzione che dopo la conclusione degli interventi di ricostruzione privata, e il completo ripristino della funzionalità degli Uffici e dei servizi pubblici, troverà il suo pieno compimento con la riqualificazione dei centri storici, delle reti, delle strade e degli spazi pubblici, messi a dura prova con anni di cantieri.

Al fine di supportare al meglio le amministrazioni comunali impegnate in questo processo, l’USRC sta collaborando in stretta sinergia con l’Università dell’Aquila, per elaborare

una linea guida per la progettazione degli interventi che indirizzi i tecnici nell'applicazione delle migliori tecnologie in maniera compatibile con la realtà dei centri storici.

Con il supporto di un esperto è stato avviato lo sviluppo di azioni partecipate nella realizzazione degli interventi programmati dai comuni.

**L'avanzamento della ricostruzione al 15 dicembre 2022** nei Comuni del Cratere e fuori Cratere è sinteticamente rappresentato dagli indici che seguono:

Ambito		Numero comuni	Avanzamento	Fabbisogno finanziario residuo
Ricostruzione privata	<b>Comuni Cratere* AO 2-3 (2009-2016)</b>	16	<b>28%</b>	2,2 Mld€
	<b>Comuni Cratere* AO 4-5-6-7-8-9</b>	40	<b>56%</b>	
	<b>Comuni fuori Cratere**</b>	114	<b>51%</b>	0,20 Mld€
Ricostruzione pubblica***	<b>Cratere e fuori Cratere 2009</b>	70	<b>37%</b>	0,46 Mld€
Ricostruzione scuole***	<b>Cratere e fuori Cratere 2009</b>	98	<b>54%</b>	0,13 Mld€

\* L'indice di avanzamento della ricostruzione privata crateri è misurato rispetto ai fabbisogni finanziari stimati, distinto tra AO2-3 e restanti AO; rispetto all'importo delle richieste di contributo effettivamente presentate l'indice per tutte le AO è pari al 72% avendo escluso le già chiuse senza ammissione.

\*\* Avanzamento calcolato come rapporto tra l'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate rispetto all'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

\*\*\* Avanzamento calcolato come rapporto tra l'importo degli interventi in corso/conclusi e l'importo già finanziato. Il fabbisogno finanziario residuo stimato tiene conto degli interventi ancora da programmare attraverso programmi pluriennali e piani annuali ai sensi della L. 125/2015, art.11, co.9.

# 1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE



La Legge 7 agosto 2012, n.134 (cosiddetta “Legge Barca”), artt. 67-bis e 67-ter, ha disposto la cessazione al 31 agosto 2012 dello stato di emergenza successivo al sisma del 6 aprile 2009 ed ha istituito l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, **USRC**), con sede a Fossa (AQ), per le finalità attinenti alla **gestione ordinaria della ricostruzione**, sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, nei territori dei Comuni del Cratere, ad esclusione di L’Aquila, e dei Comuni fuori Cratere (cfr. L.125/2015, art.11, co.13).

L’Intesa<sup>1</sup> dell’agosto 2012, ha disciplinato gli aspetti organizzativi e le competenze istituzionali dell’Ufficio.

La Legge 7 agosto 2012, n.134, ha assegnato all’USRC, tra l’altro, il coordinamento degli otto Uffici territoriali per la ricostruzione (di seguito, UTR), costituiti ai sensi dell’OPCM n.4013 del

2012 dai Comuni di ciascuna Area Omogenea per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati.

Dal 1° luglio 2018 gli UTR sono stati soppressi e le relative competenze sono state trasferite all’USRC (co.32, art.2-bis, L. n.172/2017). Da allora, il Titolare dell’USRC ha in capo la direzione ed il coordinamento esclusivi del personale in servizio presso gli UTR, assegnato anch’esso all’USRC (co.3, art.22, L.55/2019), nonché la gestione del processo di soppressione di detti Uffici attraverso specifici provvedimenti organizzativi e gestionali. In una fase transitoria, sono stati costituiti, tramite convenzioni con i Comuni, 8 Sportelli Decentrati dell’USRC (di seguito, SP) presso le medesime sedi dei soppressi UTR.

A partire dal 2019, la **riorganizzazione** ha avuto maggiore impulso con la soppressione di 4 degli 8 Sportelli Decentrati ed il trasferimento del relativo personale presso la sede dell’USRC a Fossa (AQ). Contestualmente, nell’anno 2019 è stato posto in essere l’accentramento delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, la cui gestione è transitata dai soppressi UTR all’USRC.

In esito all’evoluzione normativa sopra descritta, l’USRC, oltre al **coordinamento del processo di ricostruzione privata**, condotto sin dall’avvio dell’Ufficio nel 2013, ha oggi in capo direttamente anche l’istruttoria tecnico-amministrativa delle **richieste di contributo** per la ricostruzione privata.

---

<sup>1</sup> Intesa sottoscritta ai sensi dell’ art. 67-ter della Legge 7 agosto 2012, n.134.

La competenza per l'istruttoria dei contributi alla ricostruzione privata va ad aggiungersi alle altre competenze assegnate all'Ufficio sin dalla sua istituzione. L'USRC, infatti, cura la programmazione ed istruttoria tecnica degli interventi di **ricostruzione pubblica** e del **Piano "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza"**, cura l'attuazione dei **Piani di Ricostruzione** (dei quali ha effettuato l'istruttoria nel profilo di congruità economica), cura l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, gestisce la **contabilità speciale**, effettua il **monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi**, cura la trasmissione periodica dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, effettua la gestione delle assegnazioni e dei trasferimenti dei fondi per la ricostruzione privata, promuovere l'attrattività e lo **sviluppo economico e sociale del territorio del cratere**.

L'USRC è inoltre competente anche per la ricostruzione dei **Comuni fuori Cratere** (cfr. L. 71/2013, art.7, co.6; L.125/2015, art.11, co.13) per ciò che attiene alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata ed ai trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione; il 30/9/2021 è scaduto il termine per la consegna delle richieste di contributo

fuori cratere. Ciò consentirà ragionevolmente di concludere la ricostruzione privata fuori Cratere nei prossimi 2/3 anni.

Dal 2020 l'attività istruttoria per la ricostruzione privata ha avuto una fase di **significativa crescita ed ottimizzazione di processo**, con l'evasione di più della metà delle pratiche giacenti in attesa di istruttoria. Le misure organizzative adottate per far fronte all'emergenza pandemica da COVID-19, con la conduzione delle attività lavorative in smart working a far data da marzo 2020, hanno assicurato la continuità dell'azione amministrativa, il servizio all'utenza e la conclusione dei procedimenti con documentazione completa

Al contempo, è stata potenziata la **digitalizzazione** delle procedure e degli strumenti di gestione documentale interna ed esterna, nell'obiettivo di realizzare nel breve termine un'amministrazione "full digital" con la totale dematerializzazione degli atti.

Dal 2022 l'USRC ha assunto ulteriori competenze anche nell'ambito del Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, finanziato ai sensi del DL 59/2021 a valere sulle risorse del **Fondo complementare al PNRR**, relativamente all'**attuazione degli interventi** a responsabilità dei Comuni del Cratere sisma 2009 diversi da L'Aquila.


## 2. PIANI DI RICOSTRUZIONE

La **Legge n. 77 del 24 giugno 2009**, di conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, all'art.14, co.5-bis, ha previsto che la ricostruzione dei centri storici dei Comuni del cratere avvenga previa predisposizione dei Piani di Ricostruzione, i cui obiettivi, contenuti e procedura di approvazione sono definiti dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010.

Dei 56 Comuni del Cratere, **55 Comuni hanno predisposto il PdR** e sono pervenuti alla conclusione dell'iter di approvazione. Di questi:

- **11 Comuni** hanno raggiunto l'Intesa sul PdR tra Sindaco, Presidente della Provincia e Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, nel corso dello stato di emergenza;
- **44 Comuni** (2 dei quali, Barete e Barisciano, con riferimento agli Ambiti non oggetto di Intesa nella fase emergenziale) hanno ottenuto l'attestazione della congruità economica del PdR con Nulla osta dell'USRC, nella gestione ordinaria.

L'USRC ha stimato le risorse residue occorrenti per la ricostruzione del centro storico di **1 Comune**, Torre de' Passeri, unico nel Cratere a non aver predisposto il PdR, non avendo raggiunto nel corso dello stato di emergenza l'Intesa sulla Perimetrazione del centro storico (art.3, DCD 3/2010).

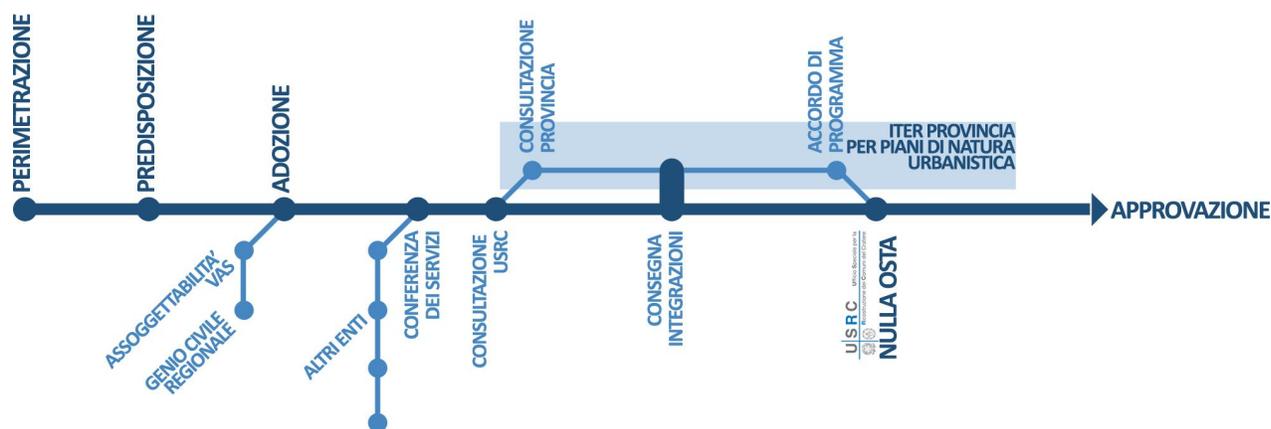



La **Legge n. 134 del 7 agosto 2012**, all'art. 67-quinquies, ha attribuito al Piano di Ricostruzione **natura strategica** come tale, è finalizzato a quantificare le esigenze finanziarie per la ricostruzione e a disciplinare le modalità di attuazione ed il cronoprogramma degli interventi di ricostruzione del centro storico – ovvero, se asseverato dalla Provincia, anche **urbanistica**, qualora abbia contenuti urbanistici che aggiornano, modificano, integrano o sostituiscono gli strumenti di pianificazione vigenti.

Dei Piani di Ricostruzione approvati dai **55 Comuni del Cratere**, **8** hanno **natura strategica**, mentre **47** hanno natura anche **urbanistica**.

A conclusione del processo di pianificazione, il quadro programmatico delle risorse necessarie per la ricostruzione dei centri storici dei 56 Comuni del Cratere ammonta a complessivi **3,4 Mld €**, di cui **3,1 Mld €** per interventi di **ricostruzione privata** e **0,3 Mld €** per interventi di **ricostruzione pubblica**.


### 3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE

#### TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Con la scadenza per la presentazione delle domande per la riparazione ai danni, di cui all'art.17, comma 1, del DL183/2020, rispettivamente del:

- 30/09/2021 per i comuni fuori cratere e per il fuori centro storico dei comuni del cratere;
- 30/09/2022 per il centro storico dei comuni del cratere;

sono state presentate un numero ragguardevole di pratiche che per importi e numero superano di circa 6 volte superiore la media annua dei precedenti 5 anni (rispettivamente del Cratere e del Fuori cratere).

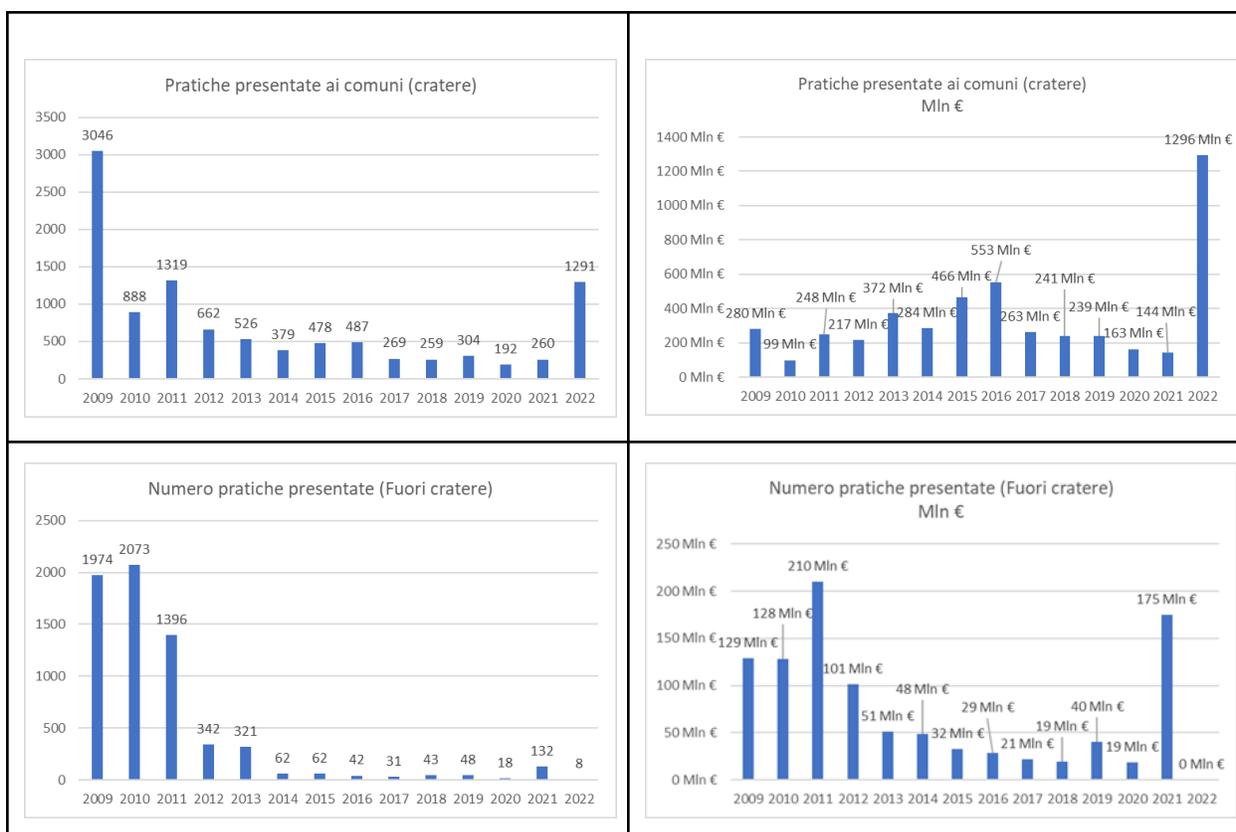


Delle circa 1300 pratiche presentate presso i comuni con la scadenza del 30/09/2022 solo un numero pari a circa 400 è stato effettivamente presentato presso l'USRC mentre le restanti 800 saranno perfezionate, nella documentazione a corredo della domanda, entro il termine del 31/03/2023.

### 3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere è stimato un fabbisogno finanziario complessivo pari a **4,75 Mld €**, così articolati:

- **4,1 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati nei centri storici (dei quali **3,1 Mld €** all'interno degli Ambiti dei Piani di Ricostruzione e **1,0 Mld €** all'esterno);
- **0,4 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati fuori dai centri storici ("periferie");
- **0,25 Mld €** necessari alla copertura dei maggiori costi dovuti all'aggravamento del danno causato dal sisma 2016, a valere sulle risorse della contabilità del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Centro Italia (art.4, D.L. 189/2016).



Dal **2009 ad oggi**, nei 56 Comuni del Cratere sono stati ammessi contributi agli interventi di ricostruzione privata per un importo complessivo pari a **2,25 Mld €** (dato periferia + centro storico, esclusi gli importi dei contributi ad interventi su edifici con esito di agibilità A), pari al **48%** del fabbisogno finanziario previsto, distribuiti nel tempo come da grafico che segue (dato al 15/12/2022 con monitoraggio al 31/08/2022). Nel solo anno 2022, sono stati ammessi contributi per un importo pari a **180 Mln €**.

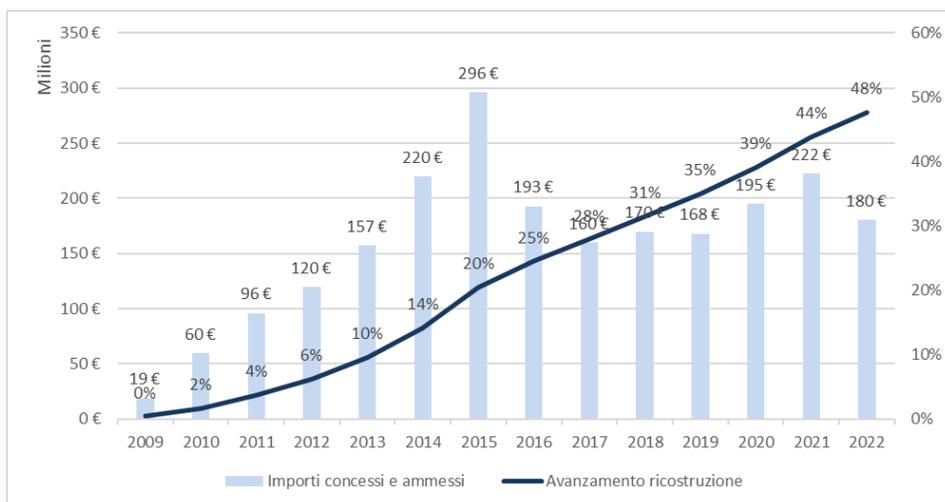

*Ammissioni:  
Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (Millioni di euro, dati al 15/12/2022).*

Il dato medio del cratere (48%) deve essere rapportato alle specificità della singola Area omogenea. I valori medi per Area omogenea variano infatti tra un minimo del 26% (AO2) ad un massimo del 80% (AO5):

- le **Aree omogenee n. 2 e 3** registrano un indice di avanzamento della ricostruzione privata pari al **28%** del fabbisogno previsto, in quanto tali aree sono state interessate anche dal sisma del 2016 e dalle problematiche legate alla sovrapposizione del danno tra i 2 terremoti (12 Comuni del Cratere sisma 2009, situati nelle AO n.2 e n.3, appartengono anche al Cratere sisma 2016).
- le **restanti Aree omogenee** del Cratere (**n. 4, 5, 6, 7, 8, 9**), invece, registrano un indice di avanzamento della ricostruzione privata significativamente superiore della media dell'intero cratere, attestandosi al **56%**.

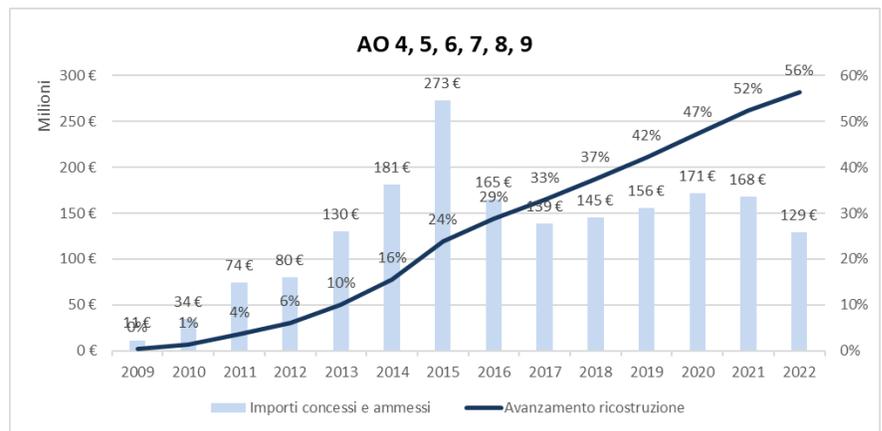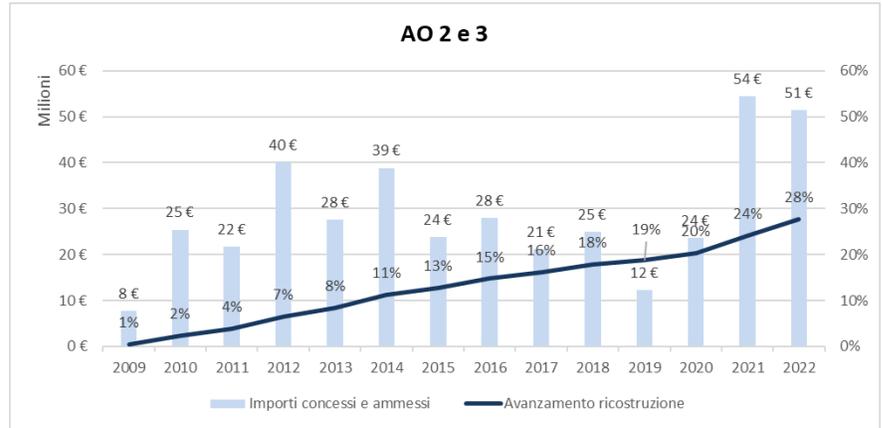


Ammissioni: Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere. Specifica per AO (Milioni di euro, dati al 15/12/2022).

Area	Atteso	Ammesso	Percentuale
AO2	€ 1.076	€ 281	26%
AO3	€ 369	€ 119	32%
AO4	€ 221	€ 84	38%
AO5	€ 298	€ 239	80%
AO6	€ 558	€ 270	48%
AO7	€ 256	€ 162	63%
AO8	€ 1.549	€ 838	54%
AO9	€ 411	€ 241	59%
Totale	€ 4.738	€ 2.235	47%

*Ammissioni: Percentuale di Ammissione a contributo per singola Area omogenea (Milioni di euro, dati al 15/12/2022)*

Quanto sopra è riferito all'avanzamento della ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere in relazione ai fabbisogni finanziari stimati. E' utile porre in evidenza la capacità di risposta dell'apparato pubblico alla reale domanda, focalizzando l'attenzione sulla performance del processo di ammissione contributi rispetto alla effettiva richiesta. **L'attuale avanzamento della ricostruzione privata nei Comuni del Cratere in relazione alle richieste di contributo effettivamente presentate è pari al 55%**, come da grafico che segue (aggiornato al 15/12/2022).

Va segnalato che il dato ha subito una forte modifica (in riduzione) a causa della presentazione di più di 1000 pratiche nel mese di settembre 2022 a seguito della scadenza imposta per legge del 30/09/2022. Precedentemente, l'Ufficio aveva chiuso il 72% delle domande presentate.

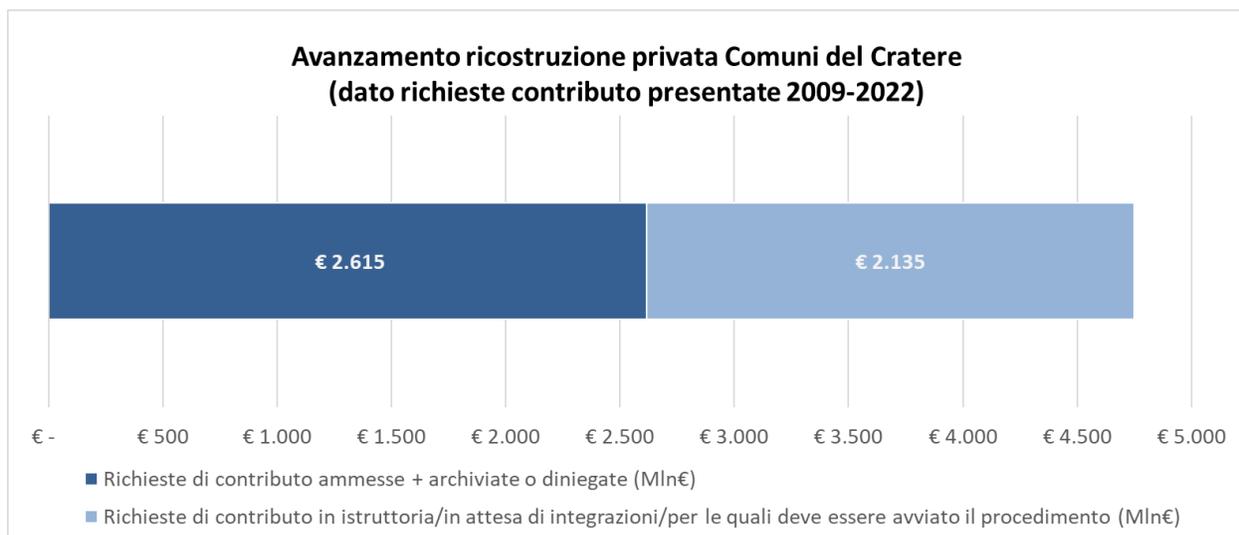




L'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari a **2.255 Mln €**, equivale appunto al **55%** dell'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

Più nel dettaglio, dal 2009 ad oggi risultano presentate complessivamente, sia presso i Comuni che presso l'USRC e gli Sportelli Decentrati (ex UTR), richieste di contributo per interventi di ricostruzione privata (esclusi gli edifici con esito A) nei Comuni del Cratere pari a **4.700 Mln €**. Di queste, risultano:

- Richieste di contributo **ammesse** per un importo complessivo di **2.255 Mln €**;
- Richieste di contributo **archivate o diniegate**, il cui procedimento è stato chiuso senza ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte dell'interessato per un importo complessivo di **360 Mln €**;
- Richieste di contributo **attualmente in istruttoria** per un importo complessivo di **186 Mln €**;
- Richieste di contributo **attualmente in attesa di integrazioni** per un importo complessivo di **668 Mln €**;

- Richieste di contributo **per le quali deve essere avviato il procedimento** per un importo complessivo di **1.280 Mln €**. Di queste solo 391 Mln € sono nella disponibilità dell'Ufficio. Le restanti devono completare la documentazione minima entro il 31/03/2023.

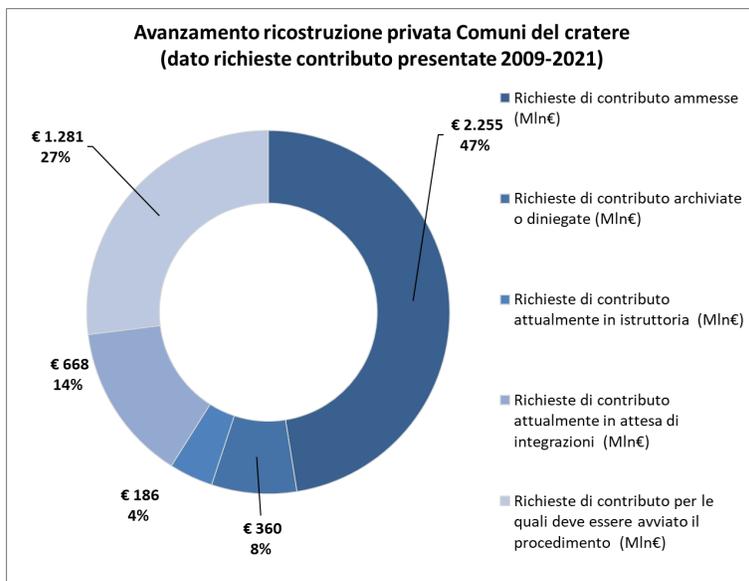

### 3.2 MIC – MODELLO INTEGRATO CRATERE


Per la ricostruzione dei Centri Storici dei 56 Comuni del Cratere, la procedura parametrica **MIC - Modello Integrato Cratere**, introdotta con Decreto USRC n.1/2014, ha regolamentato i criteri per la determinazione ed il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata (DPCM 4/2/2013).

Attraverso Modello Integrato Cratere, dal 2014 ad oggi, sono state presentate **2.756** richieste di contributo, per un importo totale di circa **2.970 Mln €**. Di queste ad oggi sono state **ammesse 1.279 MIC** per un importo di **1.456 Mln €**. Alle istanze ammesse corrispondono 893 cantieri MIC avviati e 634 cantieri con lavori già terminati.

Schede MIC Presentate [numero]	Schede MIC Presentate [importo]	Schede MIC Ammesse [numero]	Schede MIC Ammesse [importo]	Cantieri MIC	Cantieri MIC chiusi
2.756	2.970 Mln €	1.279	1.456 Mln €	893	634

### 3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

Per quanto riguarda lo **stato di avanzamento** in termini di **cantieri e SAL**, dal 2009 ad oggi è stato liquidato un importo complessivo pari a **1,49 Mld €** (dato periferia + centro storico, esclusi gli interventi su edifici con esito A).

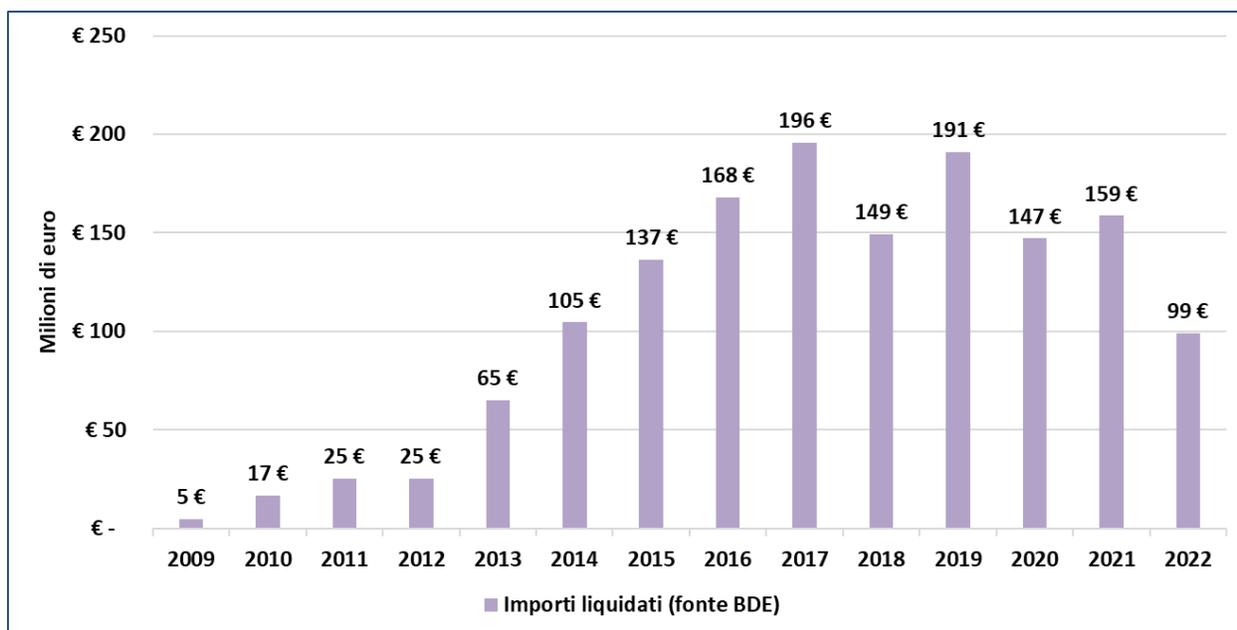

*SAL: Avanzamento nel tempo delle erogazioni a seguito di nulla osta SAL per la ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (dati al 15/12/2022)*

Area	Capofila	Perc.	Importo
2	Barete	11%	€ 148.562.882
3	Montorio al Vomano	6%	€ 89.122.936
4	Castel del Monte	4%	€ 61.594.302
5	Bussi sul tirino	13%	€ 187.126.256
6	Caporciano	13%	€ 180.172.678
7	Goriano Sicoli	8%	€ 112.096.752
8	Barisciano	40%	€ 551.486.136
9	Rocca di Mezzo	11%	€ 156.851.494

*SAL: Distribuzione degli importi totali dei contributi liquidati tra le aree omogenee - SAL. (dati al 15/12/2022)*

Il dato delle liquidazioni SAL per l'avanzamento dei cantieri dell'ultimo biennio è positivo, tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 intervenuta nel 2020. Tale risultato è ottenuto anche grazie

alle innovazioni introdotte dal 2019, quali la semplificazione degli adempimenti istruttori delle richieste di liquidazione dei SAL (Circolari USRC n. 12/2019 e n. 13/2019) e la digitalizzazione dell'acquisizione documentale attraverso una piattaforma telematica introdotta in aprile 2020. Ad oggi tale piattaforma gestisce la quasi totalità delle richieste di liquidazione dei SAL (il 95% - il restante 5% perviene ancora con modalità diverse come la PEC). In generale si evidenzia tuttavia, per l'anno in chiusura, un rallentamento nella presentazione dei SAL in considerazione dell'impegno dei tecnici addetti alla predisposizione delle richieste di contributo per la scadenza del 30/09/2022 e per l'aumento dei costi di costruzione.

Gli **immobili**, nei Comuni del Cratere, per i quali sono terminati i lavori al 15/12/2022, sono stimati in circa **10.906**, su un totale stimato di circa 23.240 abitazioni inagibili alla data del 2009. Gli immobili con lavori terminati nell'anno 2022 (e riconducibili ai SAL Finali presentati) sono circa 854. I **cantieri** di ricostruzione privata **attualmente attivi sono 634** (dato al 15/12/2022).

Pratiche con cantieri attivi	
Totali Attivi	<b>634</b>

Immobili con lavori terminati	
10.906 <sup>*)</sup>	
Di cui	
Prime Abitazioni	Altro (seconde ab e altri usi)
3.597	7.309
(*) escludendo i 9.689 interventi realizzati su abitazioni con esito di agibilità A.	


### 3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

Si riportano di seguito le immagini di **alcuni cantieri** che hanno visto la fine lavori e l'avvio nell'anno 2022.

Comune di Goriano Sicoli - Agg. 22 - Esito "E" - 4.288.027,23 €  
Cantiere chiuso nel primo semestre del 2022



Comune di San Pio delle Camere - Agg. 8800134 - UMI.2 - Esito "E" - 1.264.960,26 €  
Cantiere in corso e aperto nel primo semestre del 2022

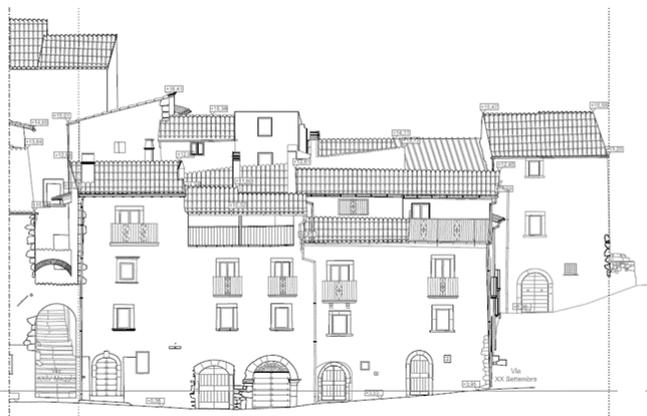


## 4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE

Dal 2013 l'USRC è competente (L. 71/2013, art. 7, co. 6) per i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione ricadenti nel territorio dei Comuni fuori Cratere, ovvero in quei Comuni abruzzesi che, pur non ricompresi nel Cratere sismico, hanno comunque riportato danni aventi nesso di causalità diretto con il sisma del 6 aprile 2009 (art. 1, co. 3, L.77/2009).

Si tratta di complessivi 114 Comuni, di cui 34 nella provincia dell'Aquila, 32 nella provincia di Teramo, 42 nella provincia di Pescara e 6 nella provincia di Chieti.

L'USRC, a partire dal gennaio 2019, ha preso in carico le **attività istruttorie** inerenti le richieste di contributo e SAL per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni fuori Cratere. Tale competenza - inizialmente attribuita, a far data dal 2014, agli UTR - Uffici Territoriali per la Ricostruzione "di frontiera" (competenti per l'Area omogenea del Cratere geograficamente prossima ai Comuni fuori cratere interessati), coordinati dall'USRC (Del. CIPE n. 1/2014; L.125/2015, art.11, co.13) - è stata trasferita integralmente all'USRC dal 2018, a seguito della soppressione degli UTR (L.172/2017).

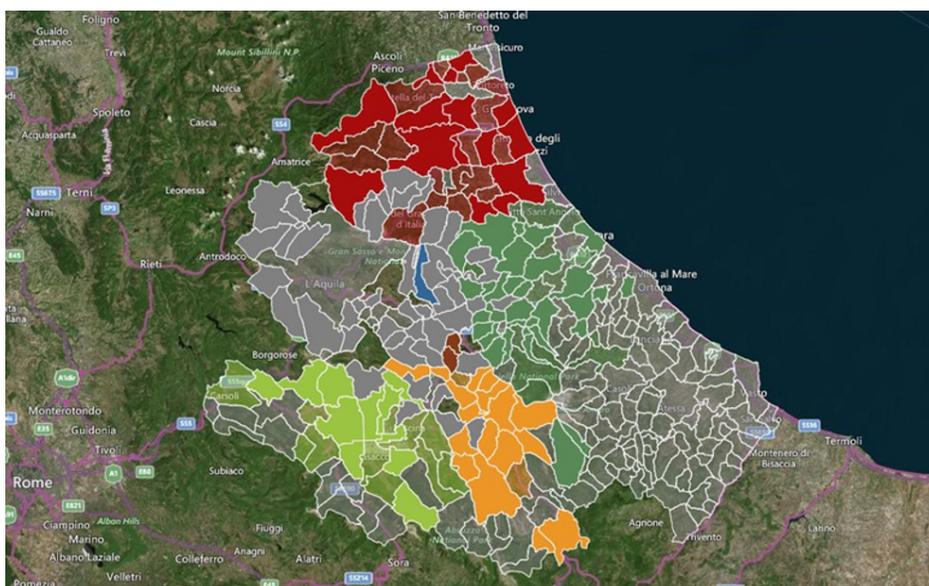


I **contributi ammessi** per la ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, dal 2009 ad oggi, ammontano a circa **495,96 € Mln €**, di cui:

- **85,19 Mln €** ammessi con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti e credito d'imposta (finanziamento agevolato) nel periodo 2009-2012;
- **410,77 Mln €** ammessi sul canale del finanziamento diretto.


Ad essi si aggiungono le richieste di contributo archiviate o diniegate, per un importo di **35,58€ Mln €**.

L'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari a **€ 531,54 Mln €**, equivale al **53%** dell'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

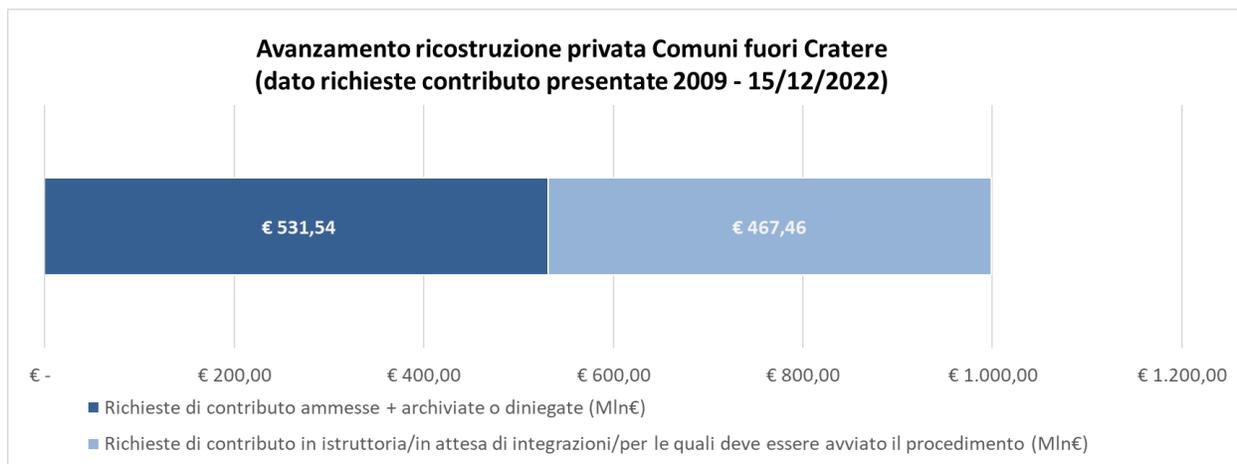

L'USRC, a far data dal **2019**, ha preso in carico **899** richieste di contributo giacenti, per un importo totale pari a circa **232 Mln €**, delle quali **817** è stato avviato il procedimento (**204,28 Mln €**). In particolare, risultano:

- Richieste di contributo in **istruttoria** per un importo complessivo di **67,53 Mln €**;
- Richieste di contributo in **attesa di integrazioni** per un importo complessivo di **72,80 Mln €**;
- Richieste di contributo **ammesse** per un importo complessivo di **25,16 Mln €**;
- Richieste di contributo **archivate o diniegate**, il cui procedimento è stato chiuso senza ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte dell'interessato, per un importo complessivo di **34,80 Mln €**;
- Richieste di contributo **per le quali deve essere avviato il procedimento** per un importo complessivo di **27,90 Mln €**.

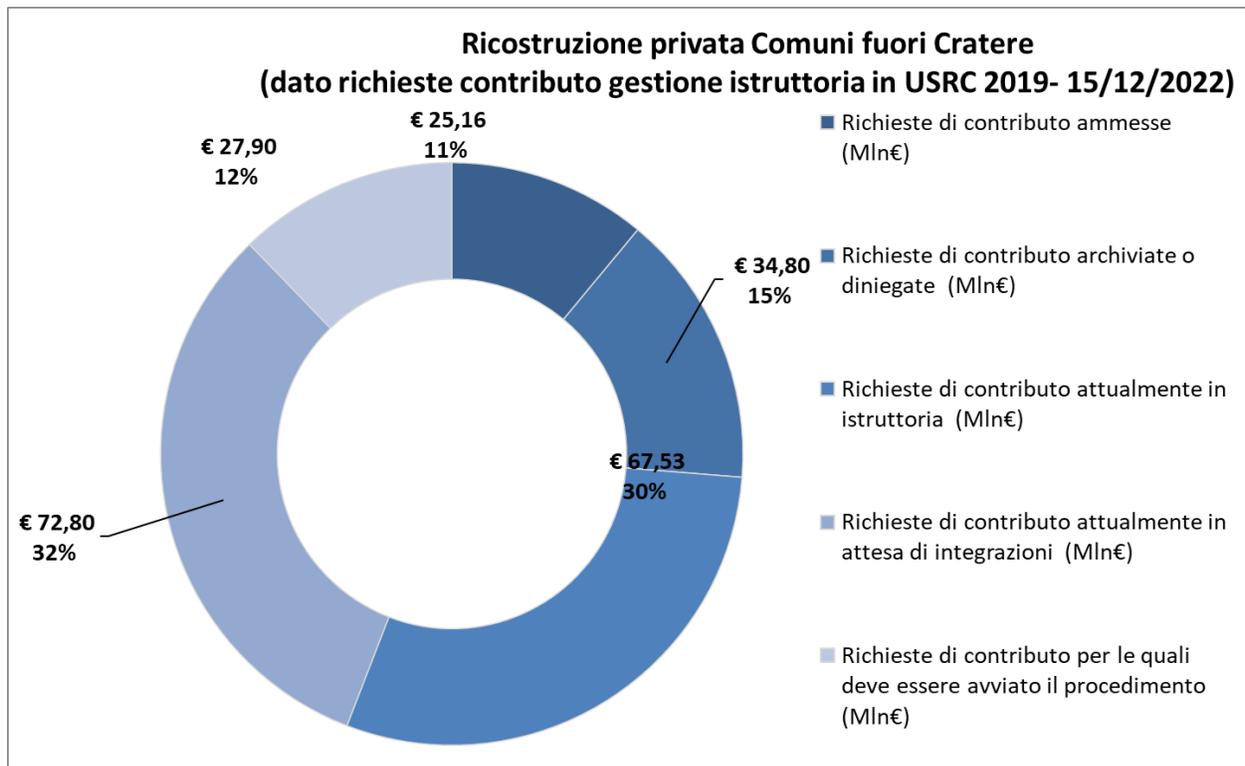

Da gennaio al 15 dicembre del 2022 sono stati ammessi contributi per un importo pari a **9 Mln €**.

L'USRC, a far data dal 2019, ha gestito inoltre **272** richieste di liquidazione **SAL** per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, di cui **233 liquidate, per un importo complessivo di 26,6 Mln €**. Da gennaio al 15 dicembre del 2022 sono stati liquidati **39** SAL per un importo pari a **5,2 Mln €**.

Le **abitazioni** nei Comuni Fuori Cratere per le quali è stata ripristinata l'agibilità sono stimate in **2.072** su un totale di circa 3.610 abitazioni inagibili alla data del 2009. Le abitazioni tornate agibili nel 2022 sono 184. I **cantieri** di ricostruzione privata **attualmente in corso sono 230**.

## 5. GESTIONE FONDI



L'USRC esegue il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata nei Comuni del Cratere e fuori Cratere (art. 4, Decreto MEF del 29 ottobre 2012), che è inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato sul sito [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per la ricostruzione privata sul canale diretto aggiornato al **15/12/2022**:

RICOSTRUZIONE PRIVATA	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPEGNATE	RISORSE TRASFERITE
Comuni cratere	€ 1.496.571.598	€ 1.366.000.717,33	€ 1.132.843.057,61
Comuni fuori cratere	€ 418.195.741	€ 362.279.344,17	€ 303.935.821,73

Ai sensi delle Delibere CIPE n. 23/2014 e n. 22/2015, l'USRC cura inoltre l'assegnazione e trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni del Cratere e fuori cratere. Le risorse sono assegnate ai singoli Comuni per i soli interventi immediatamente attuabili e solo nel caso in cui siano state integralmente impegnate le risorse precedentemente assegnate. In tal modo sono garantiti l'efficiente utilizzo delle risorse per la ricostruzione privata e la corretta allocazione delle stesse nei Comuni con maggiore capacità di spesa.



### 5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 31/08/2022, raggiunge un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di 2.058 Mln € (2.264 Mln € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 15/12/2022 **l'USRC ha assegnato** complessivamente 1.366 Mln€, di cui trasferiti 1.133 Mln€.

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
<b>A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC</b>	<b>€ 1.496.571.598</b>	
<b>B. Totale utilizzi USRC</b> Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni del cratere		<b>€ 1.366.000.717,33</b>
<b>C. Totale Disponibile</b> Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Cratere		<b>€ 130.570.880,67</b>

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 54 Comuni del Cratere e rappresentano circa il 72% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

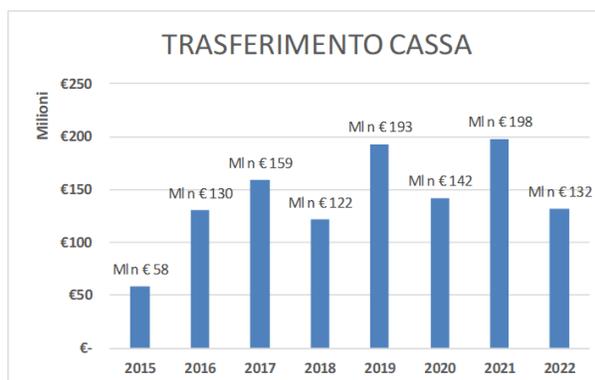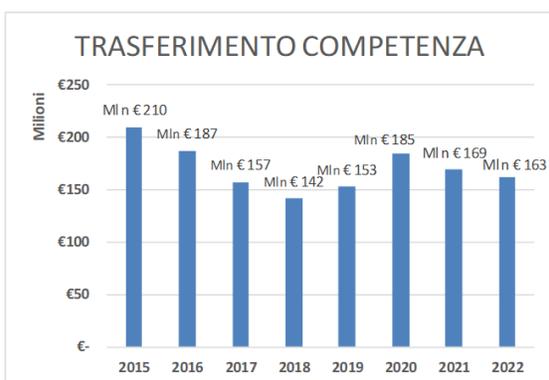

L'aggiornamento dei dati è pubblicato sul sito istituzionale dell'USRC, al seguente link:

[Gestione fondi comuni del cratere](#)

Nel 2022 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 131.566.112,25** a 35 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati finanziamenti a 47 comuni per complessivi **€ 162.590.460,88**.

<https://www.usrc.it/ricostruzione/ricostruzione-privata-cratere/gestione-fondi-comuni-del-cratere>

## 5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 30/08/2022, raggiunge un importo totale dei **contributi concessi** con finanziamento diretto di **400.368.542,42** Mln € (482.189.262,76 Mln € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 30/06/2022 l'USRC ha assegnato € 362.279.344,17 di cui trasferiti € 303.935.822,13;

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
<b>A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC</b>	<b>€ 418.195.741,15</b>	
<b>B. Totale utilizzi USRC</b> Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni Fuori Cratere		<b>€ 362.279.344,17</b> (+€27.446.614,56 altre gestioni)
<b>C. Totale Disponibile</b> Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Fuori Cratere		<b>€ 55.916.396,98</b> (comprensivi residui gestioni precedenti)

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 114 Comuni del Fuori Cratere e rappresentano circa il 90% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

Nel **2022** sono stati complessivamente **trasferiti** da parte dell'USRC € **20.508.667,28** a 38 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati **assegnati** finanziamenti a 19 Comuni per complessivi € **21.109.607,43**.



## 6. RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Nel rispetto del riparto di competenze previsto nella gestione ordinaria, l'USRC dal 2013 cura la programmazione delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica, effettua il trasferimento delle somme e cura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (Decreto del MEF del 20/10/2012).

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati **354** interventi di ricostruzione pubblica nei Comuni del Cratere per complessivi **222,4 Mln €**, **331** dei quali nel corso della gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un importo pari a **207,5 Mln €**. Tali interventi riguardano il ripristino, a seguito del danneggiamento arrecato dal sisma 2009, di beni pubblici, quali Case Comunali, Reti infrastrutture, Edilizia Residenziale Pubblica, Centri di Aggregazione, Edilizia Cimiteriale.

Le principali fonti di finanziamento degli interventi di Ricostruzione pubblica, dal 2013 ad oggi, sono:

**Delibera CIPE 135/2012**, a valere sulla quale è stata definita la **Programmazione triennale della Ricostruzione Pubblica (2013 - 2015) dei Comuni del Cratere** per un importo complessivo di **126,45 Mln €**;

**Delibera CIPE n. 48/2016**, che ha definito gli indirizzi, i criteri e le modalità per la predisposizione dei **“Programmi pluriennali di intervento di settore”** e dei relativi **“Piani annuali di attuazione”**, al fine di razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica, in

linea con le previsioni del DL n. 78/2015, ed ha approvato un “Piano Stralcio”, che finanzia interventi nei Comuni del Cratere per complessivi **14,5 Mln €**;

**Delibera CIPE n. 24/2018**, che ha approvato il Piano annuale 2018 relativo al Settore 4 - “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” ed ha assegnato risorse all’USRC per complessivi **21,3 Mln €**, destinati a **21** interventi nei Comuni del Cratere e a **14** interventi nei Comuni fuori Cratere;

**Delibera CIPE n. 18/2020**, che ha approvato il secondo Piano annuale 2020 relativo al Settore 4 - “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” ed ha assegnato risorse per un importo di **30,3 Mln €** all’USRC per l’attuazione di 37 interventi in Comuni del Cratere e fuori Cratere.

Dal 2013 ad oggi sono **200 i progetti finanziati in via definitiva**, per complessivi **78,5 Mln €**, che rappresentano complessivamente oltre il 64% degli interventi programmati. Di questi:

- **110** interventi sono ultimati o in fase di collaudo, per un importo pari a **29,2 Mln €**;
- **34** interventi con lavori in corso, per un importo pari a **267 Mln €**;
- **59** interventi per i quali è in corso l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori, per un importo pari a **21,8 Mln €**.


Risultano inoltre oltre **120 interventi programmati**, con una copertura finanziaria di complessivi **117 Mln €**.

Nel corso del 2022 sono stati trasferiti complessivamente **€ 6.291.402,86** a 61 Comuni ed assegnati **€ 12.288.136,25** a 21 Comuni per avviare **34 nuovi interventi**.

Dal 2013 ad oggi sono state complessivamente trasferite ai Comuni del Cratere risorse per **€ 56.178.776,16** per il pagamento dei lavori eseguiti.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per la ricostruzione pubblica nel **periodo 2013-2022**:

<b>RICOSTRUZIONE PUBBLICA</b>	<b>RISORSE ASSEGNATE</b>	<b>RISORSE IMPEGNATE</b>	<b>RISORSE TRASFERITE</b>	<b>RISORSE SPESE</b>
Ricostruzione pubblica (esclusi interventi emergenziali, DPC, Provveditorato, Mibact, ATER)	<b>€ 177.966.713</b>	<b>€ 78.486.292</b>	<b>€ 79 896 276</b>	<b>€ 56.178.776,16</b>

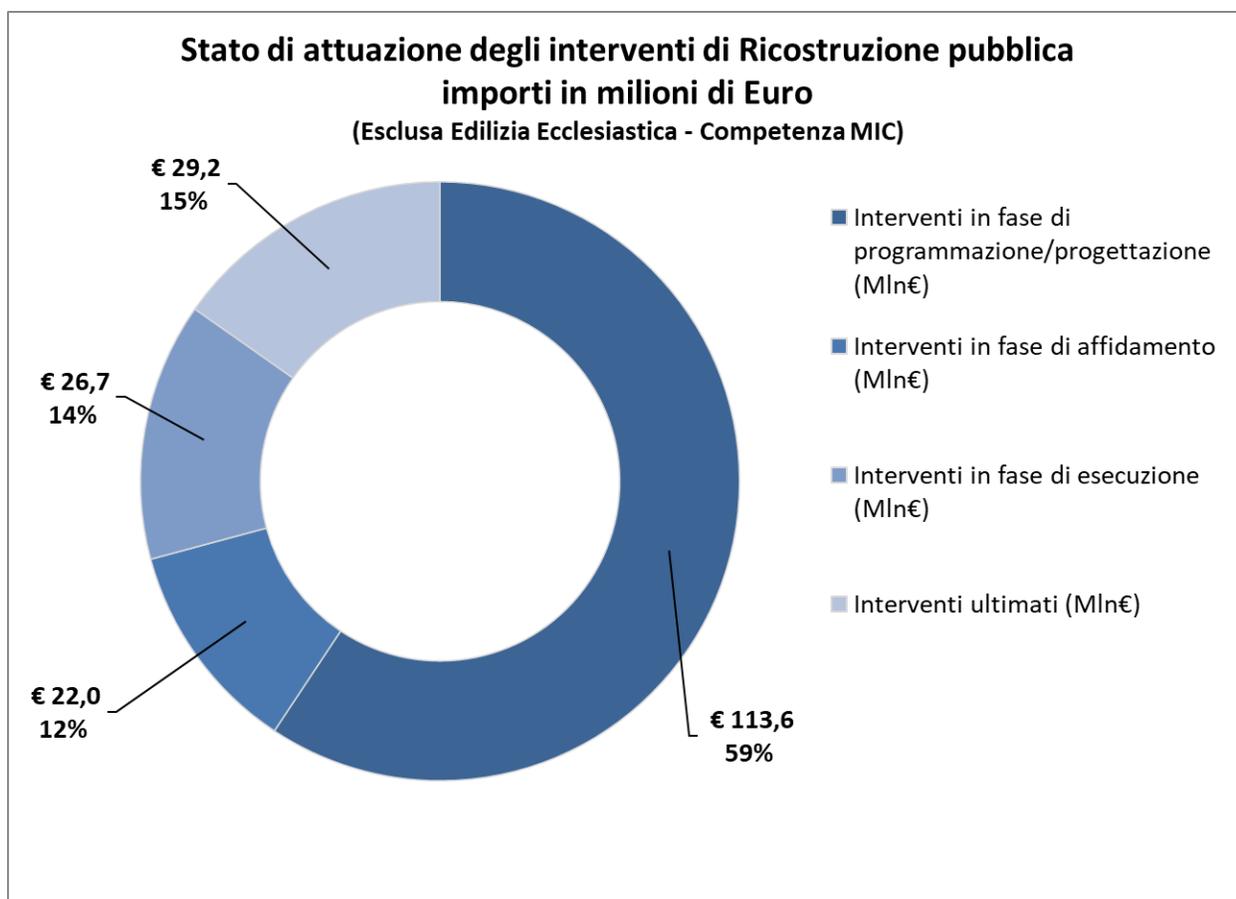

#### PICC - Piano di Interventi Connessi e Complementari per la rigenerazione urbana dei centri storici

Parallelamente al percorso avviato con i fondi del Piano Complementare al PNRR per le aree colpite dal sisma del 2009 e del 2016, è stata avviata un'attività di ricognizione del fabbisogno relativo alla ricostruzione pubblica e volto al ripristino delle **reti**, delle **infrastrutture**, degli **spazi pubblici** e alla **messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici e delle cavità antropiche rese instabili dal sisma**. Questi interventi, connessi e comunque complementari a quelli di ricostruzione pubblica e privata, sono fondamentali per la completa rifunzionalizzazione e rigenerazione dei centri storici e costituiscono il naturale completamento dei cantieri pubblici e privati.

L'attività di ricognizione delle esigenze si è conclusa il 30 maggio 2022 e sono attualmente in corso le istruttorie di oltre 260 schede progettuali presentate per circa 330 milioni di euro, al fine di verificare il rispetto dei requisiti dettati dalla determinazione USRC 1097/2021 che ha stabilito, nel rispetto della norma originaria, i criteri di ammissibilità a finanziamento. Gli **interventi ammissibili** rientrano


nell'ambito del Piano di Ricostruzione ovvero nel Centro Storico del Comune proponente, e sono riconducibili alle linee di intervento di cui alla Det. USRC 1097/2021, in particolare:

- ❖ *Linea 1 - Riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria:* che comprende interventi atti ad incrementare la qualità spaziale e funzionale degli spazi urbani di proprietà pubblica;
- ❖ *Linea 2 - Messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma:* che comprende interventi atti a mitigare il rischio idrogeologico e geomorfologico, funzionali al ripristino dell'agibilità degli immobili danneggiati dal sisma del 2009, nelle aree interessate da dissesti idrogeologici e al riempimento o consolidamento delle cavità direttamente danneggiate o rese instabili dal sisma 2009;
- ❖ *Linea 3 - Miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi:* che comprende interventi atti alla riparazione, ripristino, potenziamento e/o adeguamento delle reti di infrastrutture dei servizi esistenti alla data del sisma.

## CAMMINI

I fondi stanziati per gli interventi di valorizzazione turistica dei cammini, rientrano tra quelli previsti per l'attuazione degli interventi del **Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016**, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita" ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) è stato individuato come soggetto responsabile dell'intervento ed ha redatto internamente, con proprio personale tecnico e con il contributo degli amministratori dei Comuni interessati, il progetto di fattibilità tecnico economica (P.F.T.E.) da porre a base di gara per la procedura di appalto integrato, in linea con il Programma unitario di interventi per le aree del sisma 2009 e 2016 approvati dalla Cabina di Coordinamento Integrata con Delibera del 30/09/2021.

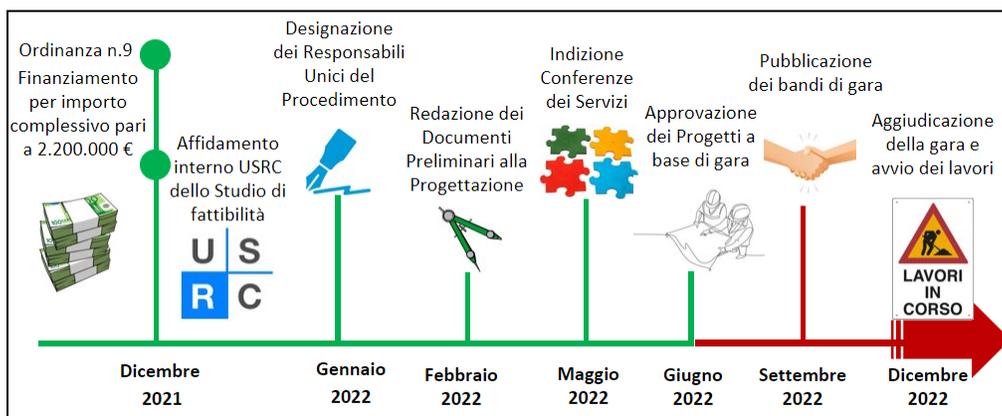

I progetti per la valorizzazione turistica dei Cammini, approvati e finanziati con fondo complementare al PNRR sono:

- **“Il Cammino grande di Celestino”** nasce su iniziativa del Parco Nazionale della Majella e attraversa i Comuni di L’Aquila, Ocre, Fossa, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio Ne’ Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Acciano, oltre ai Comuni fuori cratere di Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Raiano, Corfinio, Roccacasale, Pratola Peligna e Sulmona;
- **“Il Cammino della Baronia”**, nasce su proposta dei Comuni di Castelvecchio Calvisio (capofila), Calascio, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Ofena, Santo Stefano Di Sessanio e Villa Santa Lucia e attraversa gli stessi Comuni e quello di Capestrano;
- **“Il Cammino tra i Vestini”**, nasce su iniziativa del Comune di Navelli (AQ) e attraversa i Comuni di Fossa, Villa Sant’Angelo, Sant’Eusanio Forconese, San Demetrio Ne’ Vestini, Poggio Picenze, Barisciano, San Pio delle Camere, Navelli, Acciano, Caporciano e Prata D’Ansidonia;
- **“Il Cammino dei Francescani”**, nasce su proposta del Comune di Gagliano Aterno (AQ) e attraversa i Comuni di Rocca di Mezzo, Ovindoli, Celano, Aielli, Collarmele, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo e Secinaro.

L’obiettivo principale del progetto nella sua unitarietà consiste nell’identificazione e valorizzazione dei percorsi con azioni volte a promuovere:

- lo **sviluppo e l’aumento dell’offerta turistica** dei territori comunali interessati, ampliandone la conoscenza sotto l’aspetto naturalistico, storico-culturale, architettonico, sportivo e gastronomico;
- la qualità funzionale della **mobilità lenta**, con il noleggio di biciclette e mountain bike, favorendo il trekking a cavallo, con l’opportunità di costruire una rete di connessioni intercomunali mediante l’integrazione del cammino con il sistema delle strade poderali e vicinali ad esso collegate;
- l’**accessibilità**, per favorire la percorrenza del cammino nell’ottica dell’inclusività sociale;
- la **conoscenza del territorio**, per scoprire le testimonianze storiche, le tradizioni e le peculiarità dei luoghi attraversati.

Affinché si realizzino gli obiettivi, la progettualità dovrà intersecare diversi ambiti di intervento e tenere conto della **sostenibilità dell’offerta** a medio e lungo termine. Una progettazione che sia in grado di unire realtà diverse e che contribuisca a rilanciare economicamente i borghi direttamente attraversati o raggiungibili dai percorsi: il flusso di turisti dovrebbe svolgere la funzione di **volano per la nascita di una nuova economia ed il rilancio del territorio**, favorendo l’apertura di nuove attività ricettive e di ristoro, nonché l’espansione delle attività sportive locali.

## 7. EDILIZIA SCOLASTICA



Con Decreto DiSET n. 48 del 14 marzo 2013, sono state trasferite all'USRC le competenze per l'attuazione del Piano denominato "**Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza**", finalizzato alla riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per tutte le scuole della Regione Abruzzo ad eccezione di quelli ricadenti nel Comune di L'Aquila.

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati **245** interventi sull'edilizia scolastica, per complessivi **244 Mln €**, **214** dei quali nel corso della gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un importo pari a circa **191,2 Mln €**.

Più di recente, con Delibera CIPE n. 32/2019, all'USRC è stata conferita la responsabilità di attuazione del Piano annuale degli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica nell'ambito territoriale di propria competenza, mentre al MIUR è assegnata la competenza della programmazione del Settore.

Gli interventi previsti riguardano **la riparazione, il miglioramento sismico** e, in alcuni casi, **la costruzione di nuovi**

**edifici scolastici**, coinvolgendo oltre **160 edifici, 4 province e 98 comuni, e quasi 30.000 studenti** abruzzesi.


Con la deliberazione CIPE 72/2020 è stata finanziata la seconda annualità dei piani di intervento sull'edilizia scolastica, per un importo complessivo di ca. 15 milioni di euro. Nel corso del primo semestre 2022 è stata condotta un'attività istruttoria in sinergia con la Struttura di Missione e il MIUR, volta a completare la programmazione della seconda annualità: l'ulteriore proposta in fase di esame prima della trasmissione al CIPESS prevede la possibilità di finanziamento di ulteriori **6 interventi su altrettanti comuni**, in parte volti al completamento di opere già avviate e in parte per nuovi progetti per un costo complessivo di **ca. 16 milioni di euro**.

Sulla base dei criteri e delle procedure definiti dall'USRC, ad oggi, sono stati **approvati 123 interventi per oltre 123,8 Mln €, immediatamente cantierabili, e sono state trasferite agli enti attuatori risorse per 92,4 Mln €**.

**Dei 123 interventi approvati dal 2013 ad oggi: 84 hanno concluso i lavori e 37 sono in fase di esecuzione.**

Dei **191,2 Mln €** di interventi finanziati, risultano, in particolare:

- interventi ultimati per un importo pari a **84,3 Mln €** assegnati;
- interventi in fase di esecuzione per un importo pari a **43,3 Mln €** assegnati;
- interventi in fase di progettazione, per un importo pari a **55,6 Mln €** assegnati;
- interventi in fase di programmazione per un importo pari a **0,7 Mln €** assegnati;
- interventi definanziati per un importo pari a **7,4 Mln €** assegnati..

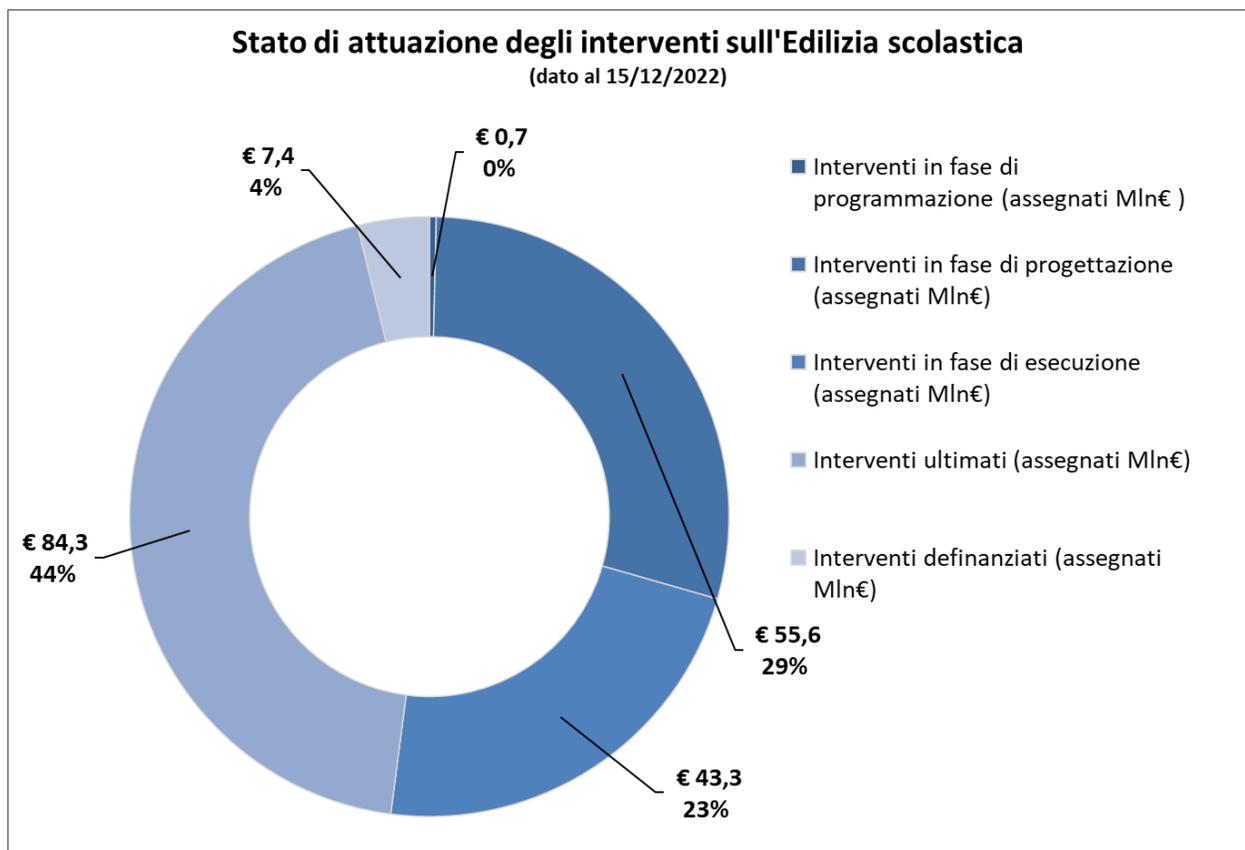

Nel corso del 2022 sono stati trasferiti complessivamente **€ 8.712.176,14** a **20** Comuni ed assegnati **€ 13.334.537,19** a **9** Comuni **per avviare 11** nuovi interventi.

Inoltre sono stati conclusi 6 interventi per oltre **13 Mln €**, per una popolazione studentesca di oltre 1600 ragazzi:

USRC - Edilizia scolastica - Interventi conclusi	Importo
Istituto comprensivo di Via Puglie - Comune di Avezzano	7.200.000,00 €
Scuola media - Comune di Castilenti	878.388,00 €
Scuola media - Comune di Scafa	1.306.171,36 €
Scuola media Serafini - Comune di Sulmona	2.905.716,36 €
Scuola materna - Comune di Lecce nei Marsi	460.000,00 €
Complesso Paolini - Ala Ovest - Comune di Popoli	350.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>13.100.275,72 €</b>

### Avezzano, Istituto comprensivo di Via Puglie € 7.200.000,00




**Civitella Casanova (PE), Scuola Media € 1.770.000,00**



**Castilenti (TE), Scuola Media € 878.388,00**



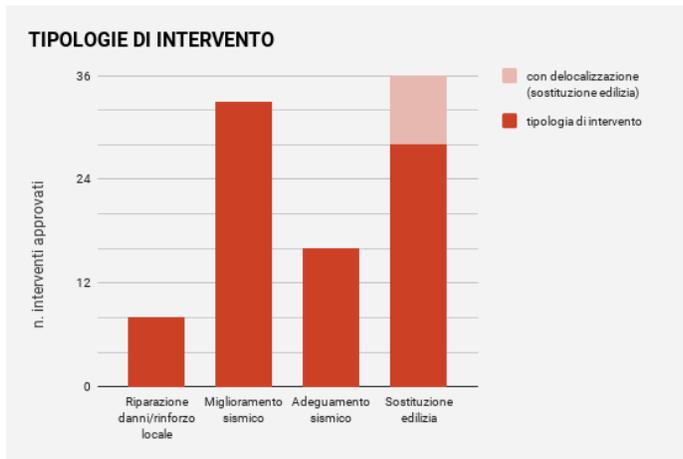

Gli interventi riguardano edifici che hanno manifestato un'elevata vulnerabilità sismica e sono finalizzati al raggiungimento del massimo livello di sicurezza conseguibile con il finanziamento disponibile; per quasi la metà di essi è prevista la sostituzione dei vecchi fabbricati con nuovi edifici scolastici.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per gli interventi sull'edilizia scolastica nel **periodo 2013-2022**:

EDILIZIA SCOLASTICA	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPEGNATE	RISORSE TRASFERITE	RISORSE SPESE
Edilizia scolastica (esclusi interventi Provveditorato)	€ 191.259963,93	€ 123.816.964,83	€ 155 787 593	€ 92.391.355,66



*AGORA' (spazio centrale) della nuova Scuola elementare di Celano*

L'U.S.R.C. ha contribuito a diffondere presso le amministrazioni competenti le **indicazioni dettate dalle Linee guida del MIUR**, per realizzare scuole con una concezione innovativa degli spazi dedicati alla didattica e con un nuovo rapporto con il territorio, che qualifichi la scuola come «centro civico», al servizio della comunità oltre gli orari scolastici.



*.SPAZIO LETTURA della nuova scuola di Pratola Peligna*

L'Ufficio ha inoltre provveduto alla copertura economica delle spese necessarie alla **sistemazione provvisoria degli studenti** per garantire la continuità didattica durante l'esecuzione degli interventi, definendo altresì i criteri di assegnazione delle risorse alle Amministrazioni richiedenti.

## 8. TRASPARENZA



### 8.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

Per gli interventi localizzati nei Comuni del Cratere, sul sito istituzionale dell'USRC sono pubblicate, con aggiornamento settimanale, le informazioni relative allo stato dell'istruttoria delle richieste di contributo e degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) depositate presso l'USRC, accessibili senza restrizioni da parte degli interessati al seguente link:

[Verifica lo stato della pratica](#)

### 8.2 WEB-GIS

L'USRC, oltre alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, con cadenza bimestrale, del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione privata, ha reso disponibili ai soggetti interessati i dati del monitoraggio mediante geolocalizzazione su mappa in apposito web-GIS, accessibile dal sito istituzionale dell'USRC.

### 8.3 CONTRATTI

L'USRC effettua l'acquisizione dei contratti relativi agli interventi di ricostruzione privata, localizzati nei Comuni del Cratere e fuori Cratere, da parte dei committenti e ne effettua la trasmissione ai comuni interessati, per gli idonei controlli (art. 67-quater, co.8, L. n. 134/2012; art. 11, co.1, L. n. 125/2015). La procedura, a far data dal gennaio 2019, avviene interamente on line.

Al 15 Dicembre 2022 risultano acquisiti contratti in numero di **11.880** relativi a 2.972 richieste di contributo e a 115 Comuni, per un importo complessivo di **2.891.577.460,12 €**.

#### 8.4 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

L'USRC ha approvato il **Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza** per il triennio **2022-2024 confluente nel P.I.A.O.**

Il Piano sposa un'interpretazione ampia del concetto di fenomeno corruttivo al fine di reprimere ed ancor prima prevenire ogni fenomeno di *maladministration*, idoneo anche solo potenzialmente a sviare il corretto esercizio del potere pubblico nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ufficio. Il PTPCT è accessibile in formato aperto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'USRC.

Nel secondo semestre del 2022, in attuazione delle misure previste nel Piano, l'attenzione è stata rivolta principalmente alla mappatura dei procedimenti e dei processi di competenza dell'Ufficio con coinvolgimento di tutti i dipendenti. E' stato inoltre notevolmente ampliato l'apparato regolamentare dell'Ufficio con l'approvazione dei seguenti regolamenti: Regolamento per la costituzione e gestione del fondo per incentivi tecnici, Regolamento per conferimento incarichi extraistituzionali, Regolamento per la trasparenza, Regolamento per la costituzione e gestione dell'Albo dei fornitori, modulistica in tema di conflitti di interesse.

Sul fronte della formazione, oltre all'acquisto di corsi specialistici richiesti dalle varie aree, è stata erogata formazione obbligatoria organizzata in house a tutti i dipendenti in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e di trasparenza.

## 9. GESTIONE APPALTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

### APPALTI DI BENI E SERVIZI

Nell'ambito di un intervento sistematico volto ad implementare la qualità amministrativa e dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le proprie esigenze, l'USRC ha proseguito nell'ormai consolidata strategia d'azione in questo delicato settore, principalmente svolta sulle seguenti direttrici:

- Maggior cura della fase della programmazione della spesa, con l'approvazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e con un atto di programmazione interna per beni e servizi non inseriti nel programma stesso al fine di prevedere e garantire un'ottimale allocazione delle risorse finanziarie disponibili;
- Maggior trasparenza e controllo nelle varie fasi delle procedure di appalto, prevedendo sempre l'utilizzo di piattaforme elettroniche ed in particolare del MePA anche per affidamenti diretti di modico importo, salvo cause di estrema urgenza esplicitate nella determinazione a contrarre. Per i pochi acquisti operati al di fuori del mercato elettronico si è comunque operata una ricerca di mercato in linea con le indicazioni fornite nel tempo da ANAC;
- Riduzione dei micro affidamenti mediante stipula di convenzioni con operatori di diversi settori utili a scongiurare la reiterazione di affidamenti diretti;
- Approvazione di atti di natura generale e/o regolamentare utili a supportare ed indirizzare l'attività del personale addetto all'Ufficio competente alla gestione degli appalti, tra i più significativi: regolamento per la quantificazione ed erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, registro dei contratti d'appalto sottoscritti dall'Ufficio, disposizioni di servizio volte a regolamentare la fase dei controlli amministrativi sugli aggiudicatari.

Nella ricerca del punto di equilibrio ottimale tra rigore amministrativo e velocità dell'azione amministrativa, si è inoltre spesso preferita una procedura di gara aperta anche laddove non obbligatoria in termini strettamente normativi, pervenendo ad aggiudicazioni di contratti a prezzi ridotti rispetto agli affidamenti conclusi grazie ad una maggior partecipazione concorrenziale.

Nel corso del 2022 l'USRC ha stipulato 62 contratti di appalto per fornitura di beni e servizi per un valore complessivo di circa 500 mila euro.

### APPALTI DI LAVORI

L'art. 54 comma 2 bis del D.L. 77/2021, prevedendo la possibilità di delega di competenze in materia di appalti pubblici da parte delle amministrazioni del cratere in favore dell'USRC, costituisce una pietra miliare nella storia dell'Ufficio che in pochi mesi ha sottoscritto convenzioni per la gestione di 30 procedure di gara in qualità di stazione appaltante. Alla convenzione sottoscritta di recente con il

Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo per la progettazione e l'esecuzione di lavori di recupero di chiese danneggiate dagli eventi sismici e dislocate sul territorio abruzzese, ha fatto seguito l'accordo con la Prefettura de L'Aquila e la Soprintendenza per i beni culturali de L'Aquila per un ulteriore intervento a valere sui fondi per l'edilizia di culto (F.E.C.).

E' di fine dicembre 2021 l'individuazione dell'USRC quale soggetto attuatore per il recupero e la valorizzazione di 4 percorsi sentieristici da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nell'ambito del Piano complementare al PNRR, interventi già aggiudicati ad oggi in anticipo rispetto alla milestone del 31.12.2022.

Da ultimo, ma non certo per rilevanza economica e sociale, sono stati finalizzati numerosi accordi tra l'Ufficio e diversi comuni del territorio per l'attuazione di interventi di varia natura che vanno dalla realizzazione di un nuovo polo scolastico, ad interventi di rigenerazione urbana passando per lavori finalizzati a scongiurare rischi di dissesto idrogeologico.

Competenze maturate negli anni, propensione alla gestione di processi complessi e disponibilità di adeguate strutture interne per l'esecuzione, il controllo e la rendicontazione della varie fasi di appalti complessi, hanno consentito all'Ufficio di meritare in breve tempo la fiducia e l'attenzione da parte delle amministrazioni del territorio abruzzese, grazie anche ad un ripensamento della propria organizzazione, recentemente implementata con la costituzione di un Ufficio dedicato appositamente agli appalti di lavori. I primi numeri maturati in questo specifico e delicato ambito consentono di guardare con ottimismo al futuro prosieguo dell'attività: 38 appalti delegati da parte di 11 soggetti differenti per un valore complessivo di circa 45 mln di euro con 19 interventi aggiudicati nel corso del 2022.



## 10. SVILUPPO DEL TERRITORIO

### 10.1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RESTART

La L. 134/2012 individua tra le finalità della gestione ordinaria della ricostruzione quella di assicurare l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (art.67-ter, co.1) ed assegna all'USRC la competenza anche in ordine allo sviluppo dei territori (art.67-ter, co.2).

Allo scopo, **l'art. 11, co. 12, del D.L. n. 78/2015**, ha destinato una quota (**fino al 4%**) delle risorse finanziarie stanziata per la ricostruzione al **Programma di sviluppo RESTART**, predisposto dalla SdM – Struttura di Missione (ex DPCM 1 giugno 2014, confermata con modificazioni dal DPCM 4 ottobre 2019) ed approvato con **Delibera CIPESS n. 49/2016**, per interventi da attuarsi nel territorio del Cratere sismico abruzzese.


Con successive delibere CIPESS n. 70/2017, 115/2017, 25/2018, 56/2018, 20/2019, 54/2019, 16/2020, 17/2020, 70/2020, 43/2021, 69/2021, 89/2021 e 19/2022, sono stati approvati ulteriori interventi del Programma di sviluppo RESTART ed assegnate ulteriori risorse agli interventi del programma.

La delibera CIPESS n.89/2021 ha rimodulato il piano finanziario del Programma di sviluppo RESTART, riducendo la dotazione finanziaria complessiva dai precedenti 219,7 Mln € approvati con Delibera CIPESS n.49/2016 agli attuali **217,06 Mln €**. Tali risorse sono aggiuntive a quelle già assegnate allo sviluppo del Cratere sismico con **Delibera CIPESS n. 135/2012**, pari a **100 Mln €**.

Nella Tabella che segue è riportato lo stato di avanzamento del Programma per ciascuna delle Priorità o Ambiti tematici, con riferimento alle Delibere CIPESS sopra richiamate:

RIEPILOGO PROGRAMMA SVILUPPO (DELIBERA CIPE N. 49/2016 + DELIBERA CIPE N. 135/2012, COME RIMODULATO DALLA DELIBERA CIPE N.89/2021)						
PRIORITA' - AMBITI TEMATICI RESTART	RIPARTO FINANZIARIO / DOTAZIONE PRIORITA'	INCIDENZA SUL TOTALE PROGRAMMA	TOTALE RISORSE APPROVATE	% RISORSE APPROVATE SU DOTAZIONE PRIORITA'	RISORSE RESIDUE	% RISORSE RESIDUE SU DOTAZIONE PRIORITA'
	mIn€	%	mIn€	%	mIn€	%
A - Sistema imprenditoriale e produttivo	114,2	36%	95,7	84%	18,5	16%
B - Turismo e ambiente	98,6	31%	75,8	67%	22,9	33%
C - Cultura	16,3	5%	14,8	91%	1,5	9%
D - Alta formazione	17,8	6%	15,0	84%	2,8	16%
E - Ricerca e innovazione tecnologica	58,9	19%	57,7	98%	1,2	2%
F - Agenda digitale	6,8	2%	6,8	100%	0,0	0%
G - Governance, monitoraggio e valutazione del programma di Sviluppo	4,4	1%	4,4	100%	0,0	0%
<b>TOTALE</b>	<b>317,0</b>	<b>100%</b>	<b>270,2</b>	<b>85%</b>	<b>46,8</b>	<b>15%</b>

**PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA RESTART**

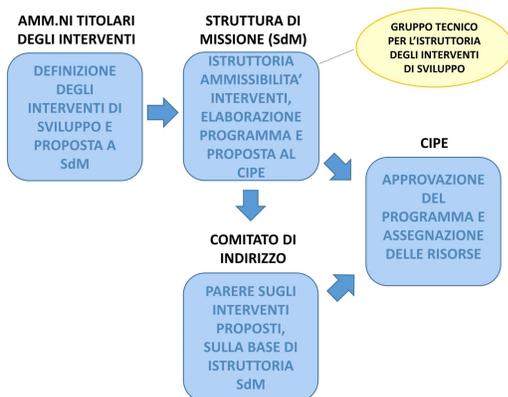

Nell'ambito della procedura di approvazione degli interventi del programma RESTART, l'USRC supporta la SdM - Struttura di Missione nella valutazione delle proposte d'intervento presentate dalle Amministrazioni Titolari e fa parte del **Comitato di Indirizzo**, nella figura del Titolare. Ai sensi della normativa sopra richiamata, l'USRC in fase di attuazione del programma è inoltre competente al **trasferimento delle risorse destinate agli interventi di RESTART a titolarità dei Comuni del Cratere sismico**, ad esclusione di L'Aquila, previa istruttoria positiva da parte della SdM e trasferimento delle relative risorse da parte del MEF – Dipartimento del Tesoro.

Ad oggi, l'USRC ha effettuato il **trasferimento di risorse** a favore delle Amministrazioni titolari degli interventi nei 56 Comuni minori del Cratere per un importo complessivo pari a **€ 1.030.731,39**. In particolare, nel secondo semestre 2022, è stato effettuato il trasferimento delle risorse in anticipazione a favore del Comune di Pizzoli (AQ) per l'attuazione dell'intervento *"Urbanizzazione delle aree produttive in località "Fontanelle/Capaturo"* approvato con Delibera CIPESS n. 115/2017, per un importo pari a €

**839.455,95.** Nel mese di dicembre 2022, l'USRC ha inoltre ricevuto dal MEF, previa autorizzazione e richiesta da parte della Struttura di Missione, l'accredito delle risorse relativamente ai seguenti interventi, al quale seguirà il trasferimento da parte dell'USRC a favore delle Amm.ni titolari degli interventi:

- **A04, PIT, "Terre della Baronia"**, a titolarità del Comune di Castel del Monte, per 1.070.743,28 €;
- **A05, PIT "Terre della Pescara"**, a titolarità del Comune di Popoli, per 1.529.546,76 €;
- **"Urbanizzazione delle aree produttive in località "Fontanelle/Capaturo"**, a titolarità del Comune di Pizzoli, per 3.357.823,93 €.

Il sito internet istituzionale dell'USRC rende disponibile l'informativa in ordine allo stato di attuazione del Programma RESTART, al link che segue: [Programma di sviluppo RESTART](#)

A far data dall'anno 2019, l'USRC sta affiancando la Struttura di Missione ed i 56 Comuni del Cratere nella predisposizione, da parte delle Aree Omogenee (AO) del Cratere, di **8 PIT – Progetti Integrati per il Turismo**, a valere sulle risorse disponibili per la **Priorità B – Turismo e Ambiente**.

Con delibera CIPESS n. 16/2020 è stato approvato il primo PIT, **"Terre della Baronia"**, proposto da 5 Comuni del Cratere appartenenti prevalentemente all'**AO n. 4**, per un importo pari a **€ 5.353.716,39**. A partire dal 2021 l'USRC ha supportato la Struttura di Missione nell'istruttoria tecnica degli ulteriori 7 PIT delle restanti Aree Omogenee, propedeutica all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo e del CIPESS. In esito a tale attività, sono stati portati a definizione ed approvati a valere sulla Priorità B del Programma di Sviluppo RESTART:

- il PIT **"Terre della Pescara"**, proposto da 7 Comuni dell'**AO n.5**, per un importo di **7.647.733,78 €**, approvato con Delibera CIPESS n.69/2021;
- il PIT **"Altopiano d'Abruzzo: un museo all'aperto"**, proposto dai 5 Comuni dell'**AO n.6**, per un importo di **9.474.771,15 €**, approvato con Delibera CIPESS n.19/2022.

I PIT hanno l'obiettivo di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico del territorio del Cratere, a completamento e valorizzazione delle azioni di ricostruzione dei borghi, in linea con la vocazione turistica prevalente dell'Area omogenea di appartenenza, mediante interventi fisici affiancati da interventi immateriali di marketing territoriale, volti a conseguire la riconoscibilità dell'offerta territoriale. I **PIT - Progetti integrati per il Turismo** sono diretti a potenziare:

- 1. Turismo storico culturale e religioso;**
- 2. Turismo naturalistico;**
- 3. Turismo dei borghi, delle tradizioni popolari ed enogastronomico.**



## 10.2 PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR

A far data dal settembre 2021, l'USRC sta inoltre lavorando congiuntamente alla Struttura di Missione, al Commissario straordinario per il sisma 2016 ed ai Comuni del Cratere al **Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016**, finanziato per un importo pari a **1,780 Mld€** a valere sulle risorse del **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR** di cui al D.L. n. 59/2021.

La Cabina di coordinamento integrata, istituita ai sensi dell'art.14-bis del D.L. n. 77/2021, presieduta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016, della quale fanno parte il Capo Dipartimento Casa Italia, il Coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, i Presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed i rappresentanti dei Comuni del Cratere 2009 e 2016, nella riunione del 30 settembre 2021 ha approvato il **Programma Unitario di Intervento**, articolato nelle seguenti Macromisure:

- **Macromisura A**, "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi", per la quale sono stanziati **1,08 Mld€**;
- **Macromisura B**, "Rilancio economico e sociale", per la quale sono stanziati **0,70 Mld€**.

Il Programma Unitario di Intervento e le Schede di dettaglio degli interventi finanziabili afferenti alle Macromisure A e B sono pubblicati sul sito del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, ai seguenti link:

[Recovery Fund Aree Sisma, ecco tutti gli interventi finanziabili - https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-sisma-2009-2016/](https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-sisma-2009-2016/)

Nella definizione del Programma, l'USRC ha effettuato il raccordo tecnico-amministrativo tra il territorio del Cratere ed i Soggetti attuatori del Programma, individuati nel Commissario Straordinario per il sisma 2016 e nella Struttura di missione sisma 2009.

### MACROMISURA A

Con riferimento al territorio del Cratere sismico 2009, nella prima fase di attività svolta da ottobre a dicembre 2021, l'USRC ha coordinato la ricognizione degli interventi approvati con Ordinanza commissariale nel dicembre 2021 dalla Cabina di coordinamento integrata (Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 n. 6, 7, 8, 9 del 30 dicembre 2021, n.15 del 31 dicembre 2021), con particolare riguardo alle seguenti linee di intervento della **Misura A** del Programma Unitario di Intervento:

- **sub-misura A.2, obiettivo 1** – "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici pubblici";
- **sub-misura A.3, obiettivo 1** - "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città";
- **sub-misura A.3, obiettivo 3.A** – "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici";
- **sub-misura A.3, obiettivo 3.C** – "Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita";
- **sub-misura A.4, obiettivo 5** - "Investimenti sulla rete stradale comunale".

Le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 di ammissione a finanziamento degli interventi del Programma a valere sulle risorse del Fondo complementare al PNRR sono pubblicate al seguente link: [Ordinanze attuative Fondo PNC Area Sisma -](#)

L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 n. 17 del 14 aprile 2022, come modificata dalla n.32 del 30 giugno 2022, ha disciplinato le procedure per il trasferimento delle risorse alle Amministrazioni responsabili degli interventi finanziati a valere sulla Misura A ed ha individuato gli adempimenti in capo agli Uffici Speciali. Il decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 n.26/PNC del 9 novembre 2022 ha individuato gli interventi ricadenti nei Comuni del doppio Cratere per i quali l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo è competente al trasferimento delle risorse.

Nel primo semestre dell'anno 2022 le attività dell'USRC sono state orientate al supporto ai Comuni per il completamento delle Schede intervento relative alle sub-misure A3.1 ed A4.5 ed al monitoraggio degli adempimenti finalizzati al conseguimento della milestone del 30 giugno 2022 prevista dal DM MEF 15/7/2021. Tutte le attività hanno richiesto un impegno costante ed un continuo raccordo con i Soggetti attuatori del programma ed i Responsabili degli interventi per il rispetto delle serrate scadenze previste.

Con riferimento alle **Schede** relative agli interventi "Rigenerazione urbana" (linea di intervento A3.1) e "Rete stradale comunale" (linea di intervento A4.5), l'USRC ha acquisito e verificato la completezza delle Schede intervento a titolarità dei Comuni del Cratere sisma 2009, aggiornate ed integrate della relativa Sez.3, per la successiva trasmissione alla Cabina di coordinamento integrata entro il termine previsto del 31 marzo 2022.

L'USRC ha inoltre provveduto al coordinamento dei Comuni del cratere ai fini del **monitoraggio attivo degli interventi**, secondo la *timeline* prevista dal cronoprogramma definito dal Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 e dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 per il periodo gennaio-giugno 2022, alla predisposizione della necessaria modulistica, all'acquisizione dai Responsabili degli interventi il Cronoprogramma degli adempimenti intermedi, nonché agli adempimenti connessi al conseguimento della *milestone* del 30 giugno 2022 posta dal DM MEF 15/7/2021, relativa all'approvazione, da parte dei Responsabili degli interventi, dei progetti da porre a base della gara di appalto. Ai fini della *milestone* del 30 giugno 2022, l'USRC ha provveduto, nel rispetto delle tempistiche stringenti previste dal cronoprogramma, ad espletare la verifica di completezza degli adempimenti da parte dei Responsabili degli interventi e a trasmetterne gli esiti ai Soggetti attuatori del Programma.

La Cabina di Coordinamento integrata, nella riunione del **30 giugno 2022**, ha preso atto del **raggiungimento, da parte dei Responsabili degli interventi, della milestone fissata dal MEF per il primo semestre 2022** per gli interventi finanziati a valere sulla Macromisura A.

Nel secondo semestre dell'anno 2022, l'Ufficio ha effettuato la ricognizione delle modalità di attuazione assunte dagli Enti responsabili degli interventi per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, con particolare riguardo alla richiesta di preassegnazione dell'importo del 15% aggiuntivo rispetto all'importo degli interventi approvato con le Ordinanze di dicembre 2021, ai sensi dell'art.29, D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), ovvero delle risorse aggiuntive a valere sul "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili", di cui al co. 7 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti). Le **risorse aggiuntive per far fronte**

**all'adeguamento prezzi** sono state formalmente attribuite con Ordinanza commissariale n. 40 del 21 ottobre 2022 (preassegnazione 15%, Decreto Aiuti-ter) e con Decreto MEF 18 novembre 2022 (risorse aggiuntive, Decreto Aiuti).


Con le Ordinanze n. 32 del 30 giugno 2022, n. 37 del 13 ottobre 2022 e n. 40 del 21 ottobre 2022, sono state approvate le modifiche, correzioni ed integrazioni formali dell'elenco degli interventi di cui all'Ordinanza n.15 del 31 dicembre 2021, in esito alle quali risultano **274 interventi finanziati** per un importo complessivo pari a **123,53 Mln€**, distribuiti sulle diverse linee di intervento come da prospetto che segue:

LINEA DI INTERVENTO	N. INTERVENTI APPROVATI	IMPORTO APPROVATO CON (ORDINANZA N.15/2021)	IMPORTO RISORSE AGGIUNTIVE PER ADEGUAMENTO PREZZI (ORDINANZA N.40/2022 e DECRETO MEF 18/11/2022)
Sub-misura A.2, obiettivo 1 <i>"Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici pubblici"</i>	63	26.831.156,74 €	2.129.505,17 €
Sub-misura A.3, obiettivo 1 <i>"Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"</i>	89	52.468.742,08 €	4.562.700,43 €
Sub-misura A.3, obiettivo 3.A <i>"Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici"</i>	4	2.200.000,00 €	-
Sub-misura A.3, obiettivo 3.C <i>"Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita"</i>	62	27.221.282,80 €	2.903.192,40 €
Sub-misura A.4, obiettivo 5 <i>"Investimenti sulla rete stradale comunale"</i>	56	14.806.628,29 €	1.210.809,83 €
<b>TOTALE</b>	<b>274</b>	<b>123.527.809,91 €</b>	<b>10.806.207,83 €</b>

L'USRC ha provveduto al **trasferimento** a favore di 46 Enti responsabili degli interventi delle **risorse in anticipazione**, pari al **30%** dell'importo finanziato, per un importo complessivo pari a **23,45 Mln€**.

L'Ufficio sta attualmente lavorando per gli adempimenti previsti per la **milestone** del **31 dicembre 2022**, termine entro il quale gli Enti responsabili degli interventi devono conseguire, ai sensi del cronoprogramma procedurale di cui al DM MEF 15/7/2021, l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori o delle prestazioni oggetto d'appalto.

Gli interventi della **Macromisura A** intendono accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale attraverso l'innalzamento della sicurezza degli edifici, delle comunità e del territorio, e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Le risorse finanziarie assegnate ai Comuni del Cratere sisma 2009, per complessivi **123,53 Mln€**, sono destinate per il **22%** ad interventi su impianti sportivi, ricreativi e di risalita (linea di intervento **A3.3c**), per il **22%** ad interventi di rifunzionalizzazione sismica e/o energetica di edifici pubblici (linea di intervento **A2.1**), per il **12%** ad investimenti per l'adeguamento della rete stradale comunale, finalizzati alla realizzazione, adeguamento, riqualificazione o messa in sicurezza della viabilità di proprietà comunale. Il **2%** delle risorse è destinato all'implementazione dei 4 interventi sui **Cammini culturali, tematici e storici** (linea di intervento **A3.3a**), che interessano il territorio di 34 Comuni del Cratere, attraversando il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, per i quali l'USRC è Responsabile dell'intervento. La quota prevalente delle risorse, pari al **42%** del totale finanziato, è destinata ad interventi di **rigenerazione urbana dei borghi** (linea di intervento **A3.1**), da progettare e realizzare nell'ambito di un programma unitario inclusivo anche degli interventi finanziati a valere sulle risorse della ricostruzione. Tipologicamente, gli interventi di rigenerazione urbana sono orientati per il 71% alla riqualificazione dello spazio pubblico urbano, per il 28% all'implementazione di infrastrutture verdi, sportive, di mobilità lenta e pedonalità e per una residuale quota dell'1% all'implementazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. La dotazione della Linea di intervento A3.1 - *"Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"*, su iniziativa dei Soggetti attuatori del Programma, è stata incrementata con ulteriori risorse a valere sui fondi della ricostruzione 2009 e 2016, per assicurare agli interventi la dimensione finanziaria ottimale per conseguire l'obiettivo di miglioramento della qualità dei luoghi. Per i Comuni del Cratere 2009, gli interventi di rigenerazione urbana già finanziati a valere sulle risorse del PNC saranno pertanto sinergicamente integrati, nell'ambito di un Programma unitario di Rigenerazione urbana, con interventi da finanziare a valere su ulteriori risorse per la ricostruzione 2009.

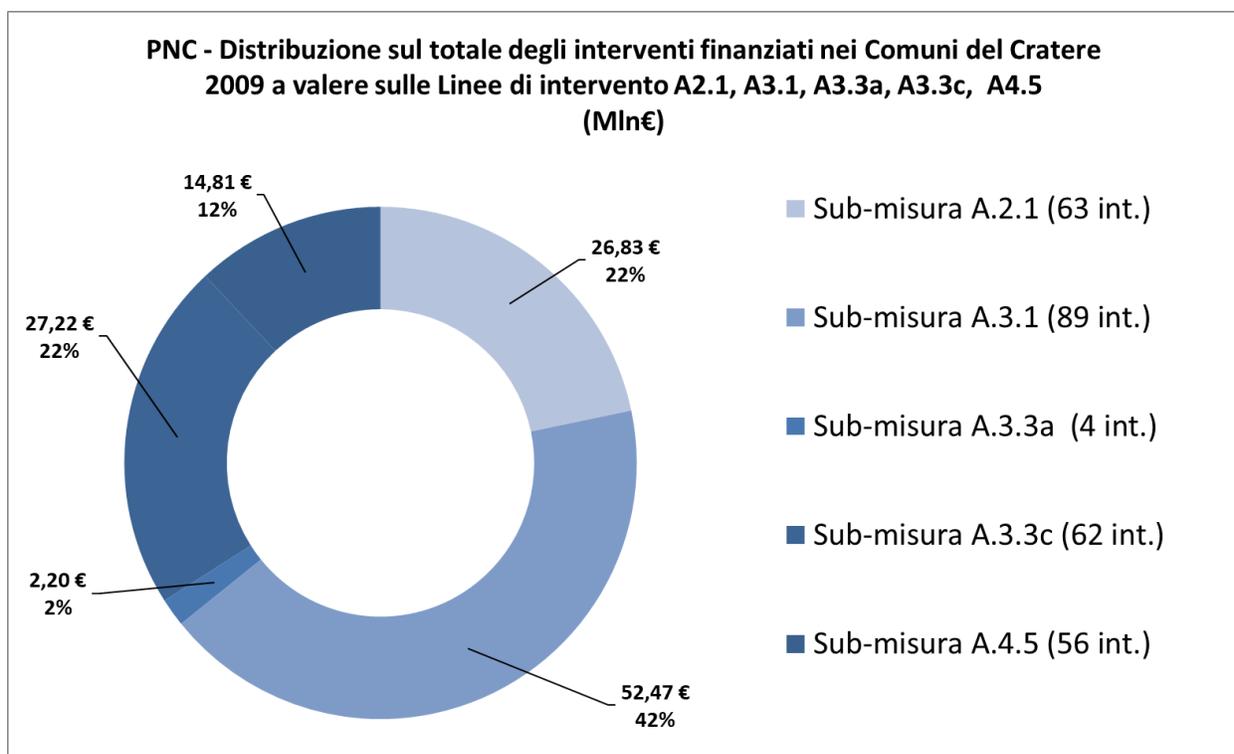

Le informazioni e gli aggiornamenti relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR sono inoltre disponibili anche nella sezione "Sviluppo del territorio" del sito istituzionale dell'USRC, nelle pagine dedicate, ai seguenti link:

[Misure per il Rilancio e lo Sviluppo](#)  
[Interventi Approvati - Misura A](#)

Nell'ambito della **Macromisura A**, Linee di Intervento **A2.3** e **A2.4**, nel secondo semestre 2022 è stato aperto dai Soggetti attuatori del Programma di interventi il bando per la presentazione di progetti, rivolto a enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso **comunità energetiche** per la condivisione dell'energia, con una dotazione complessiva sui due Crateri sismici pari a **68 mln€** ([Comunità energetiche - Next Appennino](#)).

## MACROMISURA B

Gli interventi della **Macromisura B** sono destinati al rilancio economico e sociale del territorio. Intendono promuovere e sostenere investimenti in grado di far emergere e rafforzare le potenzialità economiche del territorio, e di valorizzare al tempo stesso le specificità economiche locali e le diverse forme di innovazione, attraverso interventi dedicati, differenziati per obiettivi, beneficiari, procedure di accesso, regimi di aiuto sottostanti, attività e spese ammissibili, forma e intensità delle agevolazioni.

La Cabina di Coordinamento integrata nella riunione del 30 giugno 2022, nel rispetto delle stringenti tempistiche dettate dal cronoprogramma di cui al DM MEF 15/7/2021, ha approvato i bandi della Macromisura B, oggetto delle Ordinanze del Commissario straordinario per il sisma 2016 n. 20 e 21 del 27 giugno 2022, n. 25, 26, 27, 29, 30 del 30 giugno 2022.

Il pacchetto approva le prime misure a sostegno dell'economia dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016 e mira a favorire lo sviluppo, la crescita occupazionale, l'inclusione sociale, anche attraverso il terzo settore, il turismo, la cultura, l'economia circolare, il riuso delle macerie, la filiera del legno ed agroalimentare e le comunità energetiche nei due crateri sismici 2009 e 2016. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016.

Nel novembre 2022 si sono chiusi i bandi del programma NextAppennino destinati alle imprese dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016.

Nei due Crateri sismici, a fronte di 615 mln€ resi disponibili sotto forma di agevolazioni sui nuovi investimenti, sono stati presentati 2.541 progetti di investimento, per un valore complessivo di 2,541 Mld€, con la richiesta di 1,49 Mld€ di contributi, relativi ai seguenti bandi:

- **B.1.1** "Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria" (dotazione finanziaria: 80 mln€);
- **B.1.2** "Interventi per progettualità di dimensione intermedia"/ **B.3.3** "Ciclo delle macerie" (dotazione finanziaria: 110 mln€);
- **B.1.3a** "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori"(dotazione finanziaria: 100 mln€);
- **B.1.3b** "Interventi per l'innovazione diffusa"(dotazione finanziaria: 58 mln€);
- **B.1.3c** "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" (dotazione finanziaria: 40 mln€);
- **B.2.1** "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore" (dotazione finanziaria: 60 mln€);
- **B.2.2** "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" (dotazione finanziaria: 80 mln€);
- **B.2.3** "Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità" (dotazione finanziaria: 40 mln€);

- **B.3.2** "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica" (dotazione finanziaria: 47 mln€).

Le agevolazioni richieste provengono per il 79,3% dal cratere sisma 2016 e per il restante 22,7% dal cratere 2009 (fonte: Commissario ricostruzione sisma 2016, *Rapporto PNC Esito Bandi*, Novembre 2022, [NextAppennino: chiusi i bandi per le imprese presentati 2.541 progetti per 2,3 miliardi](#)).

Le informazioni sulle misure previste e sui i relativi bandi sono pubblicati sul sito [Next Appennino](#).

### 10.3 PROGETTUALITA' PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

In tema di **valorizzazione turistica del territorio**, l'USRC già dal 2020 ha dato avvio all'implementazione di **"STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE"**, un quadro di area vasta delle risorse turistiche del territorio del Cratere, composto dall'analisi dei principali tematismi/valori e dalla sintesi degli stessi in una Visione guida, che mette a sistema le emergenze puntuali di valore storico, architettonico e naturalistico ed i percorsi fisici e tematici che le collegano, con l'obiettivo di delineare un sistema integrato di fruizione e conoscenza dei luoghi, funzionale a consolidare l'identità e la cultura del territorio.

La Visione guida e le analisi ad essa presupposte sono rese disponibili ai Comuni del Cratere, quale strumento a supporto delle decisioni e delle proposte di intervento in materia di sviluppo del territorio, sul sito istituzionale dell'USRC, al seguente link: [Strategie sviluppo turistico](#)

Sulla base delle "STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE", l'USRC ha predisposto nel 2021 il Progetto **«Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani»**, per un importo previsionale di 70 Mln €, entrato a far parte, insieme ad altre 73 proposte progettuali regionali, della "Banca progetti" della Regione Abruzzo, oggetto della proposta-contributo al **PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** *"L'Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese"*, inviata il 15 ottobre 2020 dalla Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri agli Affari europei e agli Affari regionali. Il documento è disponibile al seguente link: [Regione Abruzzo. L' Abruzzo e il PNRR](#).

In vista delle opportunità offerte dal PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'USRC ha sviluppato, oltre *OPEN ABRUZZO*, altre progettualità rivolte all'intero territorio del Cratere.

La proposta progettuale **"ABRUZZO WAY OF LIFE"** è stata sviluppata dall'USRC a beneficio dei Comuni del Cratere sismico 2009, in risposta alle criticità rilevate sul territorio legate alla condizione di fragilità e di isolamento e confinamento territoriale dei soggetti fragili, in particolare anziani, presenti in alta percentuale nel territorio. Il progetto intende pertanto contrastare il fenomeno della marginalizzazione e sviluppare l'identità territoriale dei borghi come luoghi ad elevato grado di benessere e di salute per la comunità, attraverso la creazione di una serie di strumenti che migliorino la condizione di vita dei cittadini. Nell'ambito del progetto **"ABRUZZO WAY OF LIFE"**, l'USRC è risultato vincitore, assieme alla Regione Abruzzo, della **2nd Open Call lanciata dall'Horizon Pilot Project Gatekeeper**, attraverso la proposta **"Abruzzo That Cares"**, una delle 4 iniziative di intervento in cui è articolato il più ampio progetto "Abruzzo Way of Life. **"Abruzzo That Cares"**, che rappresenta il **vero project core** di "Abruzzo way of life",

coniuga l'uso delle più moderne tecnologie digitali con le esigenze di superare l'isolamento/confinamento territoriale e di garantire un costante monitoraggio della salute dei soggetti fragili, attraverso un nuovo modello di assistenza non più ospedale-centrico bensì paziente-centrico. La proposta specificatamente intende creare servizi digitali per garantire l'accesso a servizi efficienti e semplici alle persone più deboli per promuovere quel processo di resilienza individuale e collettivo nel fronteggiare eventi emergenziali, nella prestazione di professionalità ed erogazione di servizi continuativi.

La proposta progettuale **"ABRUZZO LAB: RIABITARE CON L'ARTE"**, sviluppata da USRC, intende promuovere lo sviluppo locale dei comuni del cratere attraverso l'insediamento di una comunità artistico culturale internazionale nei territori delle Aree Omogenee del Cratere 2009 e trasformare i comuni in laboratori dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Offrire occasioni sociali di incontro e condivisione per le comunità locali e di contatto e scambio con l'esterno attraverso la creazione di un centro culturale, che possa nel tempo diventare luogo di ritrovo per artisti, amanti dell'arte e turisti in genere, contribuisce all'intento di voler sviluppare una nuova strategia di sviluppo territoriale a base culturale, capace di coniugare la visibilità globale dell'Abruzzo, i network e lo storytelling degli artisti, con i valori, le tradizioni e le memorie dei luoghi radicati nell'arte e nella storia. Questo progetto trova ispirazione nell'iniziativa di minore dimensione **"LAB-8: Riabitare con l'arte"** e dalle nuove prospettive di crescita che quest'ultima, in attuazione nei mesi di giugno - settembre 2021, ha saputo innescare sul territorio dell'Area Omogenea 8, oggetto d'intervento. L'USRC ha supportato il progetto LAB-8 "Riabitare con l'arte" promosso da CARSA s.r.l., finanziato a valere sulle risorse 2019 dei fondi RESTART - filone C dedicato allo sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere. Il ruolo di supporto dell'USRC ha favorito sia un migliore coordinamento tra gli addetti ai lavori, sia una migliore strategia di promozione del progetto, attraverso un processo di integrazione e messa in rete di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti. L'obiettivo di **"ABRUZZO LAB: RIABITARE CON L'ARTE"** è rendere più esteso e duraturo il processo di insediamento di una comunità artistico-culturale internazionale, avviato con il progetto di minore dimensione "LAB-8: Riabitare con l'arte", producendo effetti economico-sociali a sostegno della ricostruzione materiale. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare i seguenti link:  
<https://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/in-evidenza>  
<https://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/in-evidenza/1012-lab-8-riabitare-con-l-arte-pillole>

## 11. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE



L'USRC gestisce le attività di rilevazione dei fabbisogni finanziari e di programmazione della spesa in raccordo con le Strutture Centrali ed alloca le risorse agli Enti beneficiari dei trasferimenti/contributi tramite emissione di ordinativi secondari di contabilità speciale, ottemperando alle prescrizioni normative circa le modalità e i termini di rendicontazione alla competente RTS.

Si consolidano nel corso 2022 le procedure legate all'adozione in via sperimentale di un nuovo sistema di contabilità unificata per la gestione della C.S.

5731.

Tale progetto, unito ad una più ampia revisione dei processi di spesa, garantisce il raggiungimento di sempre più elevati livelli di razionalizzazione delle procedure e di riduzione dei tempi di pagamento.

A far data dall'aprile 2013, sono stati eseguiti n. **13.615** mandati di pagamento per un totale **€ 1.742.564.175,45** (dato al 15/12/2022).

Nel corso del secondo semestre del 2022 sono stati eseguiti n. **1171** mandati di pagamento per complessivi **€ 121.523.058,66**.

Per il dettaglio si veda il sito <http://www.usrc.it/ammtrasparente.aspx>

Di seguito alcune delle principali attività di gestione fondi dell'USRC oltre quelli della ricostruzione privata, OO.PP., ed edilizia scolastica.

### 11.1 SPESE OBBLIGATORIE

L'USRC esegue l'istruttoria delle rendicontazioni effettuate dai Comuni sul portale di interscambio AVEIANET dove gli stessi possono compilare le schede relative alle diverse tipologie di spesa (CAS, LOCAZIONE TEMPORANEA ALLOGGI, TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO, CONTRATTI DI LOCAZIONE) al fine di richiedere il trasferimento dei fondi.

L'attuale normativa non prevede forme di finanziamento per le misure assistenziali "C.A.S." e "Locazioni/Affitti concordati" relativamente alle annualità successive al 2019. L'Ufficio pertanto istruisce le sole istanze tardivamente pervenute dagli Enti di riferimento.

Si conclude invece positivamente l'interlocuzione con le strutture centrali ai fini dell'assegnazione di nuove risorse per il finanziamento delle spese inerenti al "trasloco e deposito temporaneo del mobilio" – Art. 5 OPCM n. 3797/2009. Per tale misura assistenziale la Deliberazione CIPE n. 114/2017 aveva assegnato all'Usrc risorse per il triennio 2017/2019.

In considerazione dell'effettivo perdurare per gli anni dal 2020 al 2023 di esigenze finanziarie analoghe a quelle scorse, nel corso del 2022 l'Ufficio ha richiesto ai Comuni la quantificazione dei fabbisogni finanziari per le annualità ancora non finanziate e ha operato una puntuale ricognizione delle risorse residue ai fini della riprogrammazione delle stesse a totale o parziale copertura delle esigenze per le annualità dal 2020 al 2023.

Pertanto, a conclusione dell'iter di perfezionamento della delibera Cipess di riferimento saranno prevedibilmente disponibili nel 2023 le ulteriori somme necessarie per il finanziamento della misura assistenziale "trasloco e deposito temporaneo del mobilio".

Nel corso del secondo semestre 2022 è stato trasferito in favore dei Comuni del Cratere e Fuori Cratere l'importo di **€ 49.668,63** così suddiviso:

- **€ 16.800,00** per contributo di autonoma sistemazione;
- **€ 32.868,63** per trasloco e deposito temporaneo del mobilio;

per un **totale complessivo annuo di € 153.629,47** così suddiviso:

- **€ 41.720,00** per contributo di autonoma sistemazione;
- **€ 22.920,00** per contratti di locazione;
- **€ 88.989,47** per trasloco e deposito temporaneo del mobilio;

#### 11.2 CO.CO.CO.

Viene confermato dalla Legge di Bilancio 2022 il finanziamento delle spese del personale assunto ai sensi della normativa emergenziale dai Comuni del Cratere.

Nel corso del secondo semestre del 2022 è stato trasferito dall'USRC agli Enti titolari dei rapporti di lavoro l'importo di € 315.726,22 **per un totale complessivo annuo pari ad € 936.146,27** ripartito come segue:

- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2017 € 20.630,27
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2018 € 21.600,00
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2019 € 30.600,00
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2020 € 102.457,91
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2021 € 587.304,14
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2022 € 173.553,95

### 11.3 VIDEOSORVEGLIANZA

Nel corso del 2022 sono stati erogati fondi per il finanziamento del "Safe Community – Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico" per un importo complessivo pari ad **€ 269.869,54** e sono stati assegnati complessivi **€ 248.235,68**.

Erogazioni	
Gagliano Aterno	€ 7.340,53
Brittoli	€ 3.957,46
Cagnano Amiterno	€ 31.993,28
Pizzoli	€ 44.000,00
Caporciano	€ 53.015,45
Torre De' Passeri	€ 37.600,00
Castelli	€ 6.989,42
Rocca di Mezzo	€ 44.993,60
Goriano Sicoli	€ 8.000,00
Rocca Di Cambio	€ 31.979,80

Assegnazioni	
Caporciano	€ 66.269,32
Rocca di Cambio	€ 39.974,76
Cagnano Amiterno	€ 39.991,60
Pizzoli	€ 55.000,00
Torre De' Passeri	€ 47.000,00

#### 11.4 TRASFERIMENTI PNC/PNRR

Nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR l'USRC, dopo aver verificato la completezza degli atti approvati dagli Enti Responsabili degli interventi, trasferisce a questi ultimi le risorse finanziarie nelle misure stabilite con Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e tiene una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati.

Al 15/12/2022 sono state trasferite risorse finanziarie a 46 Enti Responsabili degli interventi (su 56) per un totale di € 23.449.864,22.

<b>Erogazioni</b>			
Acciano	€ 501.061,06	Goriano Sicoli	€ 418.355,17
Arsita	€ 411.514,43	Montebello di Bertona	€ 410.971,44
Barete	€ 179.545,39	Montereale	€ 182.770,16
Barisciano	€ 1.012.710,90	Montorio al Vomano	€ 867.445,20
Brittoli	€ 322.679,98	Navelli	€ 593.753,62
Bugnara	€ 485.077,58	Ovindoli	€ 581.045,70
Bussi sul Tirino	€ 794.126,00	Penna Sant'Andrea	€ 542.179,33
Cagnano Amiterno	€ 362.988,84	Pizzoli	€ 280.800,00
Campotosto	€ 269.320,54	Poggio Picenze	€ 649.797,43
Capestrano	€ 571.588,42	Popoli	€ 1.248.961,15
Capitignano	€ 89.139,03	Prata d' Ansidonia	€ 411.435,35
Caporciano	€ 419.669,50	Rocca di Cambio	€ 495.905,70
Castel del Monte	€ 438.478,38	Rocca di Mezzo	€ 850.856,26
Castelli	€ 113.699,70	San Demetrio nè Vestini	€ 1.007.349,17
Castelvecchio Subequo	€ 501.184,24	San Pio delle Camere	€ 555.135,96
Civitella Casanova	€ 657.258,41	Sant'Eusanio Forconese	€ 516.717,34
Cocullo	€ 330.631,66	Santo Stefano di Sessanio	€ 355.043,15

Erogazioni			
Collarmele	€ 424.554,97	Tione degli Abruzzi	€ 475.288,20
Colledara	€ 259.782,71	Tornimparte	€ 982.119,68
Cugnoli	€ 524.280,28	Torre dè Passeri	€ 778.878,27
Fano Adriano	€ 285.153,12	Tossicia	€ 75.932,40
Fontecchio	€ 467.196,26	Villa Sant' Angelo	€ 474.792,86
Gagliano Aterno	€ 372.689,28	Consiglio Regionale Abruzzo	€ 900.000,00

### 11.5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'USRC

Nel corso del secondo semestre del 2022 sono state gestite **201 fatture** per un importo complessivo di **€ 604.735,21 oltre IVA**, tutte gestite nei tempi di legge e con un tempo di liquidazione mediamente inferiore di 7 giorni rispetto alla scadenza della fattura. Gli indici di tempestività dei pagamenti sono consultabili [al link https://usrc.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione.html](https://usrc.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione.html)

Sul piano organizzativo, l'attività di liquidazione è stata incanalata in un processo disciplinato con disposizione di servizio del responsabile dell'Ufficio e la cui caratteristica essenziale è la previsione di tre livelli di controllo interno da attuarsi sull'istruttoria tecnico-amministrativa, sulla bozza di determinazione e sugli adempimenti obbligatori in tema di trasparenza. I tre livelli di controllo, di pari passo con l'approvazione di nuovi modelli di atti interni e provvedimenti, oltre a scongiurare eventuali comportamenti rilevanti sotto il profilo della prevenzione della corruzione, hanno consentito anche un'implementazione della qualità degli atti.

## 12. EVENTI ISTITUZIONALI, CONVEGNI E RELAZIONI ESTERNE

Nell'ambito delle attività istituzionali, delle attività di partecipazione a gruppi di lavoro, tavoli tecnici, incontri e delle attività di pianificazione e promozione di eventi, iniziative finalizzate alla promozione dell'immagine dell'Ufficio e alla promozione e allo sviluppo del territorio dei 56 comuni del Cratere, si riportano di seguito gli appuntamenti di maggiore prestigio a cui ha preso parte l'Ufficio.

**31 gennaio PROGETTO DISCE** (Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies) - Focus Group

All'Ufficio Speciale è stato chiesto di offrire il proprio contributo nel confronto svolto in occasione del **Focus group** organizzato dal Progetto DISCE per affrontare le tematiche legate alle politiche culturali della

città dell'Aquila e del suo territorio e contribuire all'obiettivo progettuale generale di comprendere e favorire lo sviluppo di economie creative sostenibili e inclusive d'Europa.

#### **9 aprile PROCIDA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA – Cerimonia Inaugurale**

In occasione della Cerimonia inaugurale di Procida Capitale della Cultura 2022 l'Ufficio Speciale è stato ospite dell'evento, quale rappresentante di numerose comunità delle aree interne dell'Abruzzo, dove esperienze culturali basate sul tema dell'accoglienza, della cura, della partecipazione delle comunità, in linea con la visione portata avanti da Procida, rappresentano esempi di iniziative in cui viene percepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale quale fattore di sviluppo economico, di benessere collettivo e di inclusione sociale.

#### **9 aprile METTERE IN RETE LA CONOSCENZA – Strumenti per rafforzare la resilienza delle comunità**

L'USRC ha presenziato al lancio del **"Toolkit for Disaster Preparedness"**, realizzato all'interno del progetto **"Territori Aperti"**, con l'obiettivo di fornire uno strumento, che attraverso la capitalizzazione di esperienze pregresse relative ai sismi 2009 e 2016, offra soluzioni per migliorare la prevenzione dei disastri nonché la risposta agli stessi. L'USRC ha contribuito al progetto ospitando i tirocini degli allievi del Master, seguendone i lavori finali in qualità di correlatore su temi riguardanti le infrastrutture urbane, la pianificazione ed il ruolo dell'USRC all'interno della governance dello sviluppo.

#### **9 giugno LABORATORIO DI IDEE "PNRR E FONDO COMPLEMENTARE PER INVESTIRE SUL TERRITORIO"**

Si è trattato di un'iniziativa in cui grazie alla partecipazione della Struttura Commissariale del Sisma 2016, dei Sub Commissari per la ricostruzione sisma 2016 e dell'Ufficio Speciale sono state illustrate **l'opportunità di crescita e sviluppo** che il **Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** offre, attraverso l'illustrazione dei numerosi interventi finanziati sui territori dell'Appennino centrale.

#### **21 – 24 - 28 giugno GOOD PUBLIC MANAGEMENT: ADVANCED SKILLS FOR PUBLIC OFFICIALS - Workshop EPSA**

- **Strategic workforce planning and talent management;**
- **Diverse Workforce and New Work: Inclusiveness and gender mainstreaming;**
- **Green Transition.**

A seguito dell'assegnazione del premio **"Good Practice Certificate"** per il Progetto **"Digital for Reconstruction grants"**, selezionato tra le **11 Best Practices** a livello europeo in occasione della competizione "Costruire un'Europa migliore per i cittadini", promossa da **EPSA (European Public Sector Awards)**, sistema di riconoscimento a livello europeo dedicato allo scambio e condivisione di soluzioni innovative e particolarmente efficienti all'interno delle PA, l'Ufficio Speciale ha preso parte ai workshop sostenuti dalla Commissione europea, direzione generale del Sostegno alle riforme strutturali (DG REFORM). Obiettivo generale degli incontri è quello di consentire agli amministratori pubblici di migliorare la loro capacità di progettare e attuare riforme innovative in tempi di ripresa.

#### **25 – 26 giugno – TEDx L'AQUILA.** L'Ufficio è stato partner organizzativo del Villaggio esperienziale **TEDx**

**L'Aquila**, evento ispirato ai TEDx, **Technology Entertainment Design**, organizzati in tutto il mondo e che ha visto la partecipazione di personaggi di spicco della cultura internazionale che hanno raccontato il loro punto di vista sul tema limiti. Anche la realtà dei nostri borghi è stata raccontata attraverso la voce di un artista internazionale e di alcuni rappresentanti del territorio (amministratori locali, esperti d'arte e cultura) che portando a testimonianza la propria esperienza di vita, hanno dato al pubblico la propria visione del concetto limiti e della sua declinazione rispetto al territorio che hanno scelto di abitare.

**21 – 23 Settembre 2022 - Ferrara RemTech Expo 2022.** L'USRC ha preso parte all'evento RemTech Expo 2022, evento internazionale specializzato sulla protezione e lo sviluppo sostenibile del territorio, le bonifiche dei siti contaminati, le coste e i porti, il dissesto idrogeologico, i cambiamenti climatici, il rischio sismico, la rigenerazione urbana e l'industria chimica sostenibile.

In particolare, l'Ufficio è stato protagonista delle sessioni dedicate al Codice della ricostruzione, insieme alle testimonianze abruzzesi dell'USRA 2009 e dell'USR 2016, nonché da parte di chi si trova a gestire il terremoto dell'Emilia, padroni di casa, dell'Italia centrale, del sisma nel catanese e di quello di Ischia 2017.

**9 - 10 novembre - EPSA 2021 High Level Conference - Trends and future developments in European public administration.** USRC ha partecipato alle giornate conclusive di EPSA (European Public Sector Award) 2021 promosse ed organizzate da EIPA (European Institute of Public Administration) ad Amsterdam. Durante la conferenza del 9 novembre sono intervenuti relatori di spicco delle principali istituzioni europee (tra cui EIPA, Commissione Europea, OCSE) che hanno affrontato temi relativi all'innovazione del settore pubblico in Europa quali in particolare l'attuale situazione, le sfide e le prospettive future, l'open-government e l'approccio collaborativo tra pubblica amministrazione, stakeholders e comunità, gli strumenti ed i mezzi per promuovere l'innovazione; inoltre i rappresentanti di alcune comunità nazionali hanno presentato best practices di promozione dell'innovazione nel settore pubblico e si sono confrontati sui fattori su cui far leva per incentivare l'innovazione nella PA.

**12 dicembre, Auditorium del Parco a L'Aquila, Presentazione del "Libro Bianco sulla Ricostruzione Privata dei Centri Storici nei Comuni Colpiti dal Sisma Abruzzo 2009"**, curato dal Dipartimento della Protezione Civile, da ReLUIS, dal CNR, nonché dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell'Aquila (USRA) e dei Comuni del Cratere (USRC), alla presenza del Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, del Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, del Titolare dell'USRA, Salvatore Provenzano, del Titolare dell'USRC, Raffaello Fico, del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del Coordinatore della Struttura di missione, Carlo Presenti, del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, del vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Marco Villani, del Coordinatore della linea "Analisi dati post-sisma" della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria sismica, Marco Di Ludovico. Il testo restituisce una lettura omogenea in termini di danni e costi riportati da edifici ed aggregati nei centri storici del Cratere sismico 2009. Avvalendosi delle competenze dell'USRC e dei dati parametrici della Scheda MIC, è stato fornito un confronto in termini di costi di intervento a parità di esito di agibilità e di livello di danno globale degli edifici dentro e fuori i centri storici, tenendo conto anche di ciascuna tipologia di vincolo presente sull'edificio. Dal confronto con il primo Libro Bianco relativo alla ricostruzione privata fuori dai centri storici, pubblicato nel 2015, il Libro Bianco sulla ricostruzione dei centri storici, dà evidenza della rilevante complessità in termini esecutivi ed economico-finanziari degli interventi di ricostruzione post sisma nei centri storici e si pone pertanto come contributo alle politiche nazionali di emergenza e ricostruzione post-sismica. La presentazione del Libro Bianco è stata occasione per i partecipanti di discutere su un quadro normativo che consenta di avere un riferimento omogeneo in caso di ricostruzione successiva ad eventi emergenziali e di garantire una veloce transizione tra la fase di

emergenza e quella ordinaria. Il documento sulla ricostruzione nei centri storici colpiti dal sisma Abruzzo 2009 è scaricabile dalla pagina: [reluis.it/divulgazioni/pubblicazioni](http://reluis.it/divulgazioni/pubblicazioni)

Nell'ambito della partecipazione a gruppi di lavoro, tavoli tecnici, l'Ufficio ha preso parte ai seguenti incontri:

**11 - 13 febbraio Workshop "Visione futura del Paese di Montorio" con la partecipazione del Politecnico di Milano**

**24 aprile Tavola Rotonda "Una nuova casa di comunità per Gagliano Aterno e la Valle Subequana"**

**5 luglio Workshop "Retelling the Rural Caporciano"**

Inoltre, tra le iniziative di promozione dell'immagine dell'Ufficio e di promozione e sviluppo del territorio che rappresenta, è in corso di redazione il **Piano di Comunicazione esterna**, che prevede tra l'altro, l'aggiornamento quotidiano dei canali social, la definizione della linea editoriale del sito web e di ogni altro mezzo di comunicazione.

## CREDITS

- Copertina [<https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/castelli-di-fondazione-dellaquila-fossa-il-baronato-del-gran-rifiuto.html>]
- pag.8 [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centro\\_storico\\_Navelli.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centro_storico_Navelli.jpg) - Sayatek, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons ]
- pag.12 [<https://www.fmdos.cl/noticias/santo-stefano-di-sessanio-pueblo-en-italia-ofrece-casi-10-mil-dolares-por-mudarte-alla/> ]
- pag.24 [[https://abruzzoturismo.it/sites/default/files/2020-09/800px-Corno\\_grande\\_e\\_Pietracamela%2C\\_Gran\\_Sasso%2C\\_Provinc\\_e\\_of\\_Teramo%2C\\_Abruzzo%2C\\_Italy\\_-\\_panoramio.jpg](https://abruzzoturismo.it/sites/default/files/2020-09/800px-Corno_grande_e_Pietracamela%2C_Gran_Sasso%2C_Provinc_e_of_Teramo%2C_Abruzzo%2C_Italy_-_panoramio.jpg) ]
- pag.33 [<https://i0.wp.com/www.abruzzo-segreto.it/wp-content/uploads/Veduta-aerea-Chiesa-di-Madonna-del-Campo-03.jpg?fit=1920%2C1280&ssl=1>]
- Tutte le illustrazioni [<https://www.freepik.com/pch-vector/>]
