

# LE ATTIVITÀ DI USRC AD OGGI

NOTA INFORMATIVA  
PRIMO SEMESTRE ANNO 2022



# SOMMARIO

## **USRC: PRINCIPALI RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2022**

### **1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE**

### **2. PIANI DI RICOSTRUZIONE**

### **3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE**

3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

3.2 MIC – MODELLO INTEGRATO CRATERE

3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

### **4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE**

### **5. GESTIONE FONDI**

5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

### **6. RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

### **7. EDILIZIA SCOLASTICA**

### **8. TRASPARENZA**

8.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

8.2 WEB-GIS

8.3 CONTRATTI

### **9. GESTIONE APPALTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

### **10. SVILUPPO DEL TERRITORIO**

10.1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RESTART

10.2 PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR

10.3 PROGETTUALITA' PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

### **11. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE**

11.1 SPESE OBBLIGATORIE

11.2 CO.CO.CO.

11.3 VIDEOSORVEGLIANZA

11.4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'USRC

### **12. EVENTI ISTITUZIONALI, CONVEGNI E RELAZIONI ESTERNE**

### **CREDITS**

## USRC: PRINCIPALI RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2022



Il primo semestre 2022 ha registrato concreti risultati in ogni settore di attività dell'USRC, con una continua innovazione e digitalizzazione nella gestione dei processi interni ed esterni. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti salienti.

### NUOVE ATTIVITÀ DELL'USRC

La riorganizzazione dell'USRC avviata nel 2021 ha previsto una **nuova macro-struttura**, con un dirigente di Area Tecnica e 6 posizioni organizzative: 3 tecniche per la ricostruzione privata, 1 amministrativa, 1 contabile ed 1 per il personale. La riorganizzazione e la certificazione del fondo apposto per l'incentivo al personale è servita a garantire una gestione più efficace e performante, che hanno consentito di avviare nuove attività su esigenze manifestate dal territorio:

- La necessità di accelerare la ricostruzione pubblica, con l'introduzione, ai sensi del co. 2-bis, art. 54, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, della possibilità che

l'USRC eserciti il ruolo di **sogetto attuatore degli appalti pubblici**, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- La necessità di assicurare il raccordo tra la Cabina di coordinamento integrata, i Soggetti attuatori del programma e gli Enti locali nella attuazione degli interventi finanziati a valere sul **fondo complementare al PNRR di cui al DL 59/2021**;
- La rigenerazione urbana nei centri storici del cratere: ai sensi della L.172/2017 e della **determina** del Titolare dell'USRC n. **1097/2021**, l'USRC, in collaborazione con la Struttura di Missione sisma 2009, ha avviato una importante operazione di sensibilizzazione e ricognizione delle idee progettuali dei 56 comuni del cratere, che porterà l'investimento di ben **300 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana nei borghi**.

Nel seguito si descriveranno queste nuove attività più in dettaglio.

### RISORSE UMANE

Dopo la stabilizzazione delle circa 20 unità con contratto a tempo indeterminato, parte delle quali continuano ad operare per USRC in virtù di una convenzione col Comune dell'Aquila e del Comune di Cugnoli, nel primo semestre 2022

l'USRC ha indetto e svolto un concorso pubblico per 22 figure professionali a tempo determinato, pervenendo alla relativa assunzione nel giugno 2022. Resta da risolvere il problema delle evidenti disparità di trattamento tra figure analoghe per mansioni ma con contratti diversi (MIT; RIPAM EELL; Tempi Determinati; Interinali), che determinano disomogeneità che non aiutano una gestione fluida del personale. Sarà necessario puntare a dare parità di trattamento a chi presta servizio presso l'Ufficio Speciale per poter garantire la migliore gestione delle risorse umane nella ricostruzione 2009.

## CONTABILITA' SPECIALE

Dal 2021 l'Ufficio adotta in via sperimentale un nuovo sistema di contabilità unificata per la gestione della C.S. 5731. Nell'ambito di tale progetto e nell'ottica di una profonda revisione delle procedure di gestione delle attività afferenti alla contabilità, agli atti amministrativi e alla conservazione del flusso documentale è stato acquistato un **nuovo software gestionale** che permette l'integrazione di tali procedure garantendo la massima efficienza del sistema informativo e il raggiungimento di sempre più elevati livelli di performance organizzativa.

L'informatizzazione di tali processi, la semplificazione e la revisione delle procedure si prefigge l'obiettivo di garantire il superamento dei tipici problemi di gestione delle contabilità speciali e di rappresentazione dei rendiconti finanziari perseguendo il più generale principio di **razionalizzazione della spesa pubblica**.

## DIGITALIZZAZIONE

La gestione a distanza del lavoro a causa della pandemia da Covid-19 è diventata una grande opportunità per far viaggiare le pratiche del cratere e fuori cratere in via esclusivamente digitale, eliminando completamente la carta attraverso **l'ulteriore implementazione della piattaforma digitale USRC**, con la introduzione del sistema SPID per l'accesso alla piattaforma, già creata negli anni precedenti per l'acquisizione dei contratti tra privati per la ricostruzione privata; analogo sviluppo è partito per l'acquisizione della documentazione tecnico contabile da parte dei Comuni, per le rendicontazioni obbligatorie da consegnare annualmente alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

È stato completato il **totale restyling del sito usrc**, con un portale dalla veste grafica rinnovata, basato sulle ultime tecnologie, moderno e dinamico, dalla consultazione semplice ed intuitiva, per raccontare una ricostruzione in costante crescita e sempre rivolta verso l'innovazione nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di design, accessibilità, trasparenza e pubblicità, come indicato dalle linee guida AGID (Agenzia per l'Italia digitale), facilmente navigabile da pc, mobile e tablet.

## RICOSTRUZIONE PRIVATA

Questi alcuni dei **principali risultati raggiunti nel primo semestre del 2022** (dati relativi a comuni del Cratere e Fuori Cratere):

- **215 ulteriori istruttorie avviate** in totale dall'USRC e dai suoi Sportelli su progetti di riparazione con miglioramento sismico di aggregati/edifici ricadenti nel Cratere, relative a 1700 immobili;
- **629 pratiche** ricadenti nel Cratere **con cantiere in corso**;
- **201 con cantieri in corso nei comuni Fuori Cratere**;
- **54 pratiche** ricadenti nel Cratere **con lavori avviati** relativi a circa 600 immobili per un valore di **66 Mln €**;
- **6 pratiche con lavori avviati nel 2021 Fuori Cratere**;
- **lavori conclusi per 436 immobili** nel Cratere;
- **lavori conclusi per 184 immobili** nei comuni Fuori Cratere.

Relativamente alla ricostruzione dei comuni colpiti anche dagli eventi del sisma Centro Italia, dopo una prima fase di rallentamento dovuto alla assenza di una normativa speciale per la quantificazione dei danni aggiuntivi, grazie all'introduzione e completa attuazione del Decreto USRC n. 6 pubblicato nel mese di maggio 2020 i comuni colpiti dai due eventi sismici del 2009 e del 2016 sono tra quelli maggiormente attivi in termini istruttori e di ammissioni a contributo. Le ammissioni dall'1/1/2022 al 30/06/2022 per le aree 2 e 3, ammontano infatti a 38 milioni di euro.

Tale risultato è il migliore in termini di importi ammessi semestralmente dal 2009 ad oggi nelle stesse aree.

A partire da aprile 2021 e ogni bimestre, l'USRC pubblica un report sintetico inviato ai comuni del Cratere, anche le immagini di cantieri in partenza e con lavori appena conclusi, al fine di dare diffusione degli esiti della ricostruzione nei centri storici.

Al fine di **accelerare e semplificare le verifiche amministrative** sulle richieste di contributo per gli immobili privati danneggiati dal sisma, l'Ufficio ha ritenuto opportuno chiarire, con specifica **circolare 15 del 27/06/2022**, la valenza delle informazioni desumibili dal catasto e la rilevanza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte dai proprietari degli immobili al fine di attestarne legittimità e destinazioni d'uso.

In particolare, la circolare introdotta chiarisce che ai fini della concessione dei contributi le autocertificazioni prodotte secondo i modelli standard non devono essere necessariamente corredate di documentazione comprovante la veridicità delle stesse, essendo le dichiarazioni stesse sufficienti ai fini delle verifiche di competenza. Vengono evidenziati altresì i casi nei quali si rende necessario un allineamento del catasto prima della concessione del contributo e quelli nei quali invece è possibile procedere al termine dei lavori.

## APPALTI PUBBLICI

L'USRC dall'**estate 2021**, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, **può esercitare il ruolo di soggetto attuatore**

**degli appalti pubblici**, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Ufficio ha sottoscritto convenzioni per la gestione di **15 procedure di gara** in qualità di stazione appaltante. Alla convenzione sottoscritta di recente con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo per la progettazione e l'esecuzione di lavori di recupero di **10 chiese danneggiate** dagli eventi sismici e dislocate sul territorio abruzzese per un importo complessivo pari a circa 10 milioni di euro, ha fatto seguito l'accordo con la Prefettura de L'Aquila e la Soprintendenza per i beni culturali dell'Aquila per un ulteriore intervento a valere sui fondi per l'edilizia di culto (F.E.C.) del valore di euro 1,5 milioni.

Nel dicembre 2021 l'USRC è stato inoltre individuato quale soggetto attuatore per il recupero e la valorizzazione di **4 Cammini storici per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro** nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR, interventi già in fase attuativa ad oggi e per i quali le procedure di gara dovranno essere pubblicate entro la fine del luglio 2022 nel rispetto delle *milestones* previste per fruire dei finanziamenti stanziati nel PNC.

Sono attualmente in via di finalizzazione diverse convenzioni con comuni del cratere che porteranno nelle prossime settimane all'individuazione dell'USRC quale soggetto attuatore o stazione appaltante per ulteriori 9 interventi afferenti al campo della rigenerazione urbana, della messa in sicurezza di territori colpiti da dissesto idrogeologico, del recupero

del patrimonio pubblico e scolastico di valore complessivo di circa 8 milioni di euro.

Le funzioni delegate in materia di appalti pubblici di lavori coinvolgono complessivamente **39 dipendenti** incaricati delle diverse attività tecniche da svolgere di cui **19** nominati formalmente RUP ai sensi del D.lgs n. 50 del 2016.

## EDILIZIA SCOLASTICA

Nel corso del primo semestre 2022 sono state trasferite risorse per **4.510.254,62 €** ed assegnate risorse per **9.610.325,52 €** per l'attuazione degli interventi in corso.

Nel corso del primo semestre 2022 è stata condotta un'attività istruttoria in sinergia con la Struttura di Missione, volta a completare la programmazione della seconda annualità per interventi di edilizia scolastica, parzialmente finalizzata con la deliberazione CIPE 72/2020: l'ulteriore proposta da portare in CIPESS prevede il finanziamento di **6 interventi su altrettanti comuni**, in parte volti al completamento di opere già avviate e in parte per nuovi progetti per un costo complessivo di **ca. 16 milioni di euro**.

## SVILUPPO DEL TERRITORIO

Nell'ambito del **Programma di Sviluppo RESTART**, dopo l'approvazione, nel 2020, del primo PIT - Progetto Integrato per il Turismo (Area Omogenea 4, "*Terre della Baronia*", per un importo di € 5.353.716,39), a far data dal 2021 l'USRC ha affiancato la Struttura di Missione nell'istruttoria dei **PIT - Progetti Integrati per il Turismo** proposti dalle Aree Omogenee

del Cratere 2009, portando a definizione la proposta progettuale dei PIT dell'Area Omogenea n.5, "Terre della Pescara", per un importo di 7.647.733,78 €, e dell'Area Omogenea n.6, "Altopiano d'Abruzzo: un museo all'aperto", per un importo di 9.474.771,15 €.

Dal settembre 2021 l'Ufficio sta lavorando congiuntamente alla Struttura di Missione, al Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ed ai Comuni del Cratere sul **Programma unitario di "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016"**, che ha una dotazione di complessivi 1,78 miliardi € a valere sulle risorse del **Fondo complementare al PNRR**. Alla data del **30 giugno 2022**, in linea con la **milestone** stabilita dal DM MEF 15/7/2021, nei 56 Comuni del Cratere 2009 sono state approvate, dai Responsabili degli interventi, le progettazioni da porre a base della gara di appalto di **278 interventi** riguardanti la rigenerazione urbana, le strade, gli impianti sportivi e la rifunzionalizzazione di edifici pubblici, finanziati a valere sulle **Linee di intervento A2.1, A3.1, A3.3 e A4.5** della **Misura A** del Programma, per un importo complessivo di oltre **123 Mln€**. Per tali interventi sono previsti la pubblicazione dei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti entro il terzo trimestre 2022 e l'aggiudicazione ed avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2022.

## RIGENERAZIONE URBANA - PICC Piano di Interventi Connessi e Complementari

Il 31 maggio 2022 è scaduto il termine per la presentazione da parte dei comuni delle schede volte a richiedere i finanziamenti per opere rientranti nell'ambito dei Piani di Interventi

Connessi e Complementari agli Interventi di ricostruzione Pubblica e Privata:

- Interventi su spazi pubblici
- Interventi su reti di infrastrutture e servizi
- Interventi su dissesti idrogeologici e messa in sicurezza di cavità antropiche rese instabili dal sisma

Sono state complessivamente prodotte 223 schede per un importo complessivo di oltre 330 milioni di euro. Attualmente, in sinergia con la Struttura di Missione, è in corso l'attività istruttoria sul materiale fornito dai comuni, al fine di valutarne i contenuti e la corrispondenza ai criteri di finanziamento dettati dalla determinazione USRC 1097/2021.

Il programma pluriennale che ne deriverà e lo stralcio annuale saranno sottoposti al CIPRESS per l'approvazione e il finanziamento.

Tali interventi sono volti a dare completa attuazione al processo di ricostruzione che dopo la conclusione degli interventi di ricostruzione privata, e il completo ripristino della funzionalità degli Uffici e dei servizi pubblici, troverà il suo pieno compimento con la riqualificazione dei centri storici, delle reti, delle strade e degli spazi pubblici, messi a dura prova con anni di cantieri.

E' stato possibile conseguire tali risultati grazie al fondamentale contributo di tutti gli altri addetti ai lavori, **150** amministrazioni comunali, e circa **5000** tra presidenti di consorzio, progettisti e direttori dei lavori, ditte appaltatrici, subappaltatori e fornitori.

**L'avanzamento della ricostruzione al 30 giugno 2022** nei Comuni del Cratere e fuori Cratere è sinteticamente rappresentato dagli indici che seguono:

Ambito		Numero comuni	Avanzamento	Fabbisogno finanziario residuo
Ricostruzione privata	<b>Comuni Cratere* AO 2-3 (2009-2016)</b>	16	<b>27%</b>	2,2 Mld€
	<b>Comuni Cratere* AO 4-5-6-7-8-9</b>	40	<b>54%</b>	
	<b>Comuni fuori Cratere**</b>	114	<b>51%</b>	0,20 Mld€
Ricostruzione pubblica***	<b>Cratere e fuori Cratere 2009</b>	70	<b>37%</b>	0,46 Mld€
Ricostruzione scuole***	<b>Cratere e fuori Cratere 2009</b>	98	<b>54%</b>	0,13 Mld€

\* L'indice di avanzamento della ricostruzione privata cratere è misurato rispetto ai fabbisogni finanziari stimati, distinto tra AO2-3 e restanti AO; rispetto all'importo delle richieste di contributo effettivamente presentate l'indice per tutte le AO è pari al 72% avendo escluso le già chiuse senza ammissione.

\*\* Avanzamento calcolato come rapporto tra l'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate rispetto all'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

\*\*\* Avanzamento calcolato come rapporto tra l'importo degli interventi in corso/conclusi e l'importo già finanziato. Il fabbisogno finanziario residuo stimato tiene conto degli interventi ancora da programmare attraverso programmi pluriennali e piani annuali ai sensi della L. 125/2015, art.11, co.9.

# 1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE



La Legge 7 agosto 2012, n.134 (cosiddetta “Legge Barca”), artt. 67-bis e 67-ter, ha disposto la cessazione al 31 agosto 2012 dello stato di emergenza successivo al sisma del 6 aprile 2009 ed ha istituito l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, **USRC**), con sede a Fossa (AQ), per le finalità attinenti alla **gestione ordinaria della ricostruzione**, sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, nei territori dei Comuni del Cratere, ad esclusione di L’Aquila, e dei Comuni fuori Cratere (cfr. L.125/2015, art.11, co.13).

L’Intesa<sup>1</sup> dell’agosto 2012, ha disciplinato gli aspetti organizzativi e le competenze istituzionali dell’Ufficio.

La Legge 7 agosto 2012, n.134, ha assegnato all’USRC, tra l’altro, il coordinamento degli otto Uffici territoriali per la ricostruzione (di seguito, UTR), costituiti ai sensi dell’OPCM n.4013 del

2012 dai Comuni di ciascuna Area Omogenea per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati.

Dal 1° luglio 2018 gli UTR sono stati soppressi e le relative competenze sono state trasferite all’USRC (co.32, art.2-bis, L. n.172/2017). Da allora, il Titolare dell’USRC ha in capo la direzione ed il coordinamento esclusivi del personale in servizio presso gli UTR, assegnato anch’esso all’USRC (co.3, art.22, L.55/2019), nonché la gestione del processo di soppressione di detti Uffici attraverso specifici provvedimenti organizzativi e gestionali. In una fase transitoria, sono stati costituiti, tramite convenzioni con i Comuni, 8 Sportelli Decentrati dell’USRC (di seguito, SP) presso le medesime sedi dei soppressi UTR.

A partire dal 2019, la **riorganizzazione** ha avuto maggiore impulso con la soppressione di 4 degli 8 Sportelli Decentrati ed il trasferimento del relativo personale presso la sede dell’USRC a Fossa (AQ). Contestualmente, nell’anno 2019 è stato posto in essere l’accentramento delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, la cui gestione è transitata dai soppressi UTR all’USRC.

In esito all’evoluzione normativa sopra descritta, l’USRC, oltre al **coordinamento del processo di ricostruzione privata**, condotto sin dall’avvio dell’Ufficio nel 2013, ha oggi in capo direttamente anche l’istruttoria tecnico-amministrativa delle **richieste di contributo** per la ricostruzione privata.

---

<sup>1</sup> Intesa sottoscritta ai sensi dell’ art. 67-ter della Legge 7 agosto 2012, n.134.

La competenza per l'istruttoria dei contributi alla ricostruzione privata va ad aggiungersi alle altre competenze assegnate all'Ufficio sin dalla sua istituzione. L'USRC, infatti, cura la programmazione ed istruttoria tecnica degli interventi di **ricostruzione pubblica** e del **Piano "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza"**, cura l'attuazione dei **Piani di Ricostruzione** (dei quali ha effettuato l'istruttoria nel profilo di congruità economica), cura l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, gestisce la **contabilità speciale**, effettua il **monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi**, cura la trasmissione periodica dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, effettua la gestione delle assegnazioni e dei trasferimenti dei fondi per la ricostruzione privata, promuovere l'attrattività e lo **sviluppo economico e sociale del territorio del cratere**.

L'USRC è inoltre competente anche per la ricostruzione dei **Comuni fuori Cratere** (cfr. L. 71/2013, art.7, co.6; L.125/2015, art.11, co.13) per ciò che attiene alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata ed ai trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione; il 30/9/2021 è scaduto il termine per la consegna delle richieste di contributo fuori cratere. Ciò consentirà ragionevolmente di

concludere la ricostruzione privata fuori Cratere nei prossimi 2/3 anni.

Dal 2020 l'attività istruttoria per la ricostruzione privata ha avuto una fase di **significativa crescita ed ottimizzazione di processo**, con l'evasione di più della metà delle pratiche giacenti in attesa di istruttoria. Le misure organizzative adottate per far fronte all'emergenza pandemica da COVID-19, con la conduzione delle attività lavorative in smart working a far data da marzo 2020, hanno assicurato la continuità dell'azione amministrativa, il servizio all'utenza e la conclusione dei procedimenti con documentazione completa

Al contempo, è stata potenziata la **digitalizzazione** delle procedure e degli strumenti di gestione documentale interna ed esterna, nell'obiettivo di realizzare nel breve termine un'amministrazione "full digital" con la totale dematerializzazione degli atti.

Dal 2022 l'USRC ha assunto ulteriori competenze anche nell'ambito del Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, finanziato ai sensi del DL 59/2021 a valere sulle risorse del Fondo complementare al PNRR, relativamente all'attuazione degli interventi a responsabilità dei Comuni del Cratere sisma 2009 diversi da L'Aquila.


## 2. PIANI DI RICOSTRUZIONE

La **Legge n. 77 del 24 giugno 2009**, di conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, all'art.14, co.5-bis, ha previsto che la ricostruzione dei centri storici dei Comuni del cratere avvenga previa predisposizione dei Piani di Ricostruzione, i cui obiettivi, contenuti e procedura di approvazione sono definiti dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010.

Dei 56 Comuni del Cratere, **55 Comuni hanno predisposto il PdR** e sono pervenuti alla conclusione dell'iter di approvazione. Di questi:

- **11 Comuni** hanno raggiunto l'Intesa sul PdR tra Sindaco, Presidente della Provincia e Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, nel corso dello stato di emergenza;
- **44 Comuni** (2 dei quali, Barete e Barisciano, con riferimento agli Ambiti non oggetto di Intesa nella fase emergenziale) hanno ottenuto l'attestazione della congruità economica del PdR con Nulla osta dell'USRC, nella gestione ordinaria.

L'USRC ha stimato le risorse residue occorrenti per la ricostruzione del centro storico di **1 Comune**, Torre de' Passeri, unico nel Cratere a non aver predisposto il PdR, non avendo raggiunto nel corso dello stato di emergenza l'Intesa sulla Perimetrazione del centro storico (art.3, DCD 3/2010).

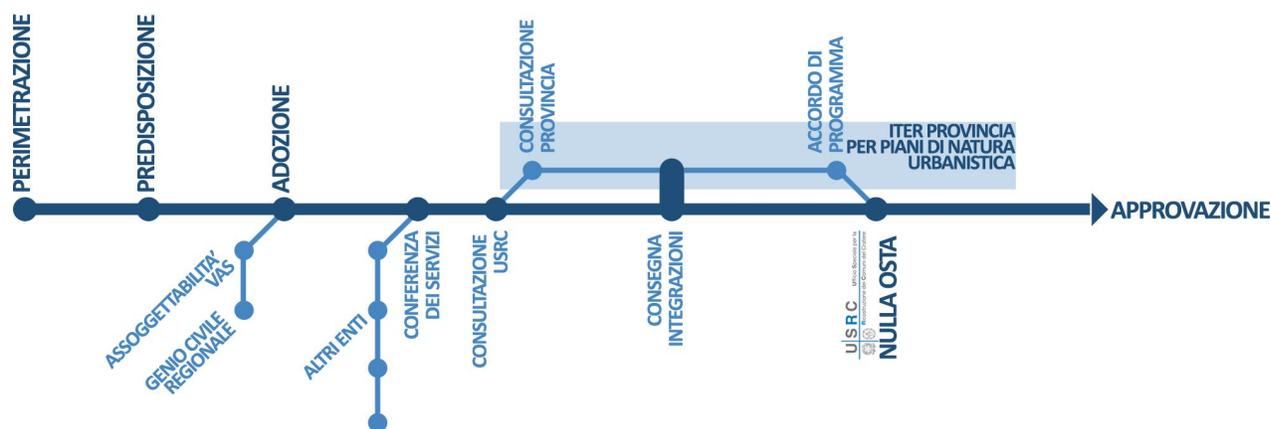



La **Legge n. 134 del 7 agosto 2012**, all'art. 67-quinquies, ha attribuito al Piano di Ricostruzione **natura strategica** come tale, è finalizzato a quantificare le esigenze finanziarie per la ricostruzione e a disciplinare le modalità di attuazione ed il cronoprogramma degli interventi di ricostruzione del centro storico – ovvero, se asseverato dalla Provincia, anche **urbanistica**, qualora abbia contenuti urbanistici che aggiornano, modificano, integrano o sostituiscono gli strumenti di pianificazione vigenti.

Dei Piani di Ricostruzione approvati dai **55 Comuni del Cratere**, **8** hanno **natura strategica**, mentre **47** hanno natura anche **urbanistica**.

A conclusione del processo di pianificazione, il quadro programmatico delle risorse necessarie per la ricostruzione dei centri storici dei 56 Comuni del Cratere ammonta a complessivi **3,4 Mld €**, di cui **3,1 Mld €** per interventi di **ricostruzione privata** e **0,3 Mld €** per interventi di **ricostruzione pubblica**.


## 3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE

### 3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere è stimato un fabbisogno finanziario complessivo pari a **4,75 Mld €**, così articolati:

- **4,1 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati nei centri storici (dei quali **3,1 Mld €** all'interno degli Ambiti dei Piani di Ricostruzione e **1,0 Mld €** all'esterno);
- **0,4 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati fuori dai centri storici ("periferie");
- **0,25 Mld €** necessari alla copertura dei maggiori costi dovuti all'aggravamento del danno causato dal sisma 2016, a valere sulle risorse della contabilità del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Centro Italia (art.4, D.L. 189/2016).



Dal **2009 ad oggi**, nei 56 Comuni del Cratere sono stati ammessi contributi agli interventi di ricostruzione privata per un importo complessivo pari a **2,175 Mld €** (dato periferia + centro storico, esclusi gli importi dei contributi ad interventi su edifici con esito di agibilità A), pari al **46%** del fabbisogno finanziario previsto, distribuiti nel tempo come da grafico che segue (dato al 30/06/2022 con monitoraggio al 30/04/2021). Nel solo anno 2022, sono stati ammessi contributi per un importo pari a **118 Mln €**.

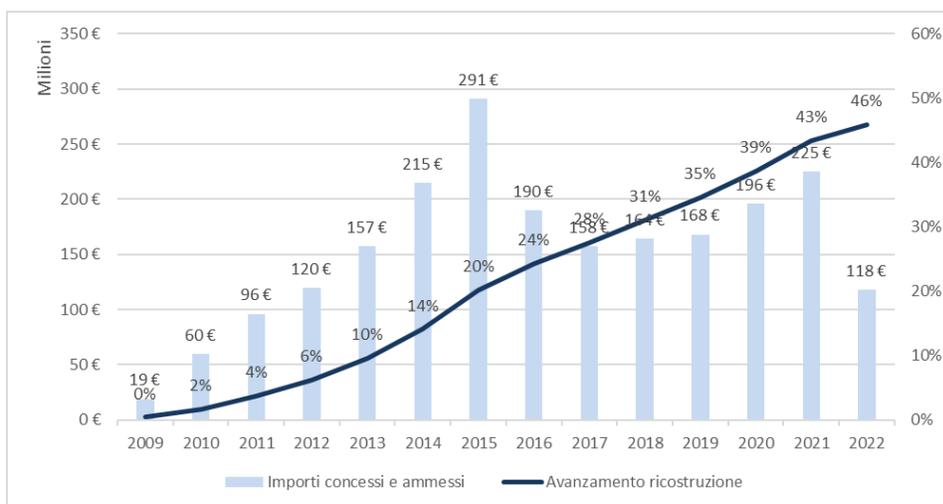

*Ammissioni:  
Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (Milioni di euro, dati al 30/06/2022).*

Il dato medio del cratere (46%) deve essere rapportato alle specificità della singola Area omogenea. I valori medi per Area omogenea variano infatti tra un minimo del 25% (AO2) ad un massimo del 80% (AO5):

- le **Aree omogenee n. 2 e 3** registrano un indice di avanzamento della ricostruzione privata pari al **23%** del fabbisogno previsto, in quanto tali aree sono state interessate anche dal sisma del 2016 e dalle problematiche legate alla sovrapposizione del danno tra i 2 terremoti (12 Comuni del Cratere sisma 2009, situati nelle AO n.2 e n.3, appartengono anche al Cratere sisma 2016).
- le **restanti Aree omogenee** del Cratere (**n. 4, 5, 6, 7, 8, 9**), invece, registrano un indice di avanzamento della ricostruzione privata significativamente superiore della media dell'intero cratere, attestandosi al **54%**.

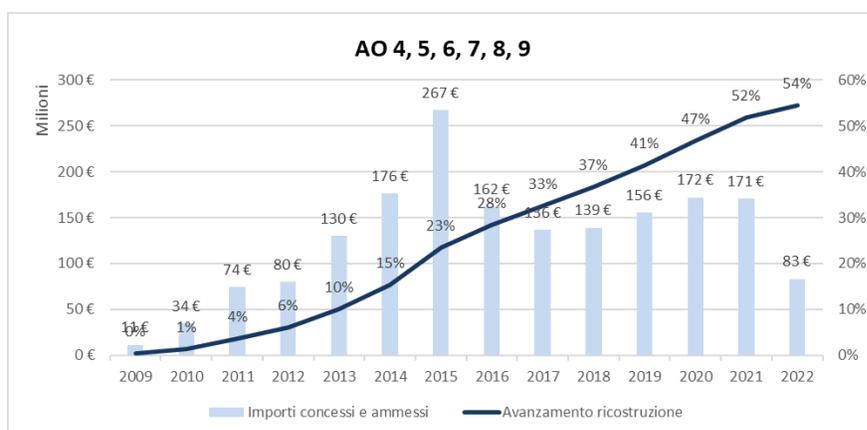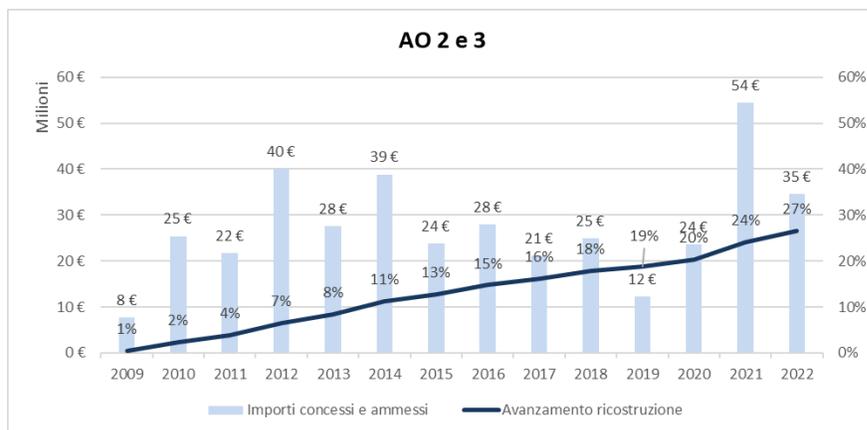


*Ammissioni: Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere. Specifica per AO (Milioni di euro, dati al 30/06/2022).*

Area	Atteso	Ammesso	Percentuale
AO2	€ 1.076	€ 267	25%
AO3	€ 369	€ 116	32%
AO4	€ 221	€ 82	37%
AO5	€ 298	€ 238	80%
AO6	€ 558	€ 265	47%
AO7	€ 256	€ 156	61%
AO8	€ 1.549	€ 816	53%
AO9	€ 411	€ 236	57%
Totale	€ 4.738	€ 2.176	46%

*Ammissioni: Percentuale di Ammissione a contributo per singola Area omogenea (Miloni di euro, dati al 30/06/2022)*

Quanto sopra è riferito all'avanzamento della ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere in relazione ai fabbisogni finanziari stimati. E' utile porre in evidenza la capacità di risposta dell'apparato pubblico alla reale domanda, focalizzando l'attenzione sulla performance del processo di ammissione contributi rispetto alla effettiva richiesta. **L'attuale avanzamento della ricostruzione privata nei Comuni del Cratere in relazione alle richieste di contributo effettivamente presentate è pari al 72%**, come da grafico che segue (aggiornato al 30/06/2022).

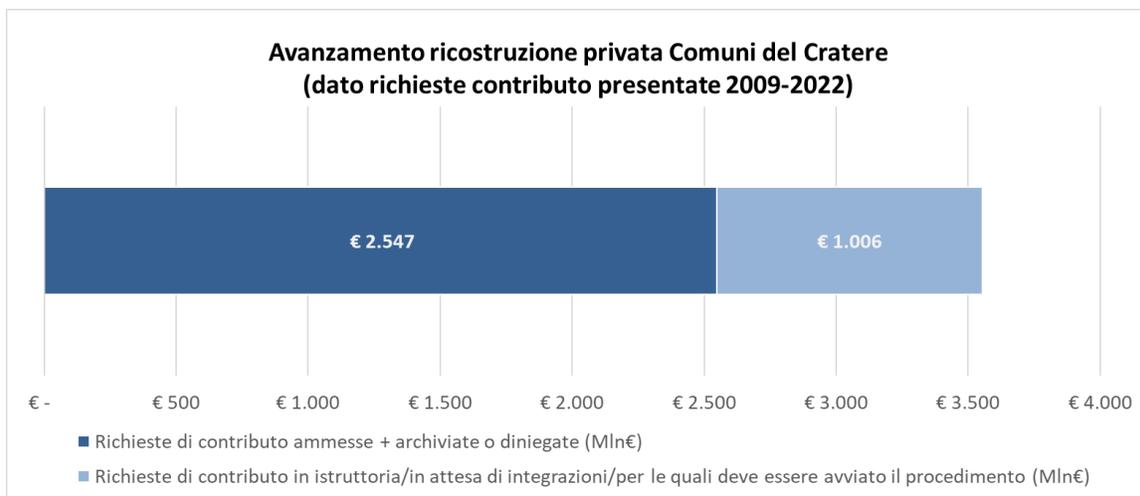


L'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari a **2.547 Mln €**, equivale appunto al **72%** dell'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.




Più nel dettaglio, dal 2009 ad oggi risultano presentate complessivamente, sia presso i Comuni che presso l'USRC e gli Sportelli Decentrati (ex UTR), richieste di contributo per interventi di ricostruzione privata (esclusi gli edifici con esito A) nei Comuni del Cratere pari a **3.553 Mln €**. Di queste, risultano:

- Richieste di contributo **ammesse** per un importo complessivo di **2.157 Mln €**;
- Richieste di contributo **archivate o diniegate**, il cui procedimento è stato chiuso senza ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte dell'interessato per un importo complessivo di **372 Mln €**;
- Richieste di contributo **attualmente in istruttoria** per un importo complessivo di **237 Mln €**;
- Richieste di contributo **attualmente in attesa di integrazioni** per un importo complessivo di **606 Mln €**;
- Richieste di contributo **per le quali deve essere avviato il procedimento** per un importo complessivo di **163 Mln €**.

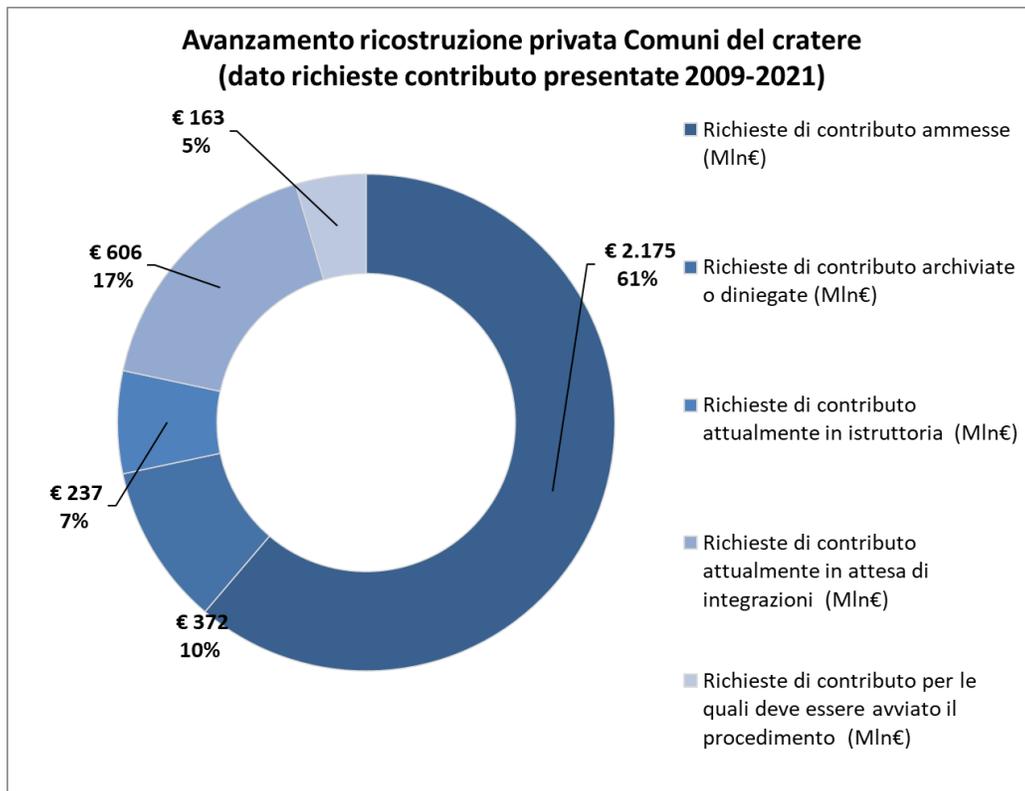

L'USRC, dal 2019, è al lavoro per ridurre il numero di richieste di contributo in attesa di istruttoria, recuperando le giacenze passate (in riferimento a quelle effettivamente in gestione da parte dell'USRC e degli Sportelli Decentrati). Lo stato al 30/06/2022 dei procedimenti istruttori per le istanze relative alla ricostruzione privata (in gestione da parte dell'USRC e Sportelli Decentrati) è raffrontato a quello di fine 2018, 2019 e 2020 e 2021 nella figura seguente.

	Presentate		Ammesse		Archiviazione e dinieghi		Da Istruire		Di cui già avviata l'istruttoria		In integrazione	
	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]
<b>2018</b>	3434	€ 2.307.704.156	1398	€ 980.105.223	755	€ 216.527.969	792	€ 683.733.627	251	€ 282.185.841	460	€ 299.180.104
<b>2019</b>	3772	€ 2.670.535.046	1544	€ 1.162.677.569	811	€ 233.123.981	957	€ 781.117.987	265	€ 183.888.209	489	€ 323.929.347
<b>2020</b>	4061	€ 2.845.348.020	1715	€ 1.308.235.294	863	€ 266.478.314	677	€ 439.616.909	303	€ 155.085.096	802	€ 647.429.879
<b>2021</b>	4339	€ 3.092.817.220	1921	€ 1.493.719.852	1021	€ 350.520.958	599	€ 443.527.211	318	€ 211.182.646	798	€ 606.206.649
<b>2022</b>	4403	€ 3.157.243.808	2051	€ 1.612.405.987	1063	€ 374.543.023	429	€ 350.432.566	220	€ 184.934.529	859	€ 615.022.568



Delle 957 istanze da istruire a fine 2019, 550 sono state assegnate nel corso del 2020, per un importo di 350 Mln €. Nel 2020 si registra un aumento del numero di pratiche assegnate per la conseguente istruttoria rispetto al 2019, con un incremento pari al 13%. Nel 2021 diminuisce ancora la percentuale di pratiche in attesa di essere istruite arrivando al 20%. Per il 2022 viene mantenuta la proporzione ottenuta nei precedenti anni e che vede una limitata percentuale di pratiche in istruttoria presso l'ufficio rispetto invece a quelle che sono in attesa di integrazione documentale da parte del richiedente.

### 3.2 MIC – MODELLO INTEGRATO CRATERE


Per la ricostruzione dei Centri Storici dei 56 Comuni del Cratere, la procedura parametrica **MIC - Modello Integrato Cratere**, introdotta con Decreto USRC n.1/2014, ha regolamentato i criteri per la determinazione ed il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata (DPCM 4/2/2013).

Attraverso Modello Integrato Cratere, dal 2014 ad oggi, sono state presentate **2.333** richieste di contributo, per un importo totale di circa **2.630 Mln €**. Di queste ad oggi sono state **ammesse 1217 MIC** per un importo di **1.391 Mln €** (e 254 chiusure del procedimento senza ammissione). Alle istanze ammesse corrispondono 848 cantieri MIC avviati e 623 cantieri con lavori già terminati.

Schede MIC Presentate [numero]	Schede MIC Presentate [importo]	Schede MIC Ammesse [numero]	Schede MIC Ammesse [importo]	Cantieri MIC	Cantieri MIC chiusi
2.333	2630 Mln €	1.217	1391 Mln €	848	623

### 3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

Per quanto riguarda lo **stato di avanzamento** in termini di **cantieri e SAL**, dal 2009 ad oggi è stato liquidato un importo complessivo pari a **1,49 Mld €** (dato periferia + centro storico, esclusi gli interventi su edifici con esito A).

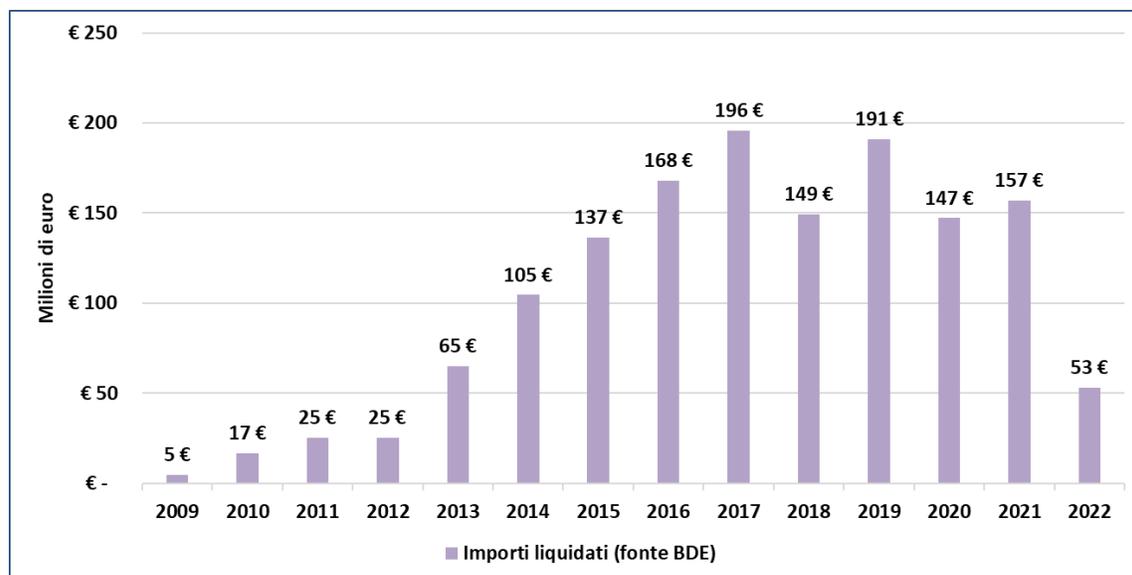

*SAL: Avanzamento nel tempo delle erogazioni a seguito di nulla osta SAL per la ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (dati al 30/06/2022)*

Area	Capofila	Perc.	Importo
2	Barete	10%	€ 143.251.803
3	Montorio al Vomano	6%	€ 85.750.385
4	Castel del Monte	4%	€ 59.130.039
5	Bussi sul tirino	13%	€ 184.263.030
6	Caporciano	13%	€ 174.224.846
7	Goriano Sicoli	8%	€ 106.284.155
8	Barisciano	39%	€ 535.733.818
9	Rocca di Mezzo	11%	€ 150.489.505

*SAL: Distribuzione degli importi totali dei contributi liquidati tra le aree omogenee - SAL. (dati al 30/06/2022)*

Il dato delle liquidazioni SAL per l'avanzamento dei cantieri dell'ultimo biennio è positivo, tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 intervenuta nel 2020. Tale risultato è ottenuto anche grazie alle innovazioni introdotte dal 2019, quali la semplificazione degli adempimenti istruttori delle richieste di liquidazione dei SAL (Circolari USRC n. 12/2019 e n. 13/2019) e la digitalizzazione dell'acquisizione documentale attraverso una piattaforma telematica introdotta in aprile 2020. Ad oggi tale piattaforma

gestisce la quasi totalità delle richieste di liquidazione dei SAL (il 95% - il restante 5% perviene ancora con modalità diverse come la PEC).

Gli **immobili**, nei Comuni del Cratere, per i quali sono terminati i lavori al 30/06/2022, sono stimati in circa **10.474**, su un totale stimato di circa 23.240 abitazioni inagibili alla data del 2009. Gli immobili con lavori terminati nel primo semestre (e riconducibili ai SAL Finali presentati) sono circa 436. I **cantieri** di ricostruzione privata **attualmente attivi sono 629** (dato al 30/06/2022).

Pratiche con cantieri attivi	
Totali Attivi	<b>629</b>

Immobili con lavori terminati	
10.474 <sup>(*)</sup>	
Di cui	
Prime Abitazioni	Altro (seconde ab e altri usi)
3.534	6.940
(*) escludendo i 9.689 interventi realizzati su abitazioni con esito di agibilità A.	


### 3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

Si riportano di seguito le immagini di **alcuni cantieri** che hanno visto la fine lavori e l'avvio nell'anno 2022.

Comune di Goriano Sicoli - Agg. 22 - Esito "E" - 4.288.027,23 €  
Cantiere chiuso nel primo semestre del 2022



Comune di San Pio delle Camere - Agg. 8800134 - UMI.2 - Esito "E" - 1.264.960,26 €  
Cantiere in corso e aperto nel primo semestre del 2022

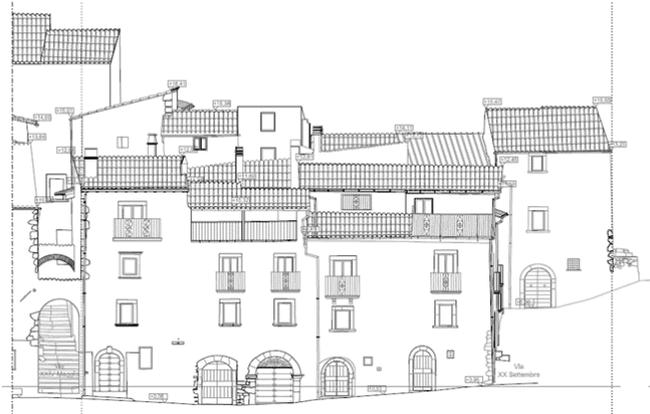


## 4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE

Dal 2013 l'USRC è competente (L. 71/2013, art. 7, co. 6) per i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione ricadenti nel territorio dei Comuni fuori Cratere, ovvero in quei Comuni abruzzesi che, pur non ricompresi nel Cratere sismico, hanno comunque riportato danni aventi nesso di causalità diretto con il sisma del 6 aprile 2009 (art. 1, co. 3, L.77/2009).

Si tratta di complessivi 114 Comuni, di cui 34 nella provincia dell'Aquila, 32 nella provincia di Teramo, 42 nella provincia di Pescara e 6 nella provincia di Chieti.

L'USRC, a partire dal gennaio 2019, ha preso in carico le **attività istruttorie** inerenti le richieste di contributo e SAL per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni fuori Cratere. Tale competenza - inizialmente attribuita, a far data dal 2014, agli UTR - Uffici Territoriali per la Ricostruzione "di frontiera" (competenti per l'Area omogenea del Cratere geograficamente prossima ai Comuni fuori cratere interessati), coordinati dall'USRC (Del. CIPE n. 1/2014; L.125/2015, art.11, co.13) - è stata trasferita integralmente all'USRC dal 2018, a seguito della soppressione degli UTR (L.172/2017).

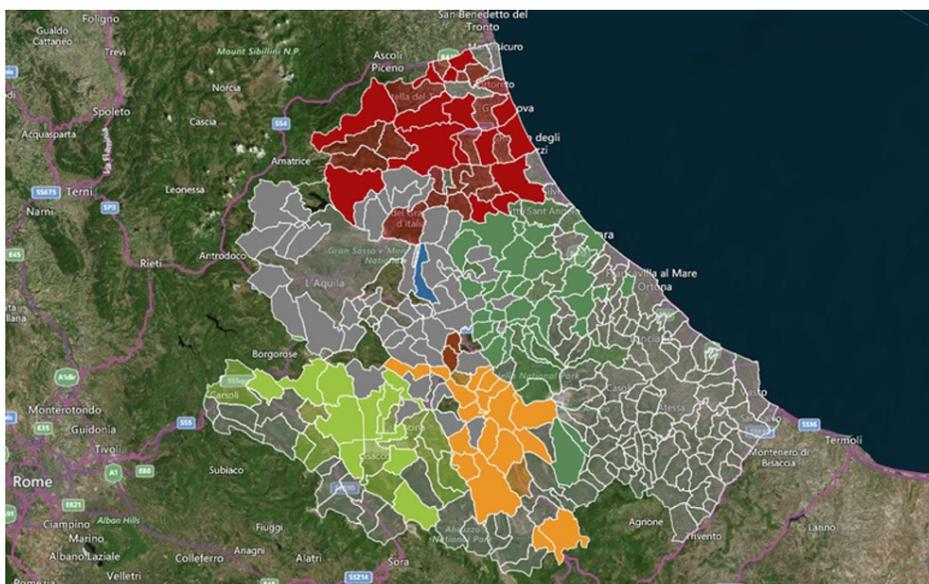


I **contributi ammessi** per la ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, dal 2009 ad oggi, ammontano a circa **495,96 € Mln €**, di cui:

- **85,19 Mln €** ammessi con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti e credito d'imposta (finanziamento agevolato) nel periodo 2009-2012;
- **410,77 Mln €** ammessi sul canale del finanziamento diretto.


Ad essi si aggiungono le richieste di contributo archiviate o diniegate, per un importo di **36,64€ Mln €**.

L'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari a **€ 532,60 Mln €**, equivale al **53%** dell'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

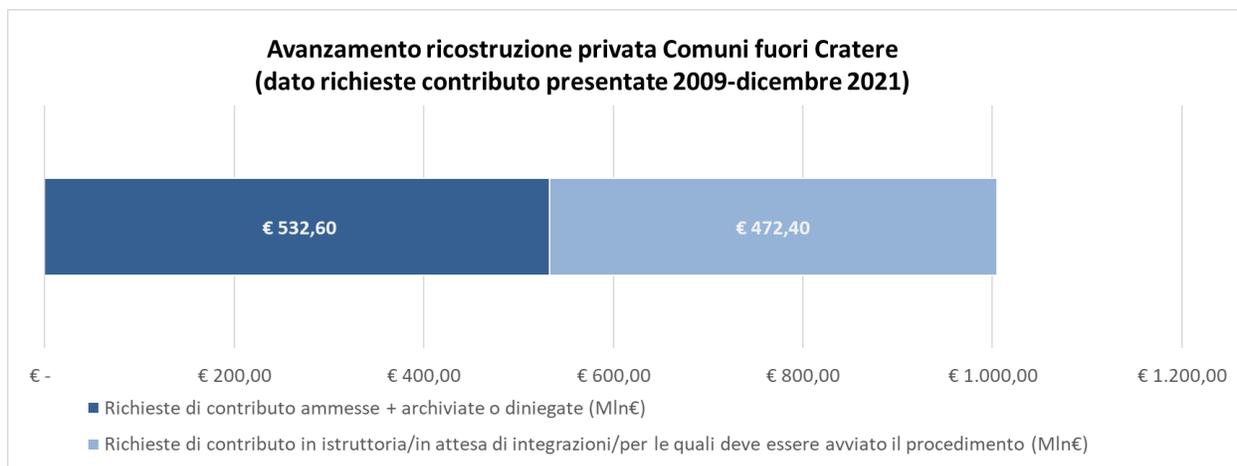

L'USRC, a far data dal **2019**, ha preso in carico **901** richieste di contributo giacenti, per un importo totale pari a circa **239,30 Mln €**, delle quali **751** è stato avviato il procedimento (**182,6 Mln €**). In particolare, risultano:

- Richieste di contributo in **istruttoria** per un importo complessivo di **72,44 Mln €**;
- Richieste di contributo in **attesa di integrazioni** per un importo complessivo di **54,46 Mln €**;
- Richieste di contributo **ammesse** per un importo complessivo di **24 Mln €**;
- Richieste di contributo **archivate o diniegate**, il cui procedimento è stato chiuso senza ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte dell'interessato, per un importo complessivo di **31,65 Mln €**;
- Richieste di contributo **per le quali deve essere avviato il procedimento** per un importo complessivo di **56,75 Mln €**.

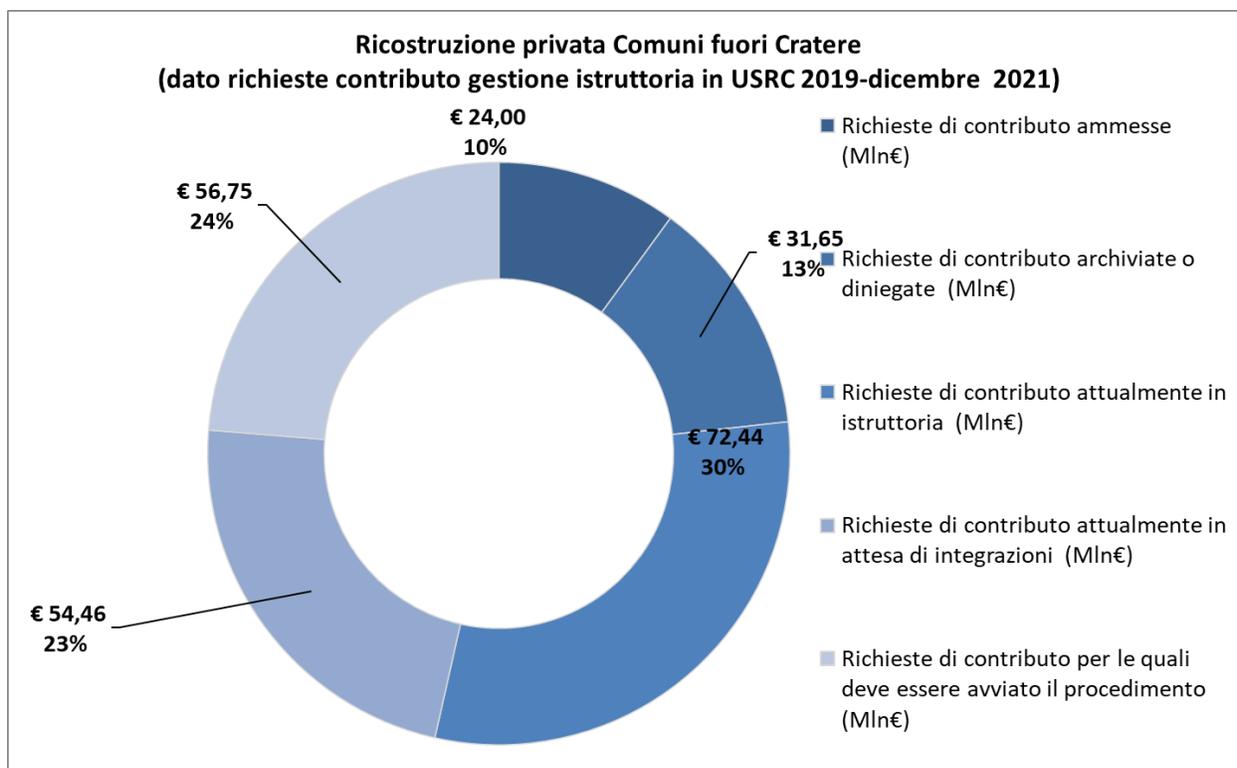

Nel primo semestre del 2022 sono stati ammessi contributi per un importo pari a **4,5 Mln €**.

L'USRC, a far data dal 2019, ha gestito inoltre **261** richieste di liquidazione **SAL** per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, di cui **218 liquidate, per un importo complessivo di 25 Mln €**. Nel primo semestre del 2022 sono stati liquidati **24** SAL per un importo pari a **3,5 Mln €**.

Le **abitazioni** nei Comuni Fuori Cratere per le quali è stata ripristinata l'agibilità sono stimate in **2.084** su un totale di circa 3.600 abitazioni inagibili alla data del 2009. Le abitazioni tornate agibili nel primo semestre 2022 sono 184. I **cantieri** di ricostruzione privata **attualmente in corso sono 201**.

## 5. GESTIONE FONDI



L'USRC esegue il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata nei Comuni del Cratere e fuori Cratere (art. 4, Decreto MEF del 29 ottobre 2012), che è inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato sul sito [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per la ricostruzione privata sul canale diretto aggiornato al **30/06/2022**:

<b>RICOSTRUZIONE PRIVATA</b>	<b>RISORSE ASSEGNATE</b>	<b>RISORSE IMPEGNATE</b>	<b>RISORSE TRASFERITE</b>
Comuni cratere	€ 1.496.571.598	€ 1.299.967.923	€ 1.076.590.693
Comuni fuori cratere	€ 418.195.741	€ 351.591.645	€ 292.303.541

Ai sensi delle Delibere CIPE n. 23/2014 e n. 22/2015, l'USRC cura inoltre l'assegnazione e trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni del Cratere e fuori cratere. Le risorse sono assegnate ai singoli Comuni per i soli interventi immediatamente attuabili e solo nel caso in cui siano state integralmente impegnate le risorse precedentemente assegnate. In tal modo sono garantiti l'efficiente utilizzo delle risorse per la ricostruzione privata e la corretta allocazione delle stesse nei Comuni con maggiore capacità di spesa.



### 5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 30/04/2022, raggiunge un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di 2.007 Mln € (2.213 Mln € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 30/06/2022 **l'USRC ha assegnato** complessivamente 1.299 Mln€, di cui trasferiti 1.001 Mln€.

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
<b>A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC</b>	<b>€ 1.496.571.598</b>	
<b>B. Totale utilizzi USRC</b> Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni del cratere		<b>€ 1.299.967.929</b>
<b>C. Totale Disponibile</b> Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Cratere		<b>€ 196.603.669</b>

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 54 Comuni del Cratere e rappresentano circa il 69% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

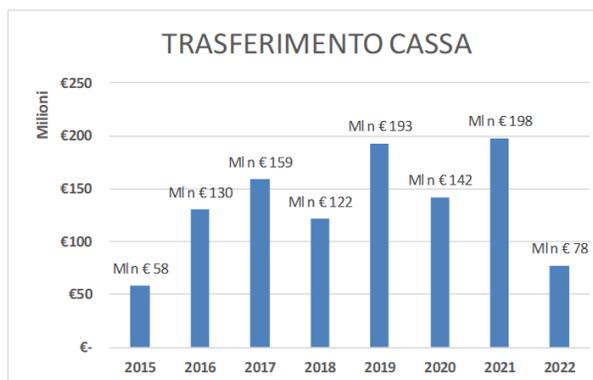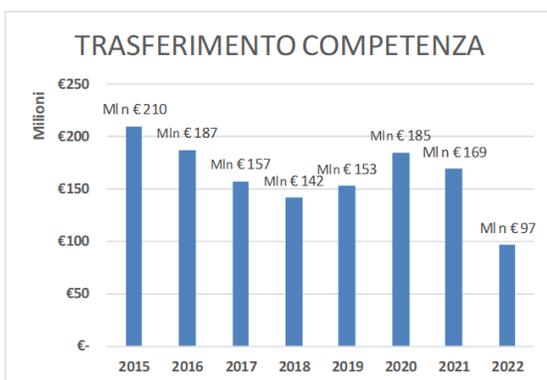

L'aggiornamento dei dati è pubblicato sul sito istituzionale dell'USRC, al seguente link:

[Gestione fondi comuni del cratere](#)

Nel primo semestre del 2022 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 96.557.675,61** a 39 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati finanziamenti a 20 comuni per complessivi **€ 77.700.292,11**.

**<https://www.usrc.it/ricostruzione/ricostruzione-privata-cratere/gestione-fondi-comuni-del-cratere>**

## 5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 30/06/2022, raggiunge un importo totale dei **contributi concessi** con finanziamento diretto di **376.256.968,21** Mln € (461.370.904,54 Mln € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 30/06/2022 **l'USRC ha assegnato € 351.591.645,40 di cui trasferiti € 292.303.541,40**

;

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
<b>A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC</b>	<b>€ 418.195.741,15</b>	
<b>B. Totale utilizzi USRC</b> Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni Fuori Cratere		<b>€ 351.591.645,40</b> (+€27.446.614,56 altre gestioni)
<b>C. Totale Disponibile</b> Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Fuori Cratere		<b>€ 66.871.214,20</b> (comprensivi residui gestioni precedenti)

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 114 Comuni del Fuori Cratere e rappresentano circa il 90% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

Nel primo semestre del **2022** sono stati complessivamente **trasferiti** da parte dell'USRC € **7.808.333,24** a 13 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati **assegnati** finanziamenti a 12 Comuni per complessivi € **10.258.415,02**.



## 6. RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Nel rispetto del riparto di competenze previsto nella gestione ordinaria, l'USRC dal 2013 cura la programmazione delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica, effettua il trasferimento delle somme e cura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (Decreto del MEF del 20/10/2012).

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati **354** interventi di ricostruzione pubblica nei Comuni del Cratere per complessivi **222,4 Mln €**, **331** dei quali nel corso della gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un importo pari a **207,5 Mln €**. Tali interventi riguardano il ripristino, a seguito del danneggiamento arrecato dal sisma 2009, di beni pubblici, quali Case Comunali, Reti infrastrutture, Edilizia Residenziale Pubblica, Centri di Aggregazione, Edilizia Cimiteriale.

Le principali fonti di finanziamento degli interventi di Ricostruzione pubblica, dal 2013 ad oggi, sono:

**Delibera CIPE 135/2012**, a valere sulla quale è stata definita la **Programmazione triennale della Ricostruzione Pubblica (2013 - 2015) dei Comuni del Cratere** per un importo complessivo di **126,45 Mln €**;

**Delibera CIPE n. 48/2016**, che ha definito gli indirizzi, i criteri e le modalità per la predisposizione dei **“Programmi pluriennali di intervento di settore”** e dei relativi **“Piani annuali di attuazione”**, al fine di razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica, in linea con le previsioni del DL n. 78/2015, ed ha approvato un **“Piano Stralcio”**, che finanzia interventi nei Comuni del Cratere per complessivi **14,5 Mln €**;

**Delibera CIPE n. 24/2018**, che ha approvato il Piano annuale 2018 relativo al Settore 4 - **“Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali”** ed ha assegnato risorse all’USRC per complessivi **21,3 Mln €**, destinati a **21** interventi nei Comuni del Cratere e a **14** interventi nei Comuni fuori Cratere;

**Delibera CIPE n. 18/2020**, che ha approvato il secondo Piano annuale 2020 relativo al Settore 4 - **“Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali”** ed ha assegnato risorse per un importo di **30,3 Mln €** all’USRC per l’attuazione di 37 interventi in Comuni del Cratere e fuori Cratere.

Dal 2013 ad oggi sono **200 i progetti finanziati in via definitiva**, per complessivi **78,5 Mln €**, che rappresentano complessivamente oltre il 64% degli interventi programmati. Di questi:


- **110** interventi sono ultimati o in fase di collaudo, per un importo pari a **26,5 Mln €**;
- **33** interventi con lavori in corso, per un importo pari a **22,7 Mln €**;
- **57** interventi per i quali è in corso l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori, per un importo pari a **29,3 Mln €**.

Risultano inoltre oltre **120 interventi programmati**, con una copertura finanziaria di complessivi **117 Mln €**.

Dal 2013 ad oggi sono state complessivamente trasferite ai Comuni del Cratere risorse per **€ 50.471.716,94** per il pagamento dei lavori eseguiti.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per la ricostruzione pubblica nel **periodo 2013-2022**:

<b>RICOSTRUZIONE PUBBLICA</b>	<b>RISORSE ASSEGNATE</b>	<b>RISORSE IMPEGNATE</b>	<b>RISORSE TRASFERITE</b>	<b>RISORSE SPESE</b>
Ricostruzione pubblica (esclusi interventi emergenziali, DPC, Provveditorato, Mibact, ATER)	<b>€ 177.966.713</b>	<b>€ 78.486.292</b>	<b>€ 79 896 276</b>	<b>€ 50.471.717</b>

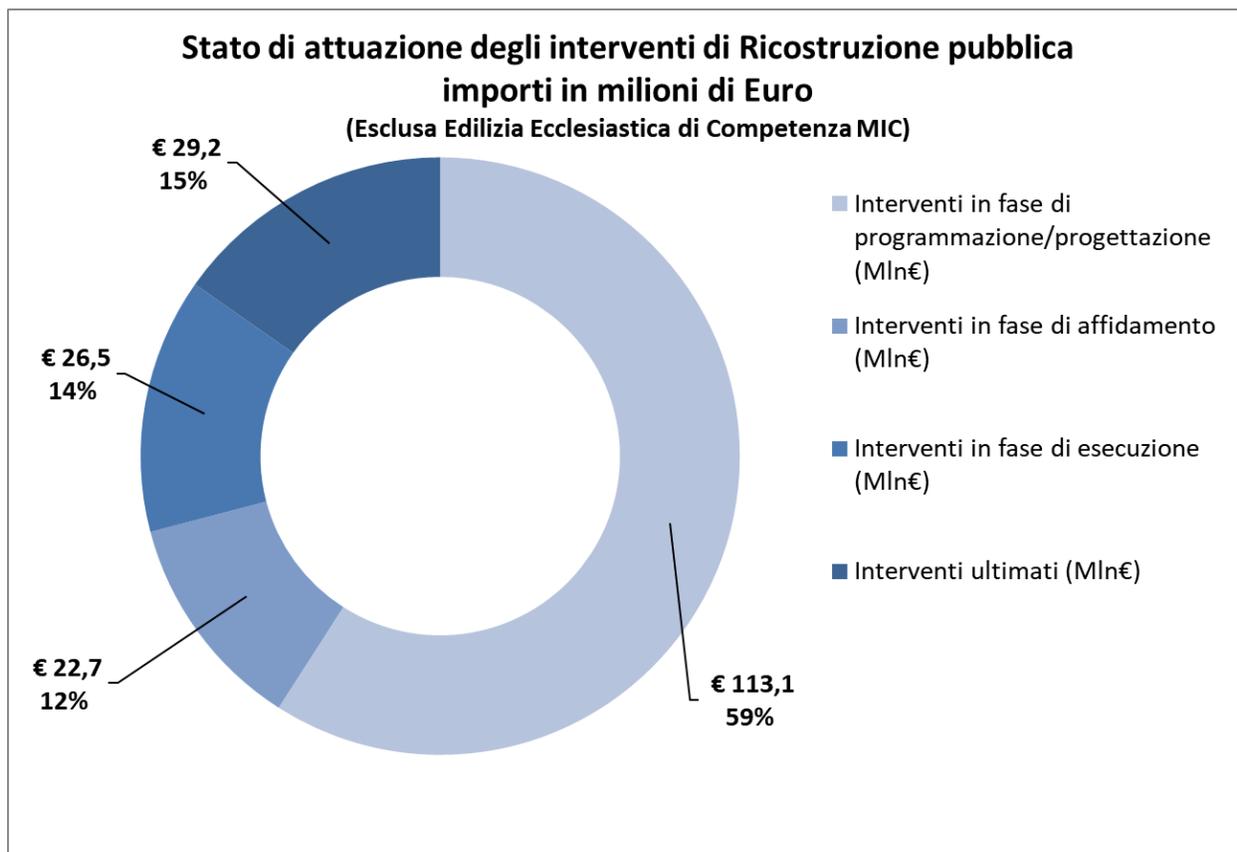

#### PICC - Piano di Interventi Connessi e Complementari per la rigenerazione urbana dei centri storici

Parallelamente al percorso avviato con i fondi del Piano Complementare al PNRR per le aree colpite dal sisma del 2009 e del 2016, è stata avviata un'attività di ricognizione del fabbisogno relativo alla ricostruzione pubblica e volto al ripristino delle **reti**, delle **infrastrutture**, degli **spazi pubblici** e alla **messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici e delle cavità antropiche rese instabili dal sisma**. Questi interventi, connessi e comunque complementari a quelli di ricostruzione pubblica e privata, sono fondamentali per la completa rifunzionalizzazione e rigenerazione dei centri storici e costituiscono il naturale completamento dei cantieri pubblici e privati.


L'attività di ricognizione delle esigenze si è conclusa il 30 maggio 2022 e sono attualmente in corso le istruttorie di oltre 260 schede progettuali presentate per circa 330 milioni di euro, al fine di verificare il rispetto dei requisiti dettati dalla determinazione USRC 1097/2021 che ha stabilito, nel rispetto della norma originaria, i criteri di ammissibilità a finanziamento. Gli **interventi ammissibili** rientrano nell'ambito del Piano di Ricostruzione ovvero nel Centro Storico del Comune proponente, e sono riconducibili alle linee di intervento di cui alla Det. USRC 1097/2021, in particolare:

- ❖ *Linea 1 - Riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria:* che comprende interventi atti ad incrementare la qualità spaziale e funzionale degli spazi urbani di proprietà pubblica;
- ❖ *Linea 2 - Messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma:* che comprende interventi atti a mitigare il rischio idrogeologico e geomorfologico, funzionali al ripristino dell'agibilità degli immobili danneggiati dal sisma del 2009, nelle aree interessate da dissesti idrogeologici e al riempimento o consolidamento delle cavità direttamente danneggiate o rese instabili dal sisma 2009;
- ❖ *Linea 3 - Miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi:* che comprende interventi atti alla riparazione, ripristino, potenziamento e/o adeguamento delle reti di infrastrutture dei servizi esistenti alla data del sisma.

## CAMMINI

I fondi stanziati per gli interventi di valorizzazione turistica dei cammini, rientrano tra quelli previsti per l'attuazione degli interventi del **Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016**, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita" ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) è stato individuato come soggetto responsabile dell'intervento ed ha redatto internamente, con proprio personale tecnico e con il contributo degli amministratori dei Comuni interessati, il progetto di fattibilità tecnico economica (P.F.T.E.) da porre a base di gara per la procedura di appalto integrato, in linea con il Programma unitario di interventi per le aree del sisma 2009 e 2016 approvati dalla Cabina di Coordinamento Integrata con Delibera del 30/09/2021.

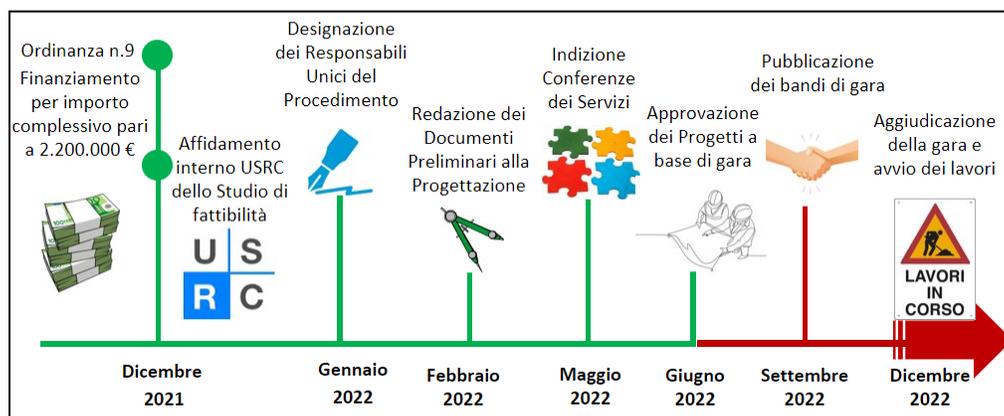

I progetti per la valorizzazione turistica dei Cammini, approvati e finanziati con fondo complementare al PNRR sono:

- **“Il Cammino grande di Celestino”** nasce su iniziativa del Parco Nazionale della Majella e attraversa i Comuni di L’Aquila, Ocre, Fossa, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio Ne’ Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Acciano, oltre ai Comuni fuori cratere di Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Raiano, Corfinio, Roccacasale, Pratola Peligna e Sulmona;
- **“Il Cammino della Baronia”**, nasce su proposta dei Comuni di Castelvecchio Calvisio (capofila), Calascio, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Ofena, Santo Stefano Di Sessanio e Villa Santa Lucia e attraversa gli stessi Comuni e quello di Capestrano;
- **“Il Cammino tra i Vestini”**, nasce su iniziativa del Comune di Navelli (AQ) e attraversa i Comuni di Fossa, Villa Sant’Angelo, Sant’Eusanio Forconese, San Demetrio Ne’ Vestini, Poggio Picenze, Barisciano, San Pio delle Camere, Navelli, Acciano, Caporciano e Prata D’Ansidonia;
- **“Il Cammino dei Francescani”**, nasce su proposta del Comune di Gagliano Aterno (AQ) e attraversa i Comuni di Rocca di Mezzo, Ovindoli, Celano, Aielli, Collarmele, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo e Secinaro.

L’obiettivo principale del progetto nella sua unitarietà consiste nell’identificazione e valorizzazione dei percorsi con azioni volte a promuovere:

- lo **sviluppo e l’aumento dell’offerta turistica** dei territori comunali interessati, ampliandone la conoscenza sotto l’aspetto naturalistico, storico-culturale, architettonico, sportivo e gastronomico;
- la qualità funzionale della **mobilità lenta**, con il noleggio di biciclette e mountain bike, favorendo il trekking a cavallo, con l’opportunità di costruire una rete di connessioni intercomunali mediante l’integrazione del cammino con il sistema delle strade poderali e vicinali ad esso collegate;
- l’**accessibilità**, per favorire la percorrenza del cammino nell’ottica dell’inclusività sociale;
- la **conoscenza del territorio**, per scoprire le testimonianze storiche, le tradizioni e le peculiarità dei luoghi attraversati.

Affinché si realizzino gli obiettivi, la progettualità dovrà intersecare diversi ambiti di intervento e tenere conto della **sostenibilità dell’offerta** a medio e lungo termine. Una progettazione che sia in grado di unire realtà diverse e che contribuisca a rilanciare economicamente i borghi direttamente attraversati o raggiungibili dai percorsi: il flusso di turisti dovrebbe svolgere la funzione di **volano per la nascita di una nuova economia ed il rilancio del territorio**, favorendo l’apertura di nuove attività ricettive e di ristoro, nonché l’espansione delle attività sportive locali.

## 7. EDILIZIA SCOLASTICA



Con Decreto DiSET n. 48 del 14 marzo 2013, sono state trasferite all'USRC le competenze per l'attuazione del Piano denominato "**Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza**", finalizzato alla riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per tutte le scuole della Regione Abruzzo ad eccezione di quelli ricadenti nel Comune di L'Aquila.

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati **245** interventi sull'edilizia scolastica, per complessivi **244 Mln €**, **214** dei quali nel corso della gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un importo pari a circa **192,5 Mln €**.

Più di recente, con Delibera CIPE n. 32/2019, all'USRC è stata conferita la responsabilità di attuazione del Piano annuale degli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica nell'ambito territoriale di propria competenza, mentre al MIUR è assegnata la competenza della programmazione del Settore.

Gli interventi previsti riguardano **la riparazione, il miglioramento sismico** e, in alcuni casi, **la costruzione di nuovi**

**edifici scolastici**, coinvolgendo oltre **160 edifici, 4 province e 98 comuni, e quasi 30.000 studenti** abruzzesi.


Con la deliberazione CIPE 72/2020 è stata finanziata la seconda annualità dei piani di intervento sull'edilizia scolastica, per un importo complessivo di ca. 15 milioni di euro. Nel corso del primo semestre 2022 è stata condotta un'attività istruttoria in sinergia con la Struttura di Missione e il MIUR, volta a completare la programmazione della seconda annualità: l'ulteriore proposta in fase di esame prima della trasmissione al CIPESS prevede la possibilità di finanziamento di ulteriori **6 interventi su altrettanti comuni**, in parte volti al completamento di opere già avviate e in parte per nuovi progetti per un costo complessivo di **ca. 16 milioni di euro**.


Sulla base dei criteri e delle procedure definiti dall'USRC, ad oggi, sono stati **approvati 118 interventi per oltre 113,8 Mln €, immediatamente cantierabili, e sono state trasferite agli enti attuatori risorse per 87,9 Mln €**.

**Dei 118 interventi approvati dal 2013 ad oggi: 81 hanno concluso i lavori e 37 sono in fase di esecuzione.**

Dei **192,5 Mln €** di interventi finanziati, risultano, in particolare:

- interventi ultimati per un importo pari a **71,6 Mln €** assegnati;
- interventi in fase di esecuzione per un importo pari a **46,1 Mln €** assegnati;
- interventi in fase di progettazione, per un importo pari a **64,0 Mln €** assegnati;
- interventi in fase di programmazione per un importo pari a **3,4 Mln €** assegnati;
- interventi defianziati per un importo pari a **7,4 Mln €** assegnati..

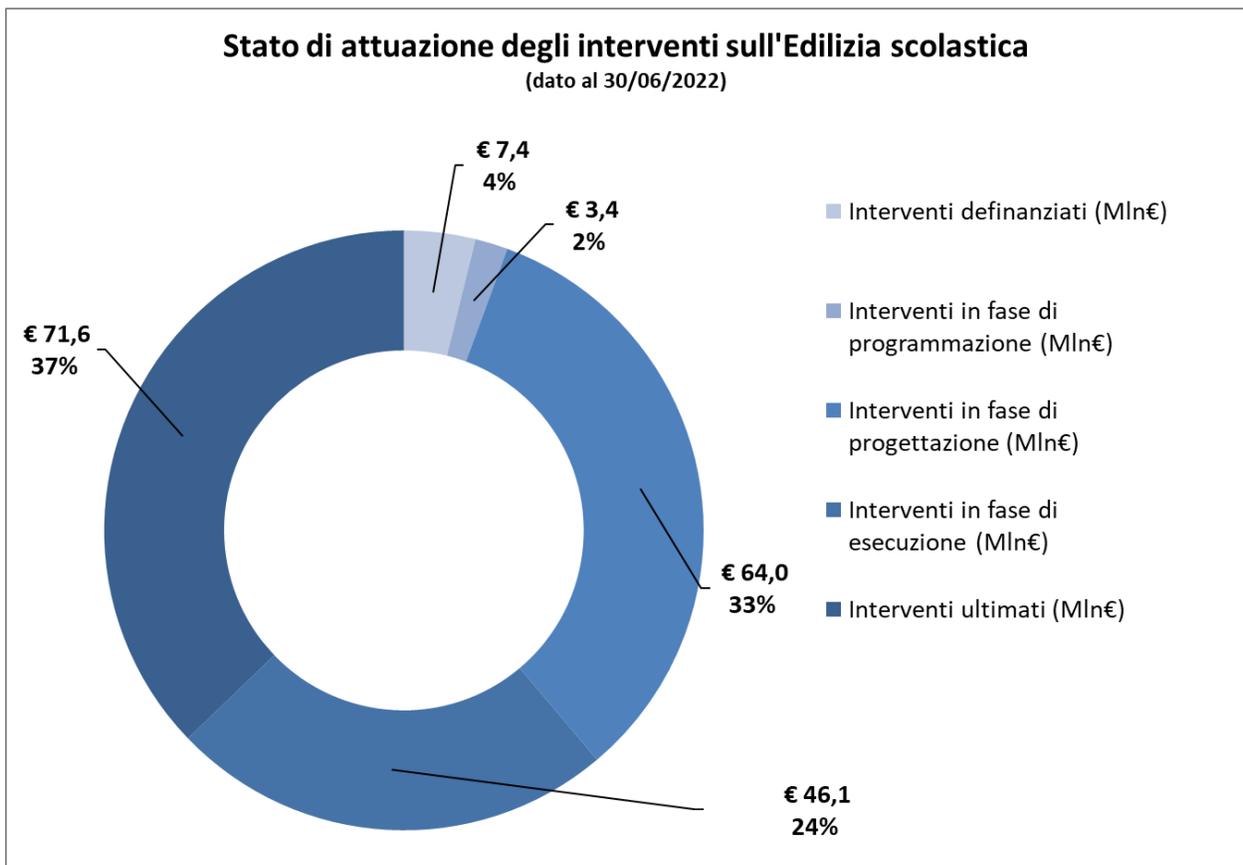

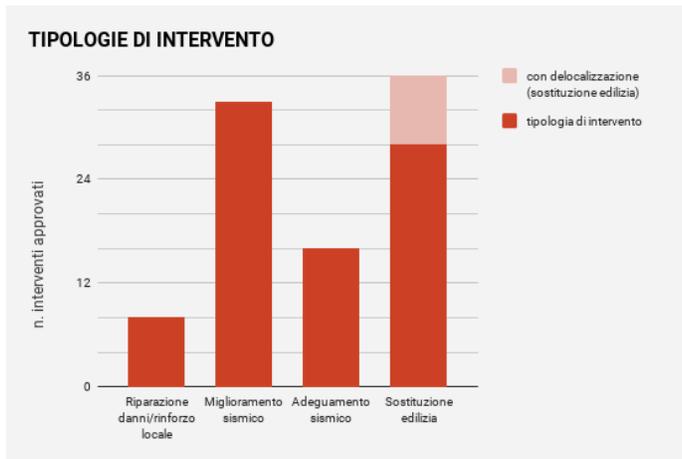

Gli interventi riguardano edifici che hanno manifestato un'elevata vulnerabilità sismica e sono finalizzati al raggiungimento del massimo livello di sicurezza conseguibile con il finanziamento disponibile; per quasi la metà di essi è prevista la sostituzione dei vecchi fabbricati con nuovi edifici scolastici.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per gli interventi sull'edilizia scolastica nel **periodo 2013-2022**:

EDILIZIA SCOLASTICA	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPEGNATE	RISORSE TRASFERITE	RISORSE SPESE
Edilizia scolastica (esclusi interventi Provveditorato)	€ 192.284.384	€ 113.892.753	€ 155 787 593	€ 87.925.810



*AGORA' (spazio centrale) della nuova Scuola elementare di Celano*

L'U.S.R.C. ha contribuito a diffondere presso le amministrazioni competenti le **indicazioni dettate dalle Linee guida del MIUR**, per realizzare scuole con una concezione innovativa degli spazi dedicati alla didattica e con un nuovo rapporto con il territorio, che qualifichi la scuola come «centro civico», al servizio della comunità oltre gli orari scolastici.



*.SPAZIO LETTURA della nuova scuola di Pratola Peligna*

L'Ufficio ha inoltre provveduto alla copertura economica delle spese necessarie alla **sistemazione provvisoria degli studenti** per garantire la continuità didattica durante l'esecuzione degli interventi, definendo altresì i criteri di assegnazione delle risorse alle Amministrazioni richiedenti.

## 8. TRASPARENZA



### 8.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

Per gli interventi localizzati nei Comuni del Cratere, sul sito istituzionale dell'USRC sono pubblicate, con aggiornamento settimanale, le informazioni relative allo stato dell'istruttoria delle richieste di contributo e degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) depositate presso l'USRC, accessibili senza restrizioni da parte degli interessati al seguente link:

[Verifica lo stato della pratica](#)

### 8.2 WEB-GIS

L'USRC, oltre alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, con cadenza bimestrale, del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione privata, ha reso disponibili ai soggetti interessati i dati del monitoraggio mediante geolocalizzazione su mappa in apposito web-GIS, accessibile dal sito istituzionale dell'USRC.

### 8.3 CONTRATTI

L'USRC effettua l'acquisizione dei contratti relativi agli interventi di ricostruzione privata, localizzati nei Comuni del Cratere e fuori Cratere, da parte dei committenti e ne effettua la trasmissione ai comuni interessati, per gli idonei controlli (art. 67-quater, co.8, L. n. 134/2012; art. 11, co.1, L. n. 125/2015). La procedura, a far data dal gennaio 2019, avviene interamente on line.

Al 30 Giugno 2022 risultano acquisiti contratti in numero di **11.748** relativi a 2.820 richieste di contributo e a 115 Comuni, per un importo complessivo di **2.842.484.870,11 €**.

#### 8.4 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Con determina del Titolare n. 258 del 31.03.2021, l'USRC ha approvato il **Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza** per il triennio **2021-2023**.

Il Piano, adottato in esito ad una procedura pubblica che ha consentito forme di partecipazione degli stakeholders interessati, sposa un'interpretazione ampia del concetto di fenomeno corruttivo al fine di reprimere ed ancor prima prevenire ogni fenomeno di *maladministration*, idoneo anche solo potenzialmente a sviare il corretto esercizio del potere pubblico nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ufficio. Il PTPCT è accessibile in formato aperto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'USRC al seguente link: <https://usrc.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-1/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2021-2023.html>

Nel secondo semestre del 2021, in attuazione delle misure previste nel Piano, l'attenzione è stata rivolta principalmente ad un potenziamento delle misure di trasparenza, con nuova alberature della sezione Amministrazione Trasparente e l'importazione del precedente contenuto nelle corrette sotto sezioni. Inoltre, i dipendenti dell'Ufficio, ed in particolare quelli individuati quali responsabili delle pubblicazioni obbligatorie, sono stati destinatari di un'ampia attività di formazione dispiegata per 20 ore complessive.

L'aggiornamento del PTPCT per il 2022 è in via di approvazione nell'ambito della procedura di integrazione ed armonizzazione con gli altri strumenti programmatici in dotazione all'Ufficio nel PIAO.

Relativamente all'attività a prevenzione della corruzione, l'Ufficio ha provveduto ad una totale mappatura delle situazioni anche potenziali dei conflitti di interesse e di cause di incompatibilità adottando le conseguenti misure previste nel Piano e, in esito al confronto con le rappresentanze sindacali, sta per approvare il regolamento per il conferimento di incarichi extra istituzionali.

## 9. GESTIONE APPALTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

### APPALTI DI BENI E SERVIZI

Nell'ambito di un intervento sistematico volto ad implementare la qualità amministrativa e dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le proprie esigenze, l'USRC negli ultimi mesi ha avviato un ripensamento della propria strategia d'azione in questo delicato settore, principalmente svolta sulle seguenti direttrici:

- Maggior cura della fase della programmazione della spesa, con l'approvazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e con un atto di programmazione interna per beni e servizi non inseriti nel programma stesso al fine di prevedere e garantire un'ottimale allocazione delle risorse finanziarie disponibili;
- Maggior trasparenza e controllo nelle varie fasi delle procedure di appalto, prevedendo sempre l'utilizzo di piattaforme elettroniche ed in particolare del MePA anche per affidamenti diretti di modico importo, salvo cause di estrema urgenza esplicitate nella determinazione a contrarre. Per i pochi acquisti operati al di fuori del mercato elettronico si è comunque operata una ricerca di mercato in linea con le indicazioni fornite nel tempo da ANAC;
- Riduzione dei micro affidamenti mediante stipula di convenzioni con operatori di diversi settori utili a scongiurare la reiterazione di affidamenti diretti;
- Approvazione di atti di natura generale e/o regolamentare utili a supportare ed indirizzare l'attività del personale addetto all'Ufficio competente alla gestione degli appalti, tra i più significativi: regolamento per la quantificazione ed erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, registro dei contratti d'appalto sottoscritti dall'Ufficio, disposizioni di servizio volte a regolamentare la fase dei controlli amministrativi sugli aggiudicatari.

Nella ricerca del punto di equilibrio ottimale tra rigore amministrativo e velocità dell'azione amministrativa, si è inoltre spesso preferita una procedura di gara aperta anche laddove non obbligatoria in termini strettamente normativi, pervenendo ad aggiudicazioni di contratti a prezzi ridotti rispetto agli affidamenti conclusi grazie ad una maggior partecipazione concorrenziale.

Di seguito alcuni dati numerici riferiti alla gestione di appalti di beni e servizi 2022:

- Adesioni a Convenzioni Consip: 3
- Adesioni ad accordi quadro Consip: 1
- Acquisti su Mepa: 15
- Acquisti extra MePA previa indagine di mercato: 3
- Procedure aperte: 3
- Affidamenti diretti extra MePA non preceduti da indagine di mercato per ragioni di urgenza: 1
- Modifiche di precedenti rapporti contrattuali: 4

Tra le procedure più significative avviate e/o concluse nel corso del 2022 si può ricordare la Gara aperta per la fornitura di una piattaforma per la gestione di un concorso pubblico (40 mila euro), la Gara aperta per l'approvvigionamento di diverse piattaforme per la gestione dei processi di ricostruzione (130 mila euro), la Gara aperta per affidamento di servizi postali (10 mila euro), la Gara aperta per sanificazione locali in uso all'Ufficio (38 mila euro).

## APPALTI DI LAVORI

L'art. 54 comma 2 bis del D.L. 77/2021, prevedendo la possibilità di delega di competenze in materia di appalti pubblici da parte delle amministrazioni del cratere in favore dell'USRC, costituisce una pietra miliare nella storia dell'Ufficio che in pochi mesi ha sottoscritto convenzioni per la gestione di 30 procedure di gara in qualità di stazione appaltante. Alla convenzione sottoscritta di recente con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo per la progettazione e l'esecuzione di lavori di recupero di 19 chiese danneggiate dagli eventi sismici e dislocate sul territorio abruzzese, ha fatto seguito l'accordo con la Prefettura de L'Aquila e la Soprintendenza per i beni culturali de L'Aquila per un ulteriore intervento a valere sui fondi per l'edilizia di culto (F.E.C.).

E' di fine dicembre 2021 l'individuazione dell'USRC quale soggetto attuatore per il recupero e la valorizzazione di 4 percorsi sentieristici da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nell'ambito del Piano complementare al PNRR, interventi già in fase attuativa ad oggi e per i quali le procedure di gara dovranno essere pubblicate entro la fine del luglio 2022 nel rispetto delle milestones previste per fruire dei finanziamenti stanziati nel PNC.

Da ultimo, ma non certo per rilevanza economica e sociale, sono in via di finalizzazione degli accordi tra l'Ufficio ed alcuni comuni del cratere per l'attuazione di interventi di varia natura che vanno dalla realizzazione di un nuovo polo scolastico, ad interventi di rigenerazione urbana passando per lavori finalizzati a scongiurare rischi di dissesto idrogeologico.

*Competenze maturate negli anni, propensione alla gestione di processi complessi e disponibilità di adeguate strutture interne per l'esecuzione, il controllo e la rendicontazione della varie fasi di appalti complessi, hanno consentito all'Ufficio di meritare in breve tempo la fiducia e l'attenzione da parte delle amministrazioni del territorio abruzzese, grazie anche ad un ripensamento della propria organizzazione che si avvarrà a breve della consulenza specialistica di 3 esperti nel settore degli appalti pubblici, della rigenerazione urbana e della promozione di attività culturali, ambiti tanto complessi quanto sfidanti che lo proiettano in una nuova dimensione ove, accanto alle consolidate funzioni di recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma, assumono un ruolo sempre più significativo quelle di supporto, coordinamento e gestione diretta di appalti pubblici in un'ottica di stretta prossimità con le amministrazioni e con i territori interessati dagli interventi.*



## 10. SVILUPPO DEL TERRITORIO

### 10.1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RESTART

La L. 134/2012 individua tra le finalità della gestione ordinaria della ricostruzione quella di assicurare l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (art.67-ter, co.1) ed assegna all'USRC la competenza anche in ordine allo sviluppo dei territori (art.67-ter, co.2).

Allo scopo, **l'art. 11, co. 12, del D.L. n. 78/2015**, ha destinato una quota (**fino al 4%**) delle risorse finanziarie stanziata per la ricostruzione al **Programma di sviluppo RESTART**, predisposto dalla SdM – Struttura di Missione (ex DPCM 1 giugno 2014, confermata con modificazioni dal DPCM 4 ottobre 2019) ed approvato con **Delibera CIPESS n. 49/2016**, per interventi da attuarsi nel territorio del Cratere sismico abruzzese.


Con successive delibere CIPESS n. 70/2017, 115/2017, 25/2018, 56/2018, 20/2019, 54/2019, 16/2020, 17/2020, 70/2020, 43/2021, 69/2021 e 89/2021, sono stati approvati ulteriori interventi del Programma di sviluppo RESTART ed assegnate ulteriori risorse.

La delibera CIPESS n.89/2021 ha rimodulato il piano finanziario del Programma di sviluppo RESTART, riducendo la dotazione finanziaria complessiva dai precedenti 219,7 Mln € approvati con Delibera CIPESS n.49/2016 agli attuali **217,06 Mln €**. Tali risorse sono aggiuntive a quelle già assegnate allo sviluppo del Cratere sismico con **Delibera CIPESS n. 135/2012**, pari a **100 Mln €**.

Nella Tabella che segue è riportato lo stato di avanzamento del Programma per ciascuna delle Priorità o Ambiti tematici, con riferimento alle Delibere CIPESS sopra richiamate:

RIEPILOGO PROGRAMMA SVILUPPO (DELIBERA CIPE N. 49/2016 + DELIBERA CIPE N. 135/2012, COME RIMODULATO DALLA DELIBERA CIPE N.89/2021)						
PRIORITA' - AMBITI TEMATICI RESTART	RIPARTO FINANZIARIO / DOTAZIONE PRIORITA'	INCIDENZA SUL TOTALE PROGRAMMA	TOTALE RISORSE APPROVATE	% RISORSE APPROVATE SU DOTAZIONE PRIORITA'	RISORSE RESIDUE	% RISORSE RESIDUE SU DOTAZIONE PRIORITA'
	mln€	%	mln€	%	mln€	%
A - Sistema imprenditoriale e produttivo	114,2	36%	95,7	84%	18,5	16%
B - Turismo e ambiente	98,6	31%	66,3	67%	32,3	33%
C - Cultura	16,3	5%	14,8	91%	1,5	9%
D - Alta formazione	17,8	6%	15,0	84%	2,8	16%
E - Ricerca e innovazione tecnologica	58,9	19%	57,7	98%	1,2	2%
F - Agenda digitale	6,8	2%	6,8	100%	0,0	0%
G - Governance, monitoraggio e valutazione del programma di Sviluppo	4,4	1%	4,4	100%	0,0	0%
<b>TOTALE</b>	<b>317,0</b>	<b>100%</b>	<b>260,7</b>	<b>82%</b>	<b>56,3</b>	<b>18%</b>

#### PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA RESTART

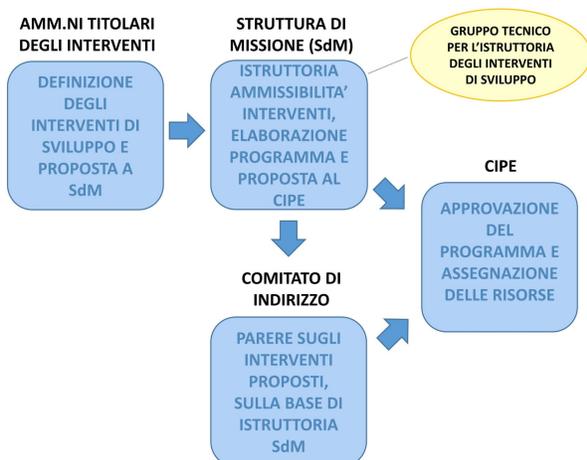

Nell'ambito della procedura di approvazione degli interventi del programma RESTART, l'USRC supporta la SdM - Struttura di Missione nella valutazione delle proposte d'intervento presentate dalle Amministrazioni Titolari e fa parte del **Comitato di Indirizzo**, nella figura del Titolare.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, l'USRC in fase di attuazione del programma è inoltre competente al **trasferimento delle risorse destinate agli interventi di RESTART a titolarità dei Comuni del Cratere sismico**, ad esclusione di L'Aquila, previa

istruttoria positiva da parte della SdM e trasferimento delle relative risorse da parte del MEF – Dipartimento del Tesoro.

Ad oggi, l'USRC ha effettuato il trasferimento di risorse per un importo complessivo pari a € **191.275,44**.

Il sito internet istituzionale dell'USRC rende disponibile l'informativa in ordine allo stato di attuazione del Programma RESTART, al link che segue: [Programma di sviluppo RESTART](#)

A far data dall'anno 2019, l'USRC sta affiancando la Struttura di Missione ed i 56 Comuni del Cratere nella predisposizione, da parte delle Aree Omogenee (AO) del Cratere, di **8 PIT – Progetti Integrati per il Turismo**, a valere sulle risorse disponibili per la **Priorità B – Turismo e Ambiente**.

Con delibera CIPESS n. 16/2020 è stato approvato il primo PIT, “**Terre della Baronia**”, proposto da 5 Comuni del Cratere appartenenti prevalentemente all'AO n. 4, per un importo pari a € **5.353.716,39**.

A partire dal 2021 l'USRC ha supportato la Struttura di Missione nell'istruttoria degli ulteriori 7 PIT delle restanti Aree Omogenee, propedeutica all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo e del CIPESS. In esito a tale attività, sono stati portati a definizione:

- il PIT “**Terre della Pescara**”, proposto da 7 Comuni dell'AO n.5, per un importo di **7.647.733,78 €**, approvato con Delibera CIPESS n.69/2021 a valere sulla Priorità B del Programma di Sviluppo RESTART;
- il PIT “**Altopiano d'Abruzzo: un museo all'aperto**”, proposto dai 5 Comuni dell'AO n.6, per un importo di **9.474.771,15 €**, approvato dal Comitato di indirizzo del Programma RESTART nella riunione del 3 marzo 2022 e successivamente dal CIPESS nella seduta del 14 aprile 2022.

I PIT hanno l'obiettivo di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico del territorio del Cratere, a completamento e valorizzazione delle azioni di ricostruzione dei borghi, in linea con la vocazione turistica prevalente dell'Area omogenea di appartenenza, mediante interventi fisici affiancati da interventi immateriali di marketing territoriale, volti a conseguire la riconoscibilità dell'offerta territoriale. I **PIT - Progetti integrati per il Turismo** sono diretti a potenziare:

- 1. Turismo storico culturale e religioso;**
- 2. Turismo naturalistico;**
- 3. Turismo dei borghi, delle tradizioni popolari ed enogastronomico.**



## 10.2 PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR

A far data dal settembre 2021, l'USRC sta inoltre lavorando congiuntamente alla Struttura di Missione, al Commissario straordinario per il sisma 2016 ed ai Comuni del Cratere al **Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016**, finanziato per un importo pari a **1,780 Mld€** a valere sulle risorse del **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR** di cui al D.L. n. 59/2021.

La Cabina di coordinamento integrata, istituita ai sensi dell'art.14-bis del D.L. n. 77/2021, presieduta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016, della quale fanno parte il Capo Dipartimento Casa Italia, il Coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, i Presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed i rappresentanti dei Comuni del Cratere 2009 e 2016, nella riunione del 30 settembre 2021 ha approvato il **Programma Unitario di Intervento**, articolato nelle seguenti Macromisure:

- **Macromisura A**, "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi", per la quale sono stanziati **1,08 Mld€**;
- **Macromisura B**, "Rilancio economico e sociale", per la quale sono stanziati **0,70 Mld€**.

Il Programma Unitario di Intervento e le Schede di dettaglio degli interventi finanziabili afferenti alle Macromisure A e B sono pubblicati sul sito del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, al seguente link:

<https://sisma2016.gov.it/2021/10/19/recovery-fund-aree-sisma-ecco-tutti-gli-interventi-finanziabili/>

Nella definizione del Programma, l'USRC ha effettuato il raccordo tecnico-amministrativo tra il territorio del Cratere ed i Soggetti attuatori del Programma, individuati nel Commissario Straordinario per il sisma 2016 e nella Struttura di missione sisma 2009.

### MACROMISURA A

Con riferimento al territorio del Cratere sismico 2009, nella prima fase di attività svolta da ottobre a dicembre 2021, l'USRC ha coordinato la ricognizione degli interventi approvati con Ordinanza commissariale nel dicembre 2021 dalla Cabina di coordinamento integrata (Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 n. 6, 7, 8, 9 del 30 dicembre 2021, n.15 del 31 dicembre 2021), con particolare riguardo alle seguenti linee di intervento della **Misura A** del Programma Unitario di Intervento:

- **sub-misura A.2, obiettivo 1** – "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici pubblici";
- **sub-misura A.3, obiettivo 1** - "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città";
- **sub-misura A.3, obiettivo 3.A** – "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici";
- **sub-misura A.3, obiettivo 3.C** – "Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita";
- **sub-misura A.4, obiettivo 5** - "Investimenti sulla rete stradale comunale".

Le Ordinanze del Commissario straordinario per il sisma 2016 di ammissione a finanziamento degli interventi del Programma a valere sulle risorse del Fondo complementare al PNRR sono pubblicate al seguente link: <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>

L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 n. 17 del 14 aprile 2022, come modificata dalla n.32 del 30 giugno 2022, ha disciplinato le procedure per il trasferimento delle risorse alle Amministrazioni responsabili degli interventi finanziati a valere sulla Misura A ed ha individuato gli adempimenti in capo agli Uffici Speciali.

Nel primo semestre 2022, le attività dell'USRC sono state orientate al supporto ai Comuni per il completamento delle Schede intervento relative alle sub-misure A3.1 ed A4.5 ed al monitoraggio degli adempimenti finalizzati al conseguimento della milestone del 30 giugno 2022 prevista dal DM MEF 15/7/2021. Tutte le attività hanno richiesto un impegno costante ed un continuo raccordo con i Soggetti attuatori del programma ed i Responsabili degli interventi per il rispetto delle serrate scadenze previste.

Con riferimento alle **Schede** relative agli interventi "Rigenerazione urbana" (linea di intervento A3.1) e "Rete stradale comunale" (linea di intervento A4.5), l'USRC ha acquisito e verificato la completezza delle Schede intervento a titolarità dei Comuni del Cratere sisma 2009, aggiornate ed integrate della relativa Sez.3, per la successiva trasmissione alla Cabina di coordinamento integrata entro il termine previsto del 31 marzo 2022.

L'USRC ha inoltre provveduto al coordinamento dei Comuni del cratere ai fini del **monitoraggio attuativo degli interventi**, secondo la *timeline* prevista dal cronoprogramma definito dal Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 e dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 per il periodo gennaio-giugno 2022, alla predisposizione della necessaria modulistica, all'acquisizione dai Responsabili degli interventi il Cronoprogramma degli adempimenti intermedi, nonché agli adempimenti connessi al conseguimento della *milestone* del 30 giugno 2022 posta dal DM MEF 15/7/2021, relativa all'approvazione, da parte dei Responsabili degli interventi, dei progetti da porre a base della gara di appalto. Ai fini della *milestone* del 30 giugno 2022, l'USRC ha provveduto, nel rispetto delle tempistiche stringenti previste dal cronoprogramma, ad espletare la verifica di completezza degli adempimenti da parte dei Responsabili degli interventi e a trasmetterne gli esiti ai Soggetti attuatori del Programma.


La Cabina di Coordinamento integrata, nella riunione del 30 giugno 2022, ha preso atto del **raggiungimento, da parte dei Responsabili degli interventi, della milestone fissata dal MEF per il primo semestre 2022** per gli interventi finanziati a valere sulla Macromisura A.

Con l'Ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022, sono state approvate le modifiche, correzioni ed integrazioni formali dell'elenco degli interventi di cui all'Ordinanza n.15 del 31 dicembre 2021, ad integrale sostituzione di quelle già introdotte dall'Ordinanza n. 18 del 14 aprile 2022, in esito alle quali risultano **278 interventi finanziati** per un importo complessivo pari a **123,78 Mln€**, distribuiti sulle diverse linee di intervento come da prospetto che segue:

LINEA DI INTERVENTO	N. INTERVENTI APPROVATI	IMPORTO APPROVATO
Sub-misura A.2, obiettivo 1 <i>"Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici pubblici"</i>	64	25.687.525,41 €
Sub-misura A.3, obiettivo 1 <i>"Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"</i>	91	53.710.314,79 €
Sub-misura A.3, obiettivo 3.A <i>"Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici"</i>	4	2.200.000,00 €
Sub-misura A.3, obiettivo 3.C <i>"Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita"</i>	62	26.858.526,06 €
Sub-misura A.4, obiettivo 5 <i>"Investimenti sulla rete stradale comunale"</i>	57	15.325.056,14 €
<b>TOTALE</b>	<b>278</b>	<b>123.781.422,40 €</b>

Gli interventi della **Macromisura A** intendono accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale attraverso l'innalzamento della sicurezza degli edifici, delle comunità e del territorio, e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Le risorse finanziarie assegnate ai Comuni del Cratere sisma 2009, per complessivi **123,78 Mln€**, sono destinate per il **22%** ad interventi su impianti sportivi, ricreativi e di risalita (linea di intervento **A3.3c**), per il **21%** ad interventi di rifunzionalizzazione sismica e/o energetica di edifici pubblici (linea di intervento **A1.1**), per il **12%** ad investimenti per l'adeguamento della rete stradale comunale, finalizzati alla realizzazione, adeguamento, riqualificazione o messa in sicurezza della viabilità di proprietà comunale. Il **2%** delle risorse è destinato all'implementazione dei 4 interventi sui **Cammini culturali, tematici e storici** (linea di intervento **A3.3a**), che interessano il territorio di 34 Comuni del Cratere, attraversando il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, per i quali l'USRC è Responsabile dell'intervento. La quota prevalente delle risorse, pari al **43%** del totale finanziato, è destinata ad interventi di **rigenerazione urbana dei borghi** (linea di intervento **A3.1**), da progettare e realizzare nell'ambito di un programma unitario inclusivo anche degli interventi finanziati a valere sulle risorse della ricostruzione. Tipologicamente, gli interventi di rigenerazione urbana sono orientati per il 71% alla riqualificazione dello spazio pubblico urbano, per il 28% all'implementazione di infrastrutture verdi, sportive, di mobilità lenta e pedonalità e per una residuale quota dell'1% all'implementazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. La dotazione della Linea di intervento A3.1 - *"Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"*, su iniziativa dei Soggetti attuatori del Programma, è stata incrementata con ulteriori risorse a valere sui fondi della ricostruzione 2009 e 2016, per assicurare agli interventi la dimensione finanziaria ottimale.

per conseguire l'obiettivo di miglioramento della qualità dei luoghi. Per i Comuni del Cratere 2009, gli interventi di rigenerazione urbana già finanziati a valere sulle risorse del PNC saranno pertanto sinergicamente integrati, nell'ambito di un Programma unitario di Rigenerazione urbana, con interventi da finanziare a valere su ulteriori risorse per la ricostruzione 2009.

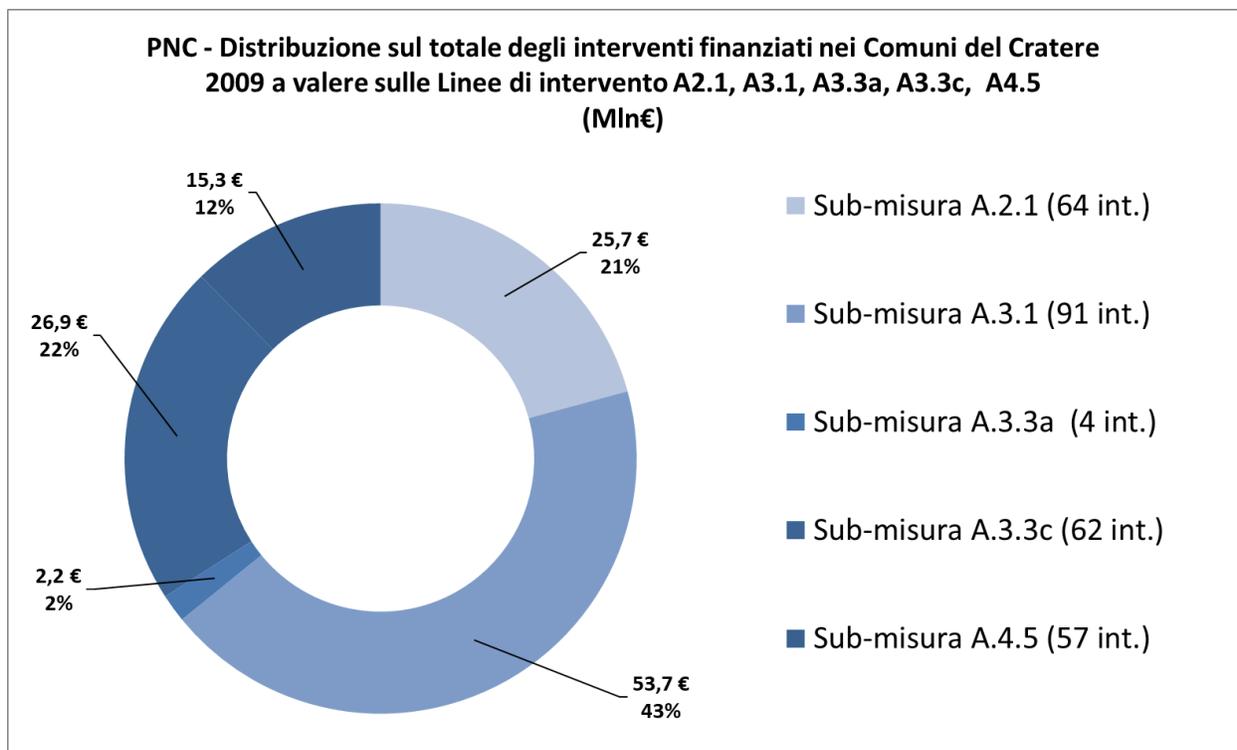

Le informazioni e gli aggiornamenti relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR sono inoltre disponibili anche nella sezione "Sviluppo del territorio" del sito istituzionale dell'USRC, nella pagina dedicata, al seguente link:

<https://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/piano-complementare-al-pnrr/interventi-per-le-aree-del-terremoto-2009-e-2016>

## MACROMISURA B

Gli interventi della **Macromisura B** sono destinati al rilancio economico e sociale del territorio. Intendono promuovere e sostenere investimenti in grado di far emergere e rafforzare le potenzialità economiche del territorio, e di valorizzare al tempo stesso le specificità economiche locali e le diverse forme di innovazione, attraverso interventi dedicati, differenziati per obiettivi, beneficiari, procedure di accesso, regimi di aiuto sottostanti, attività e spese ammissibili, forma e intensità delle agevolazioni.

La Cabina di Coordinamento integrata nella riunione del 30 giugno 2022, nel rispetto delle stringenti tempistiche dettate dal cronoprogramma di cui al DM MEF 15/7/2021, ha approvato gli 11 bandi dal valore di circa 700 milioni di euro della Macromisura B, oggetto delle Ordinanze del Commissario straordinario per il sisma 2016 n. 20 e 21 del 27 giugno 2022, n. 25, 26, 27, 29, 30 del 30 giugno 2022, relativi alle seguenti sub-misure:

- **B.1.1** "Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria" (Ord. n.20 del 27-04-2022);
- **B.1.2** "Interventi per progettualità di dimensione intermedia" (Ord. n.21 del 27-04-2022);
- **B.1.3a** "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori"(Ord. n.25 del 30-06-2022);
- **B.1.3b** "Interventi per l'innovazione diffusa"(Ord. n.25 del 30-06-2022);
- **B.1.3c** "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" (Ord. n.25 del 30-06-2022);
- **B.2.1** "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore" (Ord. n.29 del 30-06-2022);
- **B.2.2** "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" (Ord. n.30 del 30-06-2022);
- **B.2.3** "Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità" (Ord. n.29 del 30-06-2022);
- **B.3.1** "Costituzione di associazioni fondiarie o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali" (Ord. n.26 del 30-06-2022);
- **B.3.2** "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica" (Ord. n.27 del 30-06-2022);
- **B.3.3** "Ciclo delle macerie" (Ord. n.21 del 27-04-2022).

Il pacchetto approva le prime misure a sostegno dell'economia dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016 e mira a favorire lo sviluppo, la crescita occupazionale, l'inclusione sociale, anche attraverso il terzo settore, il turismo, la cultura, l'economia circolare, il riuso delle macerie, la filiera del legno ed agroalimentare e le comunità energetiche nei due crateri sismici 2009 e 2016. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016.

I bandi sono pubblicati sul sito [www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it). Con il completamento della procedura relativa al regime di aiuti da parte della Commissione Europea, i soggetti gestori Invitalia e Unioncamere provvederanno poi alla pubblicazione degli avvisi entro la metà di luglio con l'indicazione dei relativi tempi di apertura e chiusura degli sportelli.

### *10.3 PROGETTUALITA' PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO*

In tema di **valorizzazione turistica del territorio**, l'USRC già dal 2020 ha dato avvio all'implementazione di **"STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE"**, un quadro di area vasta delle risorse turistiche del territorio del Cratere, composto dall'analisi dei principali tematismi/valori e dalla sintesi degli stessi in una Visione guida, che mette a sistema le emergenze puntuali di valore storico, architettonico e naturalistico ed i percorsi fisici e tematici che le collegano, con

l'obiettivo di delineare un sistema integrato di fruizione e conoscenza dei luoghi, funzionale a consolidare l'identità e la cultura del territorio.

La Visione guida e le analisi ad essa presupposte sono rese disponibili ai Comuni del Cratere, quale strumento a supporto delle decisioni e delle proposte di intervento in materia di sviluppo del territorio, sul sito istituzionale dell'USRC, al seguente link: [Strategie sviluppo turistico](#)

Sulla base delle "STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE", l'USRC ha predisposto nel 2021 il Progetto «**Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani**», per un importo previsionale di 70 Mln €, entrato a far parte, insieme ad altre 73 proposte progettuali regionali, della "Banca progetti" della Regione Abruzzo, oggetto della proposta-contributo al **PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** "L'Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese", inviata il 15 ottobre 2020 dalla Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri agli Affari europei e agli Affari regionali. Il documento è disponibile al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr>

In vista delle opportunità offerte dal PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'USRC ha sviluppato, oltre *OPEN ABRUZZO*, altre progettualità rivolte all'intero territorio del Cratere.

La proposta progettuale "**ABRUZZO WAY OF LIFE**" è stata sviluppata dall'USRC a beneficio dei Comuni del Cratere sismico 2009, in risposta alle criticità rilevate sul territorio legate alla condizione di fragilità e di isolamento e confinamento territoriale dei soggetti fragili, in particolare anziani, presenti in alta percentuale nel territorio. Il progetto intende pertanto contrastare il fenomeno della marginalizzazione e sviluppare l'identità territoriale dei borghi come luoghi ad elevato grado di benessere e di salute per la comunità, attraverso la creazione di una serie di strumenti che migliorino la condizione di vita dei cittadini. Nell'ambito del progetto "**ABRUZZO WAY OF LIFE**", l'USRC è risultato vincitore, assieme alla Regione Abruzzo, della **2nd Open Call lanciata dall'Horizon Pilot Project Gatekeeper**, attraverso la proposta "**Abruzzo That Cares**", una delle 4 iniziative di intervento in cui è articolato il più ampio progetto "Abruzzo Way of Life. "**Abruzzo That Cares**", che rappresenta il **vero project core** di "Abruzzo way of life", coniuga l'uso delle più moderne tecnologie digitali con le esigenze di superare l'isolamento/confinamento territoriale e di garantire un costante monitoraggio della salute dei soggetti fragili, attraverso un nuovo modello di assistenza non più ospedale-centrico bensì paziente-centrico. La proposta specificatamente intende creare servizi digitali per garantire l'accesso a servizi efficienti e semplici alle persone più deboli per promuovere quel processo di resilienza individuale e collettivo nel fronteggiare eventi emergenziali, nella prestazione di professionalità ed erogazione di servizi continuativi.

La proposta progettuale "**ABRUZZO LAB: RIABITARE CON L'ARTE**", sviluppata da USRC, intende promuovere lo sviluppo locale dei comuni del cratere attraverso l'insediamento di una comunità artistico culturale internazionale nei territori delle Aree Omogenee del Cratere 2009 e trasformare i comuni in laboratori dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Offrire occasioni sociali di incontro e condivisione per le comunità locali e di contatto e scambio con l'esterno attraverso la creazione di un centro culturale, che possa nel tempo diventare luogo di ritrovo per artisti, amanti dell'arte e turisti in genere, contribuisce all'intento di voler sviluppare una nuova strategia di sviluppo territoriale a base culturale, capace di coniugare la visibilità globale dell'Abruzzo, i network e lo storytelling degli artisti, con i valori, le tradizioni e le memorie dei luoghi radicati nell'arte e nella storia. Questo progetto trova ispirazione nell'iniziativa di minore dimensione "**LAB-8: Riabitare con l'arte**" e dalle nuove prospettive di crescita che quest'ultima, in

attuazione nei mesi di giugno - settembre 2021, ha saputo innescare sul territorio dell'Area Omogenea 8, oggetto d'intervento. L'USRC ha supportato il progetto LAB-8 "Riabitare con l'arte" promosso da CARSA s.r.l., finanziato a valere sulle risorse 2019 dei fondi RESTART - filone C dedicato allo sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere. Il ruolo di supporto dell'USRC ha favorito sia un migliore coordinamento tra gli addetti ai lavori, sia una migliore strategia di promozione del progetto, attraverso un processo di integrazione e messa in rete di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti. L'obiettivo di **"ABRUZZO LAB: RIABITARE CON L'ARTE"** è rendere più esteso e duraturo il processo di insediamento di una comunità artistico-culturale internazionale, avviato con il progetto di minore dimensione "LAB-8: Riabitare con l'arte", producendo effetti economico-sociali a sostegno della ricostruzione materiale. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare i seguenti link:  
<https://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/in-evidenza>  
<https://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/in-evidenza/1012-lab-8-riabitare-con-l-arte-pillole>

## 11. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE



L'USRC gestisce le attività di rilevazione dei fabbisogni finanziari e di programmazione della spesa in raccordo con le Strutture Centrali ed alloca le risorse agli Enti beneficiari dei trasferimenti/contributi tramite emissione di ordinativi secondari di contabilità speciale, ottemperando alle prescrizioni normative circa le modalità e i termini di rendicontazione alla competente RTS.

Si consolidano nel corso del primo semestre 2022 le procedure legate all'adozione in via sperimentale di un nuovo sistema di contabilità unificata per la

gestione della C.S. 5731.

Tale progetto, unito ad una più ampia revisione dei processi di spesa, garantisce il raggiungimento di sempre più elevati livelli di razionalizzazione delle procedure e di riduzione dei tempi di pagamento.

A far data dall'aprile 2013, sono stati eseguiti n. **12.444** mandati di pagamento per un totale € **1.621.041.116,79** (dato al 30/06/2022).

Di questi, nel primo semestre del 2022 sono stati eseguiti n. **945** mandati di pagamento per complessivi € **89.334.915,60**.

Per il dettaglio si veda il sito <http://www.usrc.it/ammtrasparente.aspx>

Di seguito alcune delle principali attività di gestione fondi dell'USRC oltre quelli della ricostruzione privata, OO.PP., ed edilizia scolastica.

### 11.1 SPESE OBBLIGATORIE

L'USRC esegue l'istruttoria delle rendicontazioni effettuate dai Comuni sul portale di interscambio AVEIANET dove gli stessi possono compilare le schede relative alle diverse tipologie di spesa (CAS, LOCAZIONE TEMPORANEA ALLOGGI, TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO, CONTRATTI DI LOCAZIONE) al fine di richiedere il trasferimento dei fondi.

L'attuale normativa non prevede forme di finanziamento per le misure assistenziali "C.A.S." e "Locazioni/Affitti concordati" relativamente alle annualità successive al 2019. L'Ufficio pertanto istruisce le sole istanze tardivamente pervenute dagli Enti di riferimento.

Prosegue invece l'interlocuzione con le strutture centrali ai fini dell'assegnazione di nuove risorse per il finanziamento delle spese inerenti al "trasloco e deposito temporaneo del mobilio" – Art. 5 OPCM n. 3797/2009.

Nel primo semestre del 2022 è stato trasferito in favore dei Comuni del Cratere e Fuori Cratere l'importo complessivo di **€ 103.960,84** così suddiviso:

- **€ 24.920,00** per contributo di autonoma sistemazione;
- **€ 22.920,00** per contratti di locazione;
- **€ 56.120,84** per trasloco e deposito temporaneo del mobilio.

#### 11.2 CO.CO.CO.

Viene confermato dalla Legge di Bilancio 2022 il finanziamento delle spese del personale assunto ai sensi della normativa emergenziale dai Comuni del Cratere.

Nel primo semestre del 2022 è stato trasferito dall'USRC agli Enti titolari dei rapporti di lavoro l'importo complessivo di **€ 620.420,05**, ripartito come segue:

- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2019 € 9.000,00
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2020 € 80.857,91
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2021 € 508.962,14
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2022 € 21.600,00

#### 11.3 VIDEOSORVEGLIANZA

Nel primo semestre del 2022 sono stati erogati fondi per il finanziamento del "Safe Community – Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico" per un importo complessivo pari ad **€ 39.979,80** e sono stati assegnati complessivi **€ 134.966,36**.

Erogazioni	
Goriano Sicoli	€ 8.000,00
Rocca di Cambio	€ 31.979,80

Assegnazioni	
Rocca di Cambio	€ 39.974,76
Cagnano Amiterno	€ 39.991,60
Pizzoli	€ 55.000,00

#### 11.4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'USRC

Nel primo semestre del 2022 sono state gestite **212 fatture** per un importo complessivo di **€ 801.410,74 oltre IVA**, tutte gestite nei tempi di legge e con un tempo di liquidazione mediamente inferiore di 7 giorni rispetto alla scadenza della fattura. Gli indici di tempestività dei pagamenti sono consultabili [al link https://usrc.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione.html](https://usrc.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione.html)

Sul piano organizzativo, l'attività di liquidazione è stata incanalata in un processo disciplinato con disposizione di servizio del responsabile dell'Ufficio e la cui caratteristica essenziale è la previsione di tre livelli di controllo interno da attuarsi sull'istruttoria tecnico-amministrativa, sulla bozza di determinazione e sugli adempimenti obbligatori in tema di trasparenza. I tre livelli di controllo, di pari passo con l'approvazione di nuovi modelli di atti interni e provvedimenti, oltre a scongiurare eventuali comportamenti rilevanti sotto il profilo della prevenzione della corruzione, hanno consentito anche un'implementazione della qualità degli atti.

L'attività di approvvigionamento di beni e servizi per le esigenze dell'Ufficio si è svolta in piena coerenza con le previsioni del programma biennale degli acquisti (consultabile qui: <https://usrc.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture.html>), con 19 nuove procedure ad evidenza pubblica interamente espletate nel corso del primo semestre del 2022 oltre a 3 procedure di modifica delle condizioni contrattuali di affidamenti già in corso.

Per tutte le procedure si è garantito l'assolvimento degli obblighi di controllo sull'operatore in esecuzione di apposite linee guida di cui si è dotato l'USRC, oltre alla piena attuazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Da evidenziare il ricorso a procedure aperte anche per importi sotto soglia e l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o di altre piattaforme elettroniche anche al di sotto della soglia di obbligatorietà, al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività in questo settore particolarmente sensibile e la possibilità di accedere a prezzi maggiormente concorrenziali.

E' attualmente in via di approvazione il regolamento degli acquisti mentre è stato approvato il regolamento per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.

## 12. EVENTI ISTITUZIONALI, CONVEGNI E RELAZIONI ESTERNE

Nell'ambito delle attività istituzionali, delle attività di partecipazione a gruppi di lavoro, tavoli tecnici, incontri e delle attività di pianificazione e promozione di eventi, iniziative finalizzate alla promozione dell'immagine dell'Ufficio e alla promozione e allo sviluppo del territorio dei 56 comuni del Cratere, si riportano di seguito gli appuntamenti di maggiore prestigio a cui ha preso parte l'Ufficio.

### **31 gennaio PROGETTO DISCE** (Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies) - Focus Group

All'Ufficio Speciale è stato chiesto di offrire il proprio contributo nel confronto svolto in occasione del **Focus group** organizzato dal Progetto DISCE per affrontare le tematiche legate alle politiche culturali della città dell'Aquila e del suo territorio e contribuire all'obiettivo progettuale generale di comprendere e favorire lo sviluppo di economie creative sostenibili e inclusive d'Europa.

### **9 aprile PROCIDA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA** – Cerimonia Inaugurale

In occasione della Cerimonia inaugurale di Procida Capitale della Cultura 2022 l'Ufficio Speciale è stato ospite dell'evento, quale rappresentante di numerose comunità delle aree interne dell'Abruzzo, dove esperienze culturali basate sul tema dell'accoglienza, della cura, della partecipazione delle comunità, in linea con la visione portata avanti da Procida, rappresentano esempi di iniziative in cui viene percepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale quale fattore di sviluppo economico, di benessere collettivo e di inclusione sociale.

### **9 aprile METTERE IN RETE LA CONOSCENZA** – Strumenti per rafforzare la resilienza delle comunità

L'USRC ha presenziato al lancio del "**Toolkit for Disaster Preparedness**", realizzato all'interno del progetto "**Territori Aperti**", con l'obiettivo di fornire uno strumento, che attraverso la capitalizzazione di esperienze pregresse relative ai sismi 2009 e 2016, offra soluzioni per migliorare la prevenzione dei disastri nonché la risposta agli stessi. L'USRC ha contribuito al progetto ospitando i tirocini degli allievi del Master, seguendone i lavori finali in qualità di correlatore su temi riguardanti le infrastrutture urbane, la pianificazione ed il ruolo dell'USRC all'interno della governance dello sviluppo.

### **9 giugno LABORATORIO DI IDEE "PNRR E FONDO COMPLEMENTARE PER INVESTIRE SUL TERRITORIO"**

Si è trattato di un'iniziativa in cui grazie alla partecipazione della Struttura Commissariale del Sisma 2016, dei Sub Commissari per la ricostruzione sisma 2016 e dell'Ufficio Speciale sono state illustrate **l'opportunità di crescita e sviluppo** che il **Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e**

Resilienza offre, attraverso l'illustrazione dei numerosi interventi finanziati sui territori dell'Appennino centrale.

**21 – 24 - 28 giugno GOOD PUBLIC MANAGEMENT: ADVANCED SKILLS FOR PUBLIC OFFICIALS -**  
Workshop EPSA

- **Strategic workforce planning and talent management;**
- **Diverse Workforce and New Work: Inclusiveness and gender mainstreaming;**
- **Green Transition.**

A seguito dell'assegnazione del premio **“Good Practice Certificate”** per il Progetto **“Digital for Reconstruction grants”**, selezionato tra le **11 Best Practices** a livello europeo in occasione della competizione "Costruire un'Europa migliore per i cittadini", promossa da **EPSA (European Public Sector Awards)**, sistema di riconoscimento a livello europeo dedicato allo scambio e condivisione di soluzioni innovative e particolarmente efficienti all'interno delle PA, l'Ufficio Speciale ha preso parte ai seguenti workshop sostenuti dalla Commissione europea, direzione generale del Sostegno alle riforme strutturali (DG REFORM). Obiettivo generale di tali incontri è quello di consentire agli amministratori pubblici di migliorare la loro capacità di progettare e attuare riforme innovative in tempi di ripresa.

**25 – 26 giugno – TEDx L'AQUILA**

L'Ufficio è stato partner organizzativo del Villaggio esperienziale **TEDx L'Aquila**, evento ispirato ai TEDx, **Technology Entertainment Design**, organizzati in tutto il mondo e che ha visto la partecipazione di personaggi di spicco della cultura internazionale che hanno raccontato il loro punto di vista sul tema limiti. Anche la realtà dei nostri borghi è stata raccontata attraverso la voce di un artista internazionale e di alcuni rappresentanti del territorio (amministratori locali, esperti d'arte e cultura) che portando a testimonianza la propria esperienza di vita, hanno dato al pubblico la propria visione del concetto limiti e della sua declinazione rispetto al territorio che hanno scelto di abitare.

Nell'ambito della partecipazione a gruppi di lavoro, tavoli tecnici, l'Ufficio ha preso parte ai seguenti incontri:

**11 - 13 febbraio Workshop “Visione futura del Paese di Montorio” con la partecipazione del Politecnico di Milano**

**24 aprile Tavola Rotonda “Una nuova casa di comunità per Gagliano Aterno e la Valle Subequana”**

**5 luglio Workshop “Retelling the Rural Caporciano”**

Inoltre, tra le iniziative di promozione dell'immagine dell'Ufficio e di promozione e sviluppo del territorio che rappresenta, è in corso di redazione il **Piano di Comunicazione esterna**, che prevede tra l'altro, l'aggiornamento quotidiano dei canali social, la definizione della linea editoriale del sito web e di ogni altro mezzo di comunicazione.

## CREDITS

- Copertina [<https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/castelli-di-fondazione-dellaquila-fossa-il-baronato-del-gran-rifiuto.html>]
- pag.8 [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centro\\_storico\\_Navelli.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centro_storico_Navelli.jpg) - Sayatek, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons ]
- pag.12 [<https://www.fmdos.cl/noticias/santo-stefano-di-sessanio-pueblo-en-italia-ofrece-casi-10-mil-dolares-por-mudarte-alla/>]
- pag.24 [[https://abruzzoturismo.it/sites/default/files/2020-09/800px-Corno\\_grande\\_e\\_Pietracamela%2C\\_Gran\\_Sasso%2C\\_Provinc\\_e\\_of\\_Teramo%2C\\_Abruzzo%2C\\_Italy\\_-\\_panoramio.jpg](https://abruzzoturismo.it/sites/default/files/2020-09/800px-Corno_grande_e_Pietracamela%2C_Gran_Sasso%2C_Provinc_e_of_Teramo%2C_Abruzzo%2C_Italy_-_panoramio.jpg) ]
- pag.33 [<https://i0.wp.com/www.abruzzo-segreto.it/wp-content/uploads/Veduta-aerea-Chiesa-di-Madonna-del-Campo-03.jpg?fit=1920%2C1280&ssl=1>]
- Tutte le illustrazioni [<https://www.freepik.com/pch-vector>]
