

# LE ATTIVITÀ DI USRC AD OGGI

NOTA INFORMATIVA ANNO 2020



# SOMMARIO

## **USRC: PRINCIPALI RISULTATI 2020**

### **1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE**

### **2. PIANI DI RICOSTRUZIONE**

### **3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI CRATERE**

#### 3.1 STATO DI AVANZAMENTO

#### 3.2 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

##### 3.2.1 MODELLO INTEGRATO CRATERE

#### 3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

#### 3.4 ISTRUTTORIA RICHIESTE DI CONTRIBUTO E SAL IN SMART WORKING

#### 3.5 GESTIONE FONDI

#### 3.6 TRASPARENZA

#### 3.7 CONTRATTI

#### 3.8 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

### **4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE**

### **5. RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

### **6. EDILIZIA SCOLASTICA**

### **7. SVILUPPO DEL TERRITORIO**

### **8. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE**

## USRC: PRINCIPALI RISULTATI 2020



Il 2020 ha visto concreti risultati in ogni settore di attività dell'USRC, accompagnati da significative innovazioni nella gestione delle attività. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti salienti.

### RIORGANIZZAZIONE DELL'USRC

E' pienamente avviata l'intera riorganizzazione dell'USRC.

Personale di diversa provenienza e categorie professionali (a tempo indeterminato del MIT, a tempo determinato del Comune di Fossa, a tempo indeterminato dei Comuni capofila delle Aree omogenee, interinali) convive ed opera a stretto contatto per la gestione delle procedure tecnico-amministrativo-contabili legate alla ricostruzione.

Alla definizione, per la prima volta, di un unico obiettivo legato alla gestione delle performance dell'ufficio, ha fatto seguito – a valle della norma che ha introdotto le modalità di certificazione di un fondo grazie al quale riconoscere produttività, posizioni organizzative, emolumenti incentivanti prestazioni performanti –

l'introduzione in USRC di una nuova macro-struttura e di una delega di funzioni, attualmente invece demandate in via esclusiva al Titolare dell'Ufficio.

La riorganizzazione e la certificazione del fondo apposto per l'incentivo al personale servirà a garantire una gestione più efficace e performante. Alla nomina di un magistrato della Corte dei Conti che certificherà il fondo USRC, avvenuta a fine dicembre, seguiranno gli atti propedeutici alla piena attuazione delle strategie organizzative dell'Ufficio.

### DIGITALIZZAZIONE

La gestione a distanza del lavoro a causa della pandemia da Covid-19 è diventata una grande opportunità per far viaggiare le pratiche del cratere e fuori cratere in via esclusivamente digitale, eliminando completamente la carta attraverso l'ulteriore implementazione della piattaforma digitale USRC, già creata negli anni precedenti per l'acquisizione dei contratti tra privati per la ricostruzione privata; analogo sviluppo è partito per l'acquisizione della documentazione tecnico contabile da parte dei comuni, per le rendicontazioni obbligatorie da consegnare annualmente alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

### RICOSTRUZIONE PRIVATA

Nel 2020 l'USRC, mediante l'introduzione di piattaforme e procedure digitali sviluppate tutte

internamente, con il proprio personale in smart working al 90%, ha trainato un'intera comunità garantendo continuità di risorse economiche, centinaia di nuove abitazioni tornate agibili e costante supporto ai 56 Comuni del Cratere ed ai circa 100 fuori Cratere del sisma 2009, messi in rete dall'USRC.

Questi alcuni dei principali risultati raggiunti nel 2020 (dati relativi a comuni del Cratere e Fuori del Cratere):

- 660 ulteriori istruttorie avviate nel 2020 di progetti di riparazione con miglioramento sismico di aggregati/edifici, relative a 4150 immobili;
- 950 cantieri in corso di cui 220 avviati nel 2020 relativi a 1950 immobili per un valore di 230 milioni di €;

- lavori conclusi per 1350 immobili tornati agibili 2020.

## EDILIZIA SCOLASTICA

Nel corso del 2020 sono stati conclusi 10 interventi di edilizia scolastica di miglioramento/adequamento sismico e nuova costruzione, per un totale complessivo di 14.088.755,08 €.

Inoltre sono stati trasferite risorse per 9.761.828,84 € ed assegnate risorse per 3.623.517,78 € per l'attuazione degli interventi in corso, 15 dei quali si concluderanno entro il 2021.

USRC_Edilizia scolastica_Interventi conclusi	Importo
I.T.C. "C. Rosa" di Nereto - Provincia di Teramo	1.308.494,00 €
Liceo Classico Delfico - Provincia di Teramo	1.169.178,00 €
Scuola Don Bosco - Avezzano	473.041,00 €
Scuola media Capograssi - Sulmona	2.551.000,00 €
Istituto omnicomprensivo del Comune di Carsoli.	1.980.842,08 €
Scuola media - Comune di Castel di Sangro	4.720.000,00 €
Scuola materna Polo Marrocchi – Comune di Campi	600.000,00 €
Scuola primaria di Cerratina - Pianella	59.900,00 €
Scuola materna e media in Via Alcide de Gasperi - Comune di Montebello Di Bertona	500.000,00 €
Scuola elementare - Nuovo polo scolastico - Comune di Oricola	726.300,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>14.088.755,08 €</b>

E' stato possibile conseguire tali risultati grazie anche al fondamentale contributo di tutti gli altri addetti ai lavori, 150 amministrazioni comunali, e ca 5000 tra presidenti di consorzio, progettisti e direttori dei lavori, Ditte appaltatrici, subappaltatori e fornitori.

## **SVILUPPO DEL TERRITORIO**

Nel corso del 2020, nell'ambito del Programma di Sviluppo Restart, è stato concluso ed approvato il primo Progetto Integrato per il Turismo (Area Omogenea 4, "Terre della Baronia", per un importo di € 5.353.716,39). Continuerà nel 2021 l'iter per il finanziamento dei Progetti Integrati per il Turismo proposti dalle restanti 7 Aree Omogenee del Cratere 2009. In tema di valorizzazione turistica del territorio, nel 2020 l'USRC ha sviluppato il Progetto «Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani», per un importo di 70 mln€, entrato a far parte della proposta-contributo della Regione Abruzzo al PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Recovery Fund).

## **RICOSTRUZIONE CHIESE**

Sottoscrivendo una convenzione con il MIBACT nel mese di settembre, l'USRC ha offerto collaborazione all'ente competente per la realizzazione degli interventi di recupero post-sismico delle chiese del Cratere 2009. Otto risorse umane USRC (4 RUP e 4 supporti al RUP) metteranno le proprie competenze professionali al servizio del Segretariato Regionale del MIBACT per appalti da avviare su 7 chiese; ulteriori collaborazioni e nomine avverranno nel corso del 2021.

# 1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE



La Legge 7 agosto 2012, n.134 (cosiddetta “Legge Barca”), artt. 67-bis e 67-ter, ha disposto la cessazione al 31 agosto 2012 dello stato di emergenza successivo al sisma del 6 aprile 2009 ed ha istituito l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, USRC), con sede a Fossa (AQ), per le finalità attinenti la gestione ordinaria della ricostruzione, sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, nei territori dei Comuni del Cratere, ad esclusione di L’Aquila, e dei Comuni fuori Cratere (cfr. L.125/2015, art.11, co.13).

L’Intesa<sup>1</sup> dell’agosto 2012, ha disciplinato gli aspetti organizzativi dell’Ufficio, prevedendo per esso una dotazione di risorse umane di 50 unità ad esso assegnate, di cui 25 a tempo determinato (art. 67-ter, co. 3, L. n.134/2012), dipendenti del Comune di Fossa, e 25 a tempo indeterminato (art. 67-ter, co. 6, L. n.134/2012), dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<sup>1</sup> Intesa sottoscritta ai sensi dell’ art. 67-ter della Legge 7 agosto 2012, n.134.

La Legge 7 agosto 2012, n.134, ha assegnato all’USRC, tra l’altro, il coordinamento degli otto Uffici territoriali per la ricostruzione (di seguito, UTR), costituiti ai sensi dell’OPCM n.4013 del 2012 dai Comuni di ciascuna Area Omogenea per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati, per i quali la L. n. 134/2012 ha previsto una dotazione di risorse umane complessivamente pari a 72 unità di personale a tempo indeterminato (art. 67-ter, co. 5, L. n.134/2012), dipendenti dei Comuni del Cratere.

Dal 1° luglio 2018 gli UTR sono stati soppressi e le relative competenze sono state trasferite all’USRC (co.32, art.2-bis, L. n.172/2017). Da allora, il Titolare dell’USRC ha in capo la direzione ed il coordinamento esclusivi del personale in servizio presso gli UTR, assegnato anch’esso all’USRC (co.3, art.22, L.55/2019), nonché la gestione del processo di soppressione di detti Uffici Attraverso specifici provvedimenti organizzativi e gestionali. In una prima fase del processo sono stati costituiti, tramite convenzioni con i Comuni, 8 Sportelli Decentrati dell’USRC(di seguito, SP) presso le medesime sedi dei soppressi UTR, incaricati - nelle more della riorganizzazione prevista per legge - dei medesimi compiti degli Uffici territoriali soppressi.

A partire dal 2019, la riorganizzazione ha avuto maggiore impulso con la definitiva soppressione di 3 degli 8 Sportelli Decentrati (SP n. 2 con sede in Barete (AQ), SP n. 4 con sede in Castel del Monte (AQ), e SP n. 6 con sede in Caporciano(AQ)) ed il trasferimento del relativo personale presso la sede dell’USRC a Fossa

(AQ). Contestualmente alla riorganizzazione logistica, nell'anno 2019 è stato posto in essere anche l'accentramento delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, la cui gestione è transitata dai soppressi UTR all'USRC.

In esito all'evoluzione normativa sopra descritta, l'USRC, oltre al coordinamento del processo di ricostruzione privata, condotto sin dall'avvio dell'Ufficio nel 2013, ha oggi in capo direttamente anche l'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, attualmente effettuata nella sede centrale di Fossa e nei 5 Sportelli Decentrati nelle Aree omogenee del Cratere.

La competenza per l'istruttoria dei contributi alla ricostruzione privata va ad aggiungersi alle altre

competenze assegnate all'Ufficio sin dalla sua istituzione. L'USRC, infatti, cura la programmazione ed istruttoria tecnica degli interventi di ricostruzione pubblica e del Piano "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza", cura l'attuazione dei Piani di Ricostruzione (dei quali ha effettuato l'istruttoria nel profilo di congruità economica), cura l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, gestisce la contabilità speciale, effettua il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, cura la trasmissione periodica dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, effettua la gestione delle assegnazioni e dei trasferimenti dei fondi per la ricostruzione privata, promuove l'attrattività e lo sviluppo economico e sociale del territorio del cratere.

## USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

AVVIO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO	8 aprile 2013
RISORSE UMANE	<b>101 unità</b> di personale attualmente in servizio, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>62</b> in servizio presso la sede centrale dell'USRC;</li> <li>● <b>39</b> in servizio presso le sedi degli Sportelli Decentrati dell'USRC.</li> </ul>

SEDE USRC	FOSSA (AQ), Villaggio San Lorenzo, Piazza Gemona, 1		
SEDI SPORTELLI DECENTRATI USRC	NUMERO UNITÀ DI PERSONALE	COMUNE CAPOFILA AO	COMUNE SEDE SP
SP 3	5	COLLEDARA	MONTORIO AL VOMANO
SP 5	10	CUGNOLI	BUSSI SUL TIRINO
SP 7	6	GORIANO SICOLI	GORIANO SICOLI
SP 8	13	BARISCIANO	BARISCIANO
SP 9	5	ROCCA DI MEZZO	ROCCA DI MEZZO

L'USRC è inoltre competente anche sui Comuni fuori Cratere (cfr. L. 71/2013, art.7, co.6; L.125/2015, art.11, co.13) per ciò che attiene la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata ed i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione.

In particolare, ai sensi della Delibera CIPE n. 1/2014, al fine di garantire uniformità nei processi tecnici ed amministrativi per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata, anche i Comuni fuori Cratere sismico, per l'istruttoria delle richieste di contributo, si sono avvalsi degli UTR. A seguito delle modifiche introdotte dalla L. L.172/2017, a far data dal 1° luglio 2018 anche tale competenza è in capo all'USRC.


Nel corso del 2020 l'accentramento delle attività istruttorie per la ricostruzione privata ha avuto una forte fase di impulso nonostante 10 mesi su 12 in fase di gestione delle attività in smart-working, con lo smaltimento di più della metà delle pratiche giacenti in attesa di essere istruite.

Nel 2020, infatti, la percentuale delle pratiche ancora da avviare è passata dal 50% al 25% per il cratere e dal 50% al 38 % per i comuni fuori cratere che si avvalgono del supporto istruttorio dell'U.S.R.C.

Tale impulso è stato inoltre caratterizzato dalla totale digitalizzazione delle procedure istruttorie nel cratere, pratiche e SAL e di parte di quelle fuori cratere (pratiche).

## 2. PIANI DI RICOSTRUZIONE

La Legge n. 77 del 24 giugno 2009, di conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, all'art.14, co.5-bis, ha previsto che la ricostruzione dei centri storici dei Comuni del cratere avvenga previa predisposizione dei Piani di Ricostruzione, i cui obiettivi, contenuti e procedura di approvazione sono definiti dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo n.3 del 9 marzo 2010.

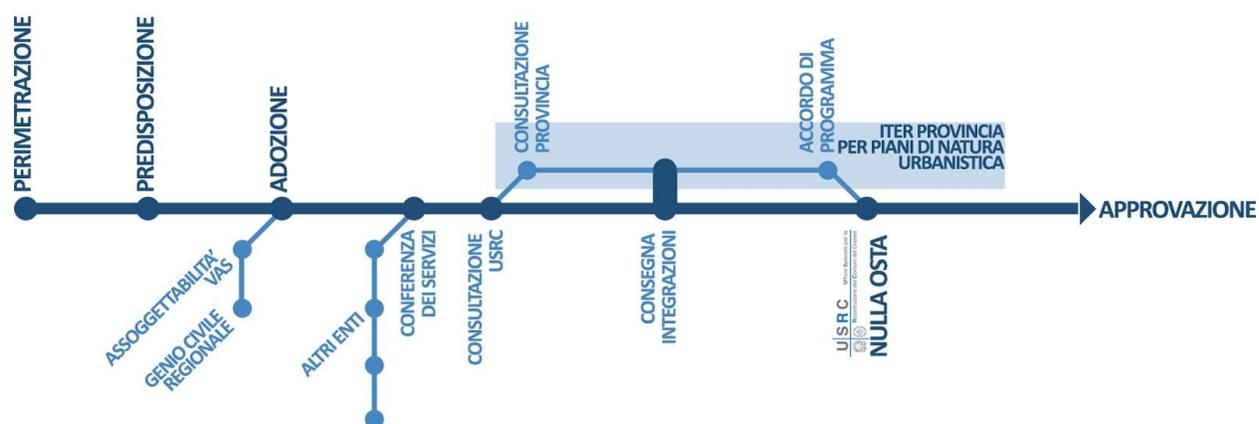

Dei 56 Comuni del Cratere, **55 Comuni** hanno predisposto il PdR e sono pervenuti alla conclusione dell'iter di approvazione. Di questi:

- **11 Comuni** hanno raggiunto l'Intesa sul PdR tra Sindaco, Presidente della Provincia e Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, nel corso dello stato di emergenza;
- **44 Comuni** (2 dei quali, Barete e Barisciano, con riferimento agli Ambiti non oggetto di Intesa nella fase emergenziale) hanno ottenuto l'attestazione della congruità economica del PdR con Nulla osta dell'USRC, nella gestione ordinaria.

L'USRC ha stimato le risorse residue occorrenti per la ricostruzione del centro storico di 1 Comune, Torre de' Passeri, unico nel Cratere a non aver predisposto il PdR, non avendo raggiunto nel corso dello stato di emergenza l'Intesa sulla Perimetrazione del centro storico (art.3, DCD 3/2010).



La Legge n. 134 del 7 agosto 2012, all'art. 67-quinquies, ha attribuito al Piano di Ricostruzione natura strategica - come tale, è finalizzato a quantificare le esigenze finanziarie per la ricostruzione e a disciplinare le modalità di attuazione ed il cronoprogramma degli interventi di ricostruzione del centro storico – ovvero, se asseverato dalla Provincia, anche urbanistica, qualora abbia contenuti urbanistici che aggiornano, modificano, integrano o sostituiscono gli strumenti di pianificazione vigenti.

Dei Piani di ricostruzione approvati dai 55 Comuni del Cratere, **8 hanno natura strategica**, mentre **47 hanno natura anche urbanistica**.

A conclusione del processo di pianificazione, il quadro programmatico delle risorse necessarie per la ricostruzione dei centri storici dei **56 Comuni del Cratere** ammonta a complessivi **3,4 Mld €**, di cui 3,1 Mld € per interventi di ricostruzione privata e 0,3 Mld € per interventi di ricostruzione pubblica.

## 3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE

### 3.1 STATO DI AVANZAMENTO


Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere è stimato un fabbisogno finanziario complessivo pari a 4,75 Mld €, così articolati:

- **3,1 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati negli Ambiti dei Piani di Ricostruzione;
- **1,0 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati nei centri storici, ma esterni agli Ambiti dei Piani di Ricostruzione;
- **0,4 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati fuori dai centri storici (periferie);
- **0,25 Mld €** necessari alla copertura dei maggiori costi dovuti all'aggravamento del danno causato dal sisma 2016, a valere sulle risorse della contabilità del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Centro Italia (art.4, D.L. 189/2016).

Dal 2009 ad oggi, nei 56 Comuni del Cratere, risultano concessi (con decreto comunale) e ammessi (con istruttoria positiva e in attesa decreto) contributi per un importo complessivo pari a **1,9 Mld €** (dato periferia + centro storico se non vengono considerati gli importi corrispondenti agli esiti di agibilità A). Tale valore, 1,9 Mld €, corrisponde al **40%** del fabbisogno finanziario previsto, distribuiti nel tempo come da grafico che segue (dato al 15/12/2020 con monitoraggio al 31/08/2020).

La concessione di contributi, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 31/10/2020, segnala un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di **1,5 Mld €** (1,75 Mld € includendo anche il canale di finanziamento agevolato e compresi gli esiti A).

Nel solo **anno 2020**, l'importo di contributi concessi e ammessi (ancora non concessi) è pari a **246 Mln €**.

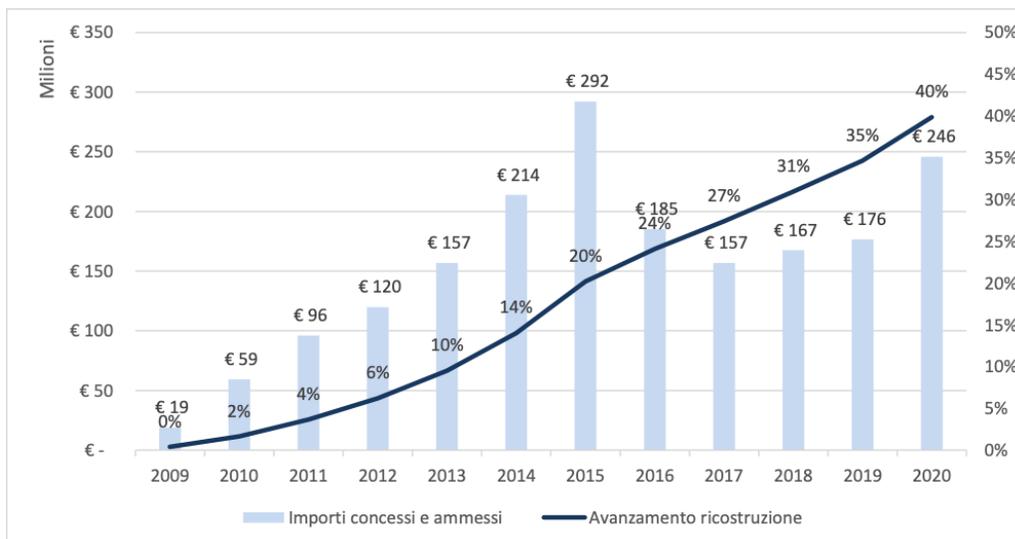



*Ammissioni:  
Avanzamento  
nel tempo della  
concessione dei  
contributi alla  
ricostruzione  
privata nei  
Comuni del  
Cratere (dati al  
15/12/2020).*



Il dato è in linea con l'annualità 2019 e significativo se rapportato alle precedenti annualità, essendo uno dei migliori risultati finora conseguiti, dove il massimo è stato raggiunto quando non era ancora avviata l'attività di verifica dei SAL da parte dello stesso personale incaricato delle istruttorie delle richieste di contributo.

Occorre tuttavia riportare il dato medio del cratere con le specificità della singola Area omogenea. Nel dettaglio, per le **Aree omogenee n. 2 e 3** l'indice di avanzamento della ricostruzione privata è, ad oggi, pari al **20%** del fabbisogno previsto, come rilevato nel prossimo diagramma, in primis perché tali aree sono state interessate anche dal sisma del 2016 e dalle problematiche legate alla sovrapposizione del danno tra i 2 sismi (12 Comuni del Cratere sisma 2009, situati nelle AO n.2 e n.3, appartengono anche al Cratere sisma 2016); in particolar modo per l'Area omogenea 2 si è aggiunta la radicale trasformazione con la chiusura dello sportello, fortemente voluta da parte dei sindaci dell'Area Omogenea e resasi indispensabile poi con l'uscita di parte del personale dello stesso sportello.

Nelle **altre Aree omogenee del Cratere**, l'indice di avanzamento della ricostruzione privata è invece significativamente superiore della media dell'intero cratere, attestandosi al **48%**. Si vedano, a riguardo, i grafici che seguono.

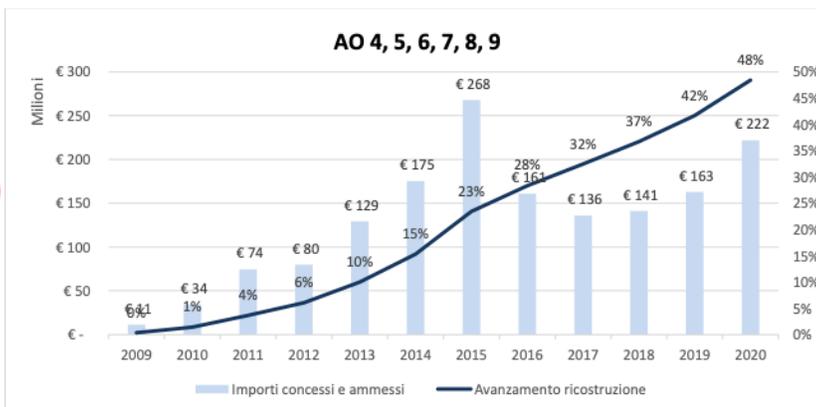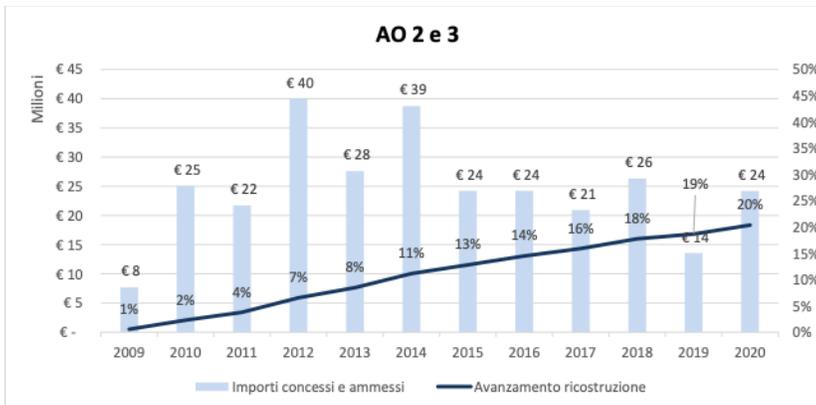

*Ammissioni: Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere. Specifica per AO (dati al 15/12/2020).*

In realtà, laddove si rappresentano i dati di avanzamento per singola Area Omogenea o per singolo comune, si riesce a comprendere quanto parlare di avanzamento complessivo della ricostruzione privata del cratere sia poco rappresentativo del fatto che nei piccoli comuni lo stato della ricostruzione privata è fortemente variabile; tale variabilità è osservabile in primis tra Aree Omogenee, dove le scelte in fase di emergenza legate allo sviluppo dei Piani di Ricostruzione ha giocato un ruolo determinante: si pensi ad esempio che nel 2012 i comuni dell'Area Omogenea 5 avevano tutti completato i Piani di Ricostruzione e potevano pertanto affrontare la ricostruzione dei centri storici con il proprio Ufficio Territoriale di Bussi sul Tirino a partire dal 2013, anno in cui la nuova Governance USRC/UTR diventava operativa, mentre i comuni dell'Area Omogenea 3 completano i Piani di Ricostruzione nel 2015.

Ne consegue che la percentuale media del 40% è dovuta a valori medi per area omogenea che variano tra un minimo del 18% (AO2) ad un massimo del 60% (AO5).

	Atteso	Ammesso	Percentuale
AO2	€ 1.076	€ 198	18%
AO3	€ 369	€ 95	26%
AO4	€ 221	€ 71	32%
AO5	€ 298	€ 207	69%
AO6	€ 558	€ 224	40%
AO7	€ 256	€ 126	49%
AO8	€ 1.549	€ 723	47%
AO9	€ 411	€ 229	56%
<b>Totale</b>	<b>€ 4.738</b>	<b>€ 1.873</b>	<b>40%</b>

*Ammissioni: Percentuale di Ammissione a contributo per singola Area Omogenea (dati al 15/12/2020).*

Si riporta di seguito l'andamento delle ammissioni 2020, distribuite per Area omogenea:

Area	Capofila	Percentuale	Importo
AO2	Barete	9%	€ 21.560.800
AO3	Montorio al Vomano	1%	€ 2.610.164
AO4	Castel del Monte	2%	€ 4.913.394
AO5	Cbussi sul Tirino	4%	€ 9.172.129
AO6	Caporciano	14%	€ 34.610.193
AO7	Goriano Sicoli	5%	€ 12.251.357
AO8	Barisciano	55%	€ 136.330.831
AO9	Rocca di Mezzo	10%	€ 24.339.619
<b>Totale</b>		<b>100%</b>	<b>€ 245.788.487</b>


*Ammissioni e concessioni: distribuzione per singola Area omogenea nell'anno 2020 (dati al 15/12/2020).*

Si riporta di seguito l'andamento delle assegnazioni effettuate nel 2019 e 2020. Si evince un aumento del numero di pratiche assegnate per la conseguente istruttoria (incremento del 13%) rispetto a quello del 2019. L'azione di recupero delle giacenze passate è confermato dai dati illustrati più avanti che mostrano la netta diminuzione delle pratiche in attesa di istruttoria.

AREA OMOGENEA	Assegnazioni 2019		Assegnazioni 2020	
	N.	Importo [€]	N.	Importo [€]
AREA 2	143	€ 93.695.197	138	€ 99.962.676
AREA 3	42	€ 17.673.127	25	€ 11.758.932
AREA 4	19	€ 8.965.494	6	€ 4.449.321
AREA 5	92	€ 39.478.456	142	€ 58.301.676
AREA 6	98	€ 153.264.172	52	€ 74.872.884
AREA 7	21	€ 24.168.214	26	€ 23.127.859
AREA 8	99	€ 130.996.500	77	€ 119.961.241
AREA 9	30	€ 23.441.292	150	€ 16.398.133
<b>TOT</b>	<b>544</b>	<b>€ 491.682.451</b>	<b>616</b>	<b>€ 408.832.723</b>

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento in termini di **cantieri e SAL**, invece, ad oggi è stato liquidato un importo complessivo pari a **1,14 Mld €** (dato periferia + centro storico senza esiti A). La maggior parte delle erogazioni hanno interessato l'Area Omogenea n.8, che comprende il più alto numero di Comuni (11) con la maggior entità di danno, seguita dall'Area Omogenea 5; sono allo stesso livello di liquidazioni le Aree Omogenee 2, 6 e 9; chiudono Goriano Sicoli, Montorio al Vomano e Castel del Monte, per ragioni principalmente di minore estensione territoriale rispetto alle altre aree omogenee.

Il dato delle liquidazioni per l'avanzamento dei cantieri dell'ultimo biennio è positivo, stante anche la presenza della emergenza Covid 19. Tale risultato è ottenuto anche grazie, come si dirà nel seguito, alle nuove procedure volte allo snellimento delle istruttorie SAL introdotte nel luglio 2019 e alla digitalizzazione delle procedure nel 2020.

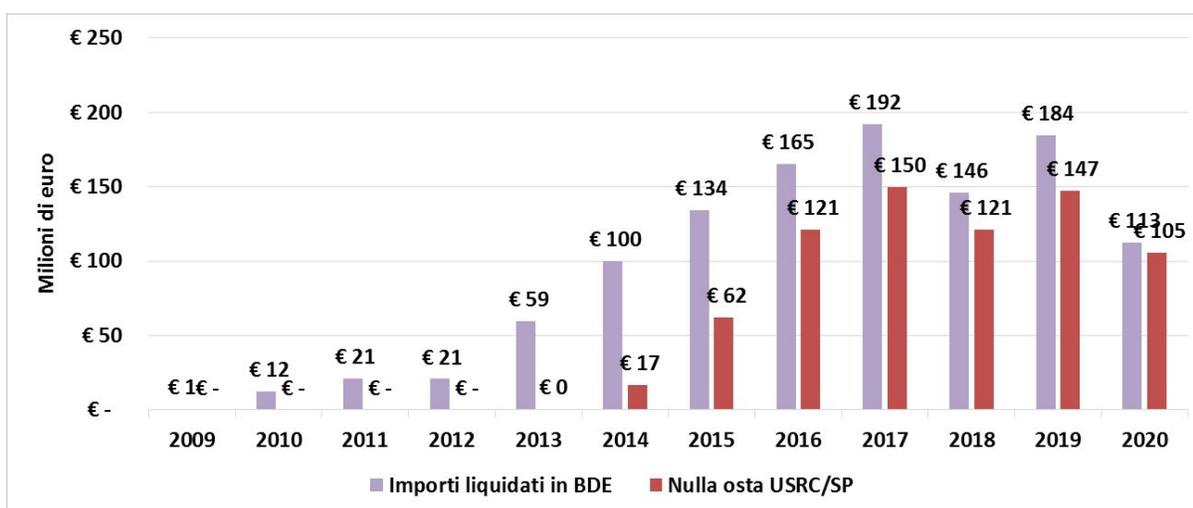

*SAL: Avanzamento nel tempo delle erogazioni a seguito di nulla osta SAL per la ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (dati al 15/12/2020).*

Area	Capofila	Perc.	Importo	Di cui USRC/SP
2	Barete	10%	€ 119.410.912	€ 62.453.542
3	Montorio al Vomano	6%	€ 69.655.736	€ 14.536.879
4	Castel del Monte	4%	€ 46.650.382	€ 45.684.200
5	Bussi sul tirino	14%	€ 159.133.803	€ 118.071.048
6	Caporciano	11%	€ 123.574.815	€ 90.650.026
7	Goriano Sicoli	8%	€ 87.123.174	€ 51.612.873
8	Barisciano	36%	€ 413.147.831	€ 257.626.579
9	Rocca di Mezzo	11%	€ 123.191.239	€ 83.525.333

*SAL: Distribuzione degli importi totali dei contributi liquidati tra le aree omogenee - SAL. (dati al 15/12/2020).*

Osservando l'andamento delle ammissioni a contributo dal 2009 al 2020 emerge un progressivo incremento della capacità di ammissione mensile media fino al 2015, che passa dai 9,9 Mln€ del 2012 ai 24 Mln€ nel 2015. A partire dal 2015 si osserva invece un calo della capacità di ammissione fino al 2017, anno in cui il trend si inverte nuovamente.

Anno	Importo totale (Milioni di €)	Media mensile (Milioni di €)	Percentuale annua su totale
fino al 2011	174	15	9%
2012	120	10	6%
2013	157	13	8%
2014	214	18	11%
2015	292	24	15%
2016	185	15	10%
2017	157	13	8%
2018	167	14	9%
2019	176	15	9%
2020	246	20	13%

*Ammissioni: Andamento ammissioni contributi (dati al 15/12/2020)*

La riduzione delle ammissioni va spiegata anzitutto con il notevole aumento dell'attività di istruttoria degli stati di avanzamento lavori negli anni 2015-2017, come riportato nella tabella sottostante riferita agli importi ammessi a liquidazione da parte degli uffici preposti (prima UTR, ora SP e USRC):

Anno	Importo totale SP/USRC (Milioni di €)	Media mensile (Milioni di €)	Percentuale annua su totale
2015	62	5	10%
2016	121	10	20%
2017	150	12	25%
2018	121	10	20%
2019	147	12	24%
2020	105	9	18%

*SAL: Andamento istruttorie SAL (dati al 15/12/2020)*

E' interessante notare come per la prima volta nel 2019 si assiste ad un incremento congiunto dei trend sia nella ammissione delle pratiche che nella liquidazione dei SAL, pur in corrispondenza di una riduzione complessiva del personale degli sportelli (da 55 a 39 risorse umane). Ciò si spiega con un riequilibrio delle attività in capo al personale USRC, con un incremento dei carichi di lavoro per il personale MIT e a tempo determinato con sede a Fossa, che dalla seconda metà del 2018 inizia a svolgere anche l'attività di istruttoria delle pratiche di ricostruzione privata, ad invarianza dei carichi lavorativi per il personale degli sportelli, che si concentrano maggiormente sui SAL mentre il personale degli sportelli si concentra maggiormente sui SAL pur continuando a istruire le pratiche già avviate. Nell'anno 2020 l'emergenza pandemica ha determinato una flessione delle erogazioni. Tra i principali motivi si annoverano il fermo seppur temporaneo dei cantieri nel periodo marzo-aprile 2020 e una contrazione della presentazione dei SAL. Infatti se nel 2019 si annotano 718 SAL, nel 2020 sono stati presentati 665 SAL sebbene con importi paragonabili.

Si riporta di seguito il riparto per Area Omogenea degli importi delle istruttorie SAL, ammessi nell'anno 2020:

Area	Capofila	Perc.	Importo
2	Barete	8%	€ 8.683.869
3	Montorio al Vomano	3%	€ 2.921.200
4	Castel del Monte	5%	€ 5.774.124
5	Bussi sul tirino	12%	€ 13.482.356
6	Caporciano	14%	€ 15.795.019
7	Goriano Sicoli	6%	€ 7.259.561
8	Barisciano	36%	€ 40.774.746
9	Rocca di Mezzo	16%	€ 17.939.369
	Totale		€ 112.630.244

*SAL: Riparto per Area Omogenea delle ammissioni SAL nell'anno 2020 (dati al 15/12/2020)*

### 3.2 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO



Al 15/12/2020 rispetto al totale di **1479 istanze** da approvare (per un totale di **1.090 Mln€**) risultano di esse presso la sede di Fossa un numero pari a **670 istanze** (per un totale di **537 Mln€**) pari al 45% di tutte le pratiche ancora da approvare.

Il coordinamento funzionale degli Sportelli Decentrati è finalizzato alla gestione e standardizzazione delle procedure ed al controllo di efficacia ed efficienza del processo di riconoscimento ed erogazione del contributo.

L'attività di coordinamento ha consentito di pervenire, ad oggi, a processi istruttori sostanzialmente uniformi anche tra i diversi Sportelli Decentrati.

Tale risultato è stato ottenuto in particolare a seguito dell'introduzione del Modello Integrato Cratere.

La principale attività di coordinamento dal punto di vista tecnico prevede l'analisi e la condivisione di problematiche emerse

nell'ambito delle attività istruttorie, poste dai Responsabili del procedimento operanti presso l'USRC e presso gli Sportelli Decentrati in un tavolo di coordinamento che si riunisce con cadenza periodica e in occasione di particolari problematiche.

Grazie ad un sistema di scambio informazioni costruito su una unica e omogenea struttura dati il Settore Ricostruzione Privata dell'USRC può pubblicare con frequenza quasi settimanale le informazioni sull'andamento dello stato istruttorio delle richieste di contributo e degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) depositate presso l'USRC e gli Sportelli Decentrati, sul proprio sito istituzionale:

<http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-della-pratica>

A seguito dell'inizio dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19, l'USRC ha ritenuto opportuno indirizzare l'acquisizione delle richieste di contributo attraverso una piattaforma telematica già in uso dall'utenza per la trasmissione dei contratti. La conoscenza dell'ambiente da parte degli utilizzatori (presidenti di consorzio e professionisti) ha permesso di mantenere con continuità la presentazione e della documentazione digitale e il conseguente processo di ricostruzione senza necessità di presenza fisica presso lo sportello di front-office.

Il quadro di avanzamento delle pratiche Sisma 2009 all'interno degli Sportelli e dell'USRC è suddiviso in:

- Pratiche Presentate
- Pratiche Ammesse
- Pratiche con Archiviazione e Dineghi
- Pratiche in attesa di ammissione.

	Presentate [n.]	Presentate [€]	Ammesse [n.]	Ammesse [€]	Archiviazione e dineghi [n.]	Archiviazione e dineghi [€]	Pratiche in attesa di ammissione [n.]	Pratiche in attesa di ammissione [€]
SP 3	303	€ 126.246.895	128	€ 48.811.726	100	€ 8.638.268	75	€ 66.744.546
SP 5	723	€ 288.352.279	241	€ 158.586.042	217	€ 11.951.485	265	€ 95.110.932
SP 7	255	€ 237.362.356	139	€ 114.663.875	39	€ 28.674.483	77	€ 85.745.228
SP 8	836	€ 859.349.455	479	€ 447.549.743	155	€ 101.844.906	202	€ 235.553.340
SP 9	436	€ 238.309.940	215	€ 149.862.493	31	€ 9.259.027	190	€ 66.482.065
USRC	811	€ 689.508.254	103	€ 103.950.342	34	€ 29.215.322	670	€ 537.410.678
	-	-	-	-	-	-	-	-
SP chiusi dal 10/2019								
SP 2	452	€ 165.192.088	192	€ 89.624.850	260	€ 61.466.778	0	€ -
SP 4	138	€ 103.113.215	117	€ 84.659.166	21	€ 4.363.902	0	€ -
SP 6	107	€ 137.913.538	101	€ 110.527.057	6	€ 11.064.142	0	€ -
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOT</b>	<b>4061</b>	<b>€ 2.845.348.020</b>	<b>1715</b>	<b>€ 1.308.235.294</b>	<b>863</b>	<b>€ 266.478.314</b>	<b>1479</b>	<b>€ 1.087.046.788</b>
								dati al 15/12/2020

Ai fini di una più completa valutazione delle pratiche in attesa di ammissione, si riporta di seguito il dettaglio in termini di:


- Pratiche da istruire;
- Pratiche in istruttoria presso gli SP/USRC;
- Pratiche in integrazione presso i tecnici.

	Da istruire [n.]	Da istruire [€]	In istruttoria [n.]	In istruttoria [€]	In integrazione presso i tecnici [n.]	In integrazione presso tecnici [€]
SP 3	8	€ 5.117.737	20	€ 12.692.047	47	€ 48.934.762
SP 5	85	€ 30.973.726	101	€ 43.296.562	79	€ 20.840.644
SP 7	1	€ 453.402	16	€ 20.144.977	60	€ 65.146.848
SP 8	125	€ 132.926.206	7	€ 10.700.520	70	€ 91.926.614
SP 9	13	€ 10.660.398	62	€ 3.311.840	115	€ 52.509.827
USRC	142	€ 104.400.343	97	€ 64.939.150	431	€ 368.071.185
<b>TOT</b>	<b>374</b>	<b>€ 284.531.813</b>	<b>303</b>	<b>€ 155.085.096</b>	<b>802</b>	<b>€ 647.429.879</b>

Lo stato dei procedimenti istruttori per le istanze relative alla ricostruzione privata a fine anno giugno 2020 è raffrontato a quello di fine 2018 e 2019 nella figura seguente.

	Presentate		Ammesse		Archiviazione e dineghi		Da istruire		Di cui già avviata l'istruttoria		In integrazione	
	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]	[n.]	[€]
2018	3434	€ 2.307.704.156	1398	€ 980.105.223	755	€ 216.527.969	792	€ 683.733.627	251	€ 282.185.841	460	€ 299.180.104
2019	3772	€ 2.670.535.046	1544	€ 1.162.677.569	811	€ 233.123.981	957	€ 781.117.987	265	€ 183.888.209	489	€ 323.929.347
2020	4061	€ 2.845.348.020	1715	€ 1.308.235.294	863	€ 266.478.314	677	€ 439.616.909	303	€ 155.085.096	802	€ 647.429.879

Delle 957 istanze da istruire a fine 2019, 550 sono state assegnate nel corso del 2020, per un importo di 350 Mln€. Al fine di ridurre le pesanti giacenze riscontrate a inizio 2019, sono stati anche reclutati consulenti esperti nella istruttoria delle pratiche che hanno acquisito una parte sostanziale delle nuove pratiche assegnate, ma con dipendenti USRC nel ruolo di responsabili del procedimento.

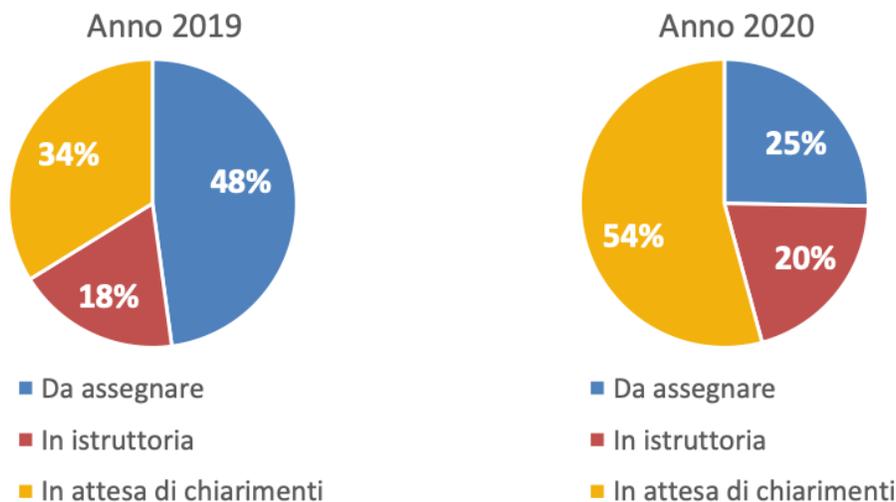

Per la RICOSTRUZIONE PRIVATA si riporta anche il dettaglio della chiusura dei procedimenti 2020 per singolo Responsabile del procedimento:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PRATICHE AMMESSE		PRATICHE CHIUSE (1)	
	NUMERO	IMPORTO (€)	NUMERO	IMPORTO (€)
CRATERE				
ADALBERTO SACCHINI	9	€ 6.026.054,91	2	€ 657.655,50
ANNA AMICOSANTE	16	€ 11.729.534,13	6	€ 4.849.513,32
CARLA TAURINO	13	€ 8.565.960,09	5	€ 6.750.813,93
CARLO CAPRI	7	€ 4.537.260,74	5	€ 1.647.031,08
CARMEN BRUNETTI	11	€ 15.380.343,02	3	€ 3.052.704,92
EMANUELA FERRINI	5	€ 4.799.029,56	2	€ 239.566,46
ENRICO BIANCHI	59	€ 22.048.653,70	14	€ 224.879,84
FRANCESCA PROSPERINI	1	€ 1.546.923,93	0	€ -
FRANCESCO MATTUCCI	7	€ 8.135.262,77	0	€ -
GIORGIO PIPPONZI	12	€ 9.876.559,67	1	€ 460.495,26
IVAN DI POMPEO	8	€ 5.247.203,68	0	€ -
LUCIANO ROSSI	31	€ 65.677.273,37	1	€ 1.283.617,96
MAURIZIO CIONI	11	€ 5.366.818,25	8	€ 2.269.235,71
STEFANO COLABIANCHI	2	€ 1.404.395,11	2	€ 1.685.546,44

(1) Procedimenti chiusi con archiviazione o diniego

*Chiusura dei procedimenti 2020 per singolo responsabile del procedimento*



### 3.2.1 MODELLO INTEGRATO DI CRATERE

Per il combinato disposto dell'art. 4 comma 10 e 12 del DPCM Abruzzo del 4 febbraio 2013, il settore Ricostruzione Privata dell'USRC ha sviluppato tra giugno 2013 e febbraio 2014, anche attraverso uno studio di fattibilità con l'**Università Federico II e Cineas**, apposita scheda parametrica (**Modello Integrato per i Comuni del Cratere**) relativa alla procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei Centri Storici dei 56 Comuni del Cratere. Il modello, perseguendo lo scopo di semplificare la procedura di emissione del contributo ha previsto, tra l'altro, una particolare intesa con la **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo, Soprintendenza ed Ordini professionali** al fine di individuare specifiche maggiorazioni tabellari per la presenza di elementi di particolare valenza architettonica e complessità strutturale che consentono un incremento al contributo fino ad un massimo del 60% per gli edifici ordinari e fino ad un massimo del 100% per gli edifici vincolati. Contestualmente alla predisposizione del modello, il settore Ricostruzione Privata ha inteso:

- predisporre un **sistema accessibile attraverso interfaccia web** che consenta al progettista incaricato di determinare univocamente e in modo standard il contributo concedibile per i lavori. Tale sistema permette ad oggi di acquisire la maggior parte delle informazioni sullo stato di consistenza dell'edificio danneggiato, in una **banca dati unica ai fini del monitoraggio** fisico ed economico della ricostruzione nei centri storici;
- predisporre una manualistica tecnica esaustiva di ogni fattispecie riscontrabile.

Con la contestuale pubblicazione del Decreto n1/USRC contenente le disposizioni in materia di scheda parametrica e la messa online dell'interfaccia sul sito [mic.usrc.it](http://mic.usrc.it), completo della manualistica, il c.d. "Allegato tecnico", e dei video tutorial, il **MIC** ha ricevuto un pieno riconoscimento da parte del territorio coinvolto nella ricostruzione. Non sono state infatti riscontrate criticità del sistema online, non è stato necessario predisporre FAQ o decreti di correzione e il personale addetto è stato dedicato al miglioramento della piattaforma.

All'indirizzo:


<http://www.usrc.it/home/news/912-16-19-settembre-l-usrc-partecipa-al-xviii-convegno-dell-anidis>

e' possibile scaricare un documento di sintesi che riporta l'esito dei primi studi fatti sul MIC da Enti di ricerca quali CNR, ReLUIS, oltre che del DPC, in termini di analisi del danno e costi di ricostruzione nei comuni del Cratere colpiti dal sisma di L'Aquila 2009. Il documento contiene anche un primo confronto con i costi relativi alla ricostruzione effettuata attraverso le c.d. OPCM nella prima fase dell'emergenza.


Dal punto di vista delle richieste di contributo parametriche, si rilevano **2.009 istanze** consegnate agli Sportelli Decentrati e all'USRC per una richiesta totale di contributo di circa **2.354 M€**. Di queste ad oggi sono state **ammesse 939 MIC** per un importo di **1.126 M€**, con un tempo medio di ammissione al contributo pari a 255 gg. Alle istanze ammesse corrispondono 731 cantieri MIC avviati e 307 cantieri con lavori già terminati a cui corrisponde il ripristino della agibilità.

Schede MIC Presentate [numero]	Schede MIC Presentate [importo]	Schede MIC Ammesse [numero]	Schede MIC Ammesse [importo]	Cantieri MIC	Cantieri MIC chiusi
2.009	2.354 Mln €	939	1.126 Mln €	731	327

Nell'anno appena concluso, le schede MIC ammesse sono state 139 per un totale di 167 milioni di €. Si riporta di seguito l'andamento delle approvazioni del contributo alla ricostruzione privata attraverso la Scheda MIC nell'anno 2020 e dall'aprile 2014, data di introduzione del modello.

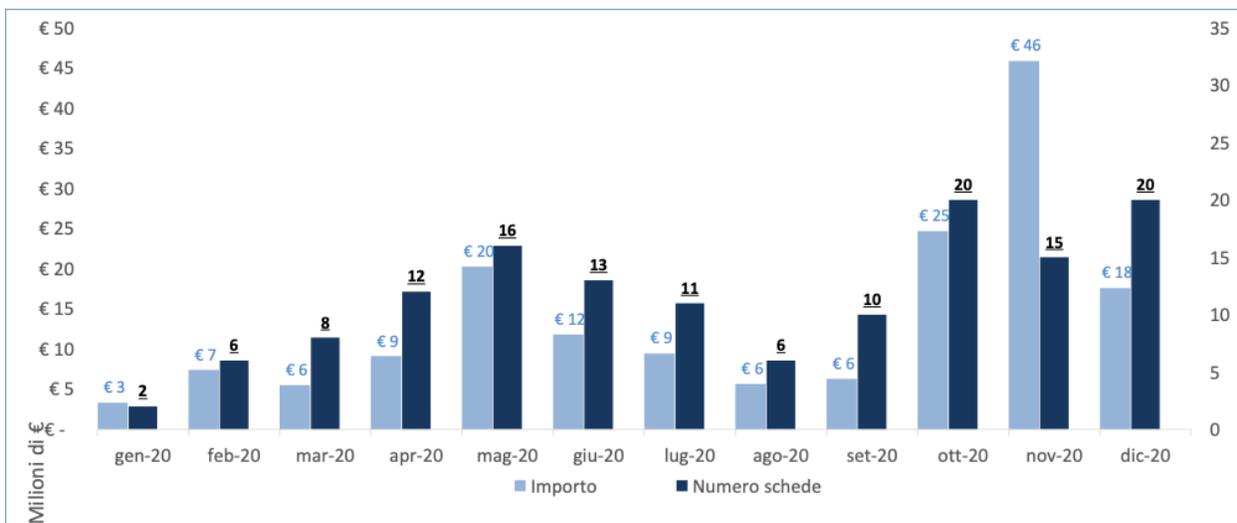

Numero e importi dei contributi ammessi mensilmente con il metodo parametrico (ultimo anno)

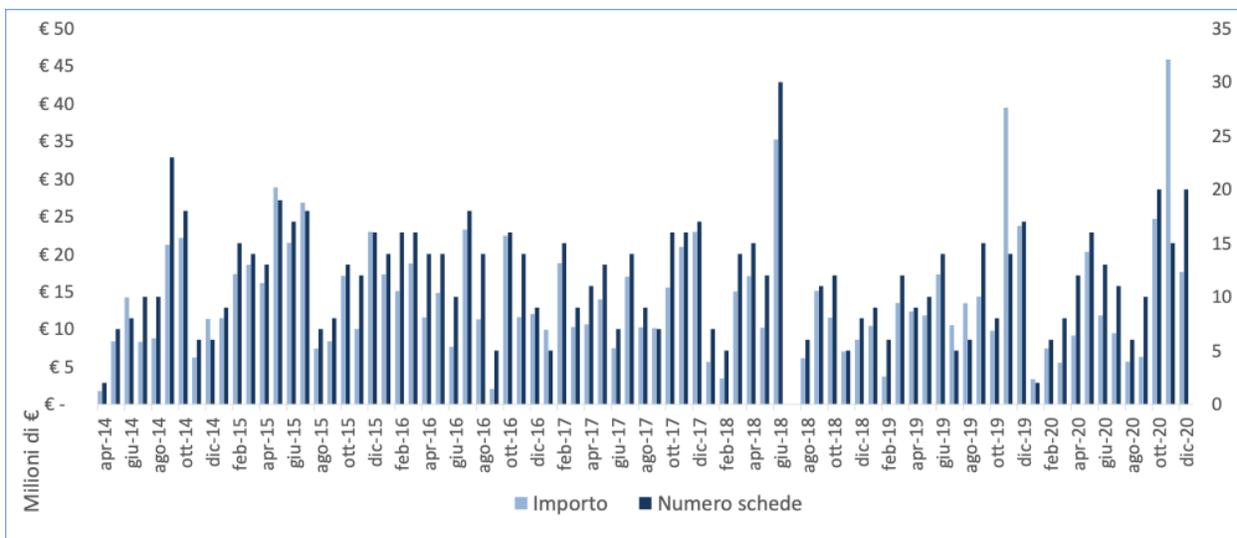

Numero e importi dei contributi ammessi mensilmente con il metodo parametrico (da aprile 2014)

### 3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

L'attività istruttoria per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori è determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese, ai professionisti e ai presidenti di consorzio coinvolti nella ricostruzione unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.

Con la **Circolare USRC n. 12 del 31 luglio 2019 e n. 13 del 01 agosto 2019** sono state predisposte specifiche procedure di snellimento dell'iter di liquidazione dei SAL. Ai sensi di quanto disposto il Comune eroga il SAL parziale previa verifica di completezza della documentazione e istruttoria semplificata da parte dello Sportello decentrato USRC (prima il 30% dei SAL intermedi era estratto a sorte e sottoposto a controllo analitico) e solo il 30% dei SAL finali (il 100% prima della Circolare 12/19) viene sottoposto a controllo analitico mediante estrazione a campione. Il controllo a campione avviene tramite sorteggio effettuato dall'USRC sul 30% dei SAL finali presentati presso tutti gli Sportelli Decentrati e l'USRC medesimo, nell'intervallo temporale intercorrente tra due sorteggi successivi.

Il sorteggio è effettuato, presso la sede dell'USRC, mediante query sul database informatico dell'USRC che contiene i dati relativi alle pratiche in istruttoria presso gli Sportelli Decentrati.

All'esito di ogni sorteggio l'USRC provvede a pubblicare l'elenco delle pratiche estratte e delle non estratte.

Il quadro di avanzamento delle pratiche Sisma 2009 all'interno degli Sportelli e dell'USRC è suddiviso in:

- SAL Presentati
- SAL con NULLA OSTA
- SAL Archiviati
- SAL in attesa di nulla osta.

Di seguito lo stato di avanzamento dei SAL al **15/12/2020**:

	Richieste Presentate [n.]	Richieste Presentate [€]	Nulla Osta [n.]	Nulla Osta [€]	Archivate [n.]	Archivate [€]	In attesa di nulla osta [n.]	In attesa di nulla osta [€]
SP 3	232	€ 21.551.878	208	€ 17.226.402	4	€ 143.513	20	€ 2.117.582
SP 5	759	€ 130.662.560	709	€ 119.990.705	16	€ 1.049.245	34	€ 6.843.659
SP 7	404	€ 66.583.223	383	€ 57.592.023	6	€ 2.561.187	15	€ 3.507.126
SP 8	1445	€ 282.453.553	1291	€ 241.952.241	14	€ 1.068.645	140	€ 25.080.509
SP 9	612	€ 92.282.958	551	€ 80.254.099	10	€ 645.859	51	€ 8.784.409
USRC	299	€ 58.523.000	189	€ 35.870.426	6	€ 502.762	104	€ 20.565.742
	-	-	-	-	-	-	-	-
SP chiusi dal 10/2019								
SP 2	401	€ 55.154.803	382	€ 50.446.685	19	€ 1.360.566	0	€ -
SP 4	279	€ 37.908.398	278	€ 37.538.332	1	€ 169.947	0	€ -
SP 6	348	€ 70.943.322	335	€ 73.620.790	13	€ 2.376.960	0	€ -
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOT</b>	<b>4779</b>	<b>€ 816.063.695</b>	<b>4326</b>	<b>€ 714.491.703</b>	<b>89</b>	<b>€ 9.878.684</b>	<b>364</b>	<b>€ 66.899.027</b>
								dati al 15/12/2020

Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta, si riporta di seguito il dettaglio di:

- SAL in istruttoria presso gli uffici;
- SAL in integrazione presso i tecnici.

	In istruttoria [n.]	In istruttoria [€]	In integrazione presso i tecnici [n.]	In integrazione presso tecnici [€]
SP 3	9	€ 1.226.990	11	€ 890.593
SP 5	21	€ 4.999.645	13	€ 1.844.014
SP 7	6	€ 613.030	9	€ 2.894.096
SP 8	100	€ 18.021.721	40	€ 7.058.789
SP 9	32	€ 4.457.741	19	€ 4.326.668
USRC	62	€ 15.114.140	42	€ 5.451.602
TOT	<b>230</b>	<b>€ 44.433.266</b>	<b>134</b>	<b>€ 22.465.762</b>

I dati illustrati sono riportati nella pagina web raggiungibile all'indirizzo:


<http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/coordinamento-sportelli>

A causa dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19, l'USRC ha ritenuto opportuno indirizzare l'acquisizione delle richieste di erogazione degli Stati avanzamento lavori attraverso una piattaforma telematica già in uso dall'utenza per la trasmissione dei contratti. La conoscenza dell'ambiente da parte degli utilizzatori (presidenti di consorzio e professionisti) ha permesso di mantenere con continuità la presentazione e della documentazione digitale e il conseguente processo di ricostruzione senza necessità di presentarsi in presenza presso lo sportello di front-office. Dal giorno 01/04/2020 al **15/12/2020** delle 451 richieste di erogazione SAL il 70% è stato presentato mediante l'utilizzo della piattaforma di cui sopra. Al secondo semestre del 2020 l'avanzamento della ricostruzione privata nei comuni del cratere in termini di cantieri e ripristino agibilità degli immobili privati è individuata dai seguenti valori:

Cantieri	
Totali Chiusi	<b>2.730</b>
Totali Attivi	<b>638</b>
Di cui	
In Centro Storico e PdR	<b>442<sup>(1)</sup></b>
Fuori Centro Storico	<b>196</b>
<b>(1) 412 riferibili alla procedura parametrica MIC</b>	

Immobili Tornati Agibili		
<b>7.415<sup>(2)</sup></b>		
<b>(741)</b>		
Di cui		
Prime Ab.	Seconde Ab.	Altri Usi
<b>2.947</b>	<b>3.540</b>	<b>928</b>
<b>(2) escludendo i 9.689 interventi realizzati su abitazioni con esito di agibilità A. Tra parentesi il dato relativo al solo 2020, quota parte del dato superiore.</b>		

### 3.4 ISTRUTTORIA RICHIESTE DI CONTRIBUTO E SAL IN SMART WORKING



A seguito dell'inizio dell'emergenza epidemologica legata alla diffusione del virus COVID-19, l'USRC ha proceduto alla predisposizione e approvazione del "Regolamento per l'attivazione straordinaria dello smart working a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19". A far data dal 11/3/2020 si è dato quindi avvio alla modalità di lavoro in *smart working* in numero di iniziali 71 su un totale di 97 unità di personale per arrivare a 92 unità al 30/06/2020.

I grafici seguenti mostrano l'andamento annuale dell'attività di istruttoria con riferimento agli indici di:

- Ammissioni a contributo pratiche e nulla osta SAL;
- Avvii del procedimento effettuati;
- Numero di richieste di integrazioni documentali effettuate dall'USRC/SP e consegne documentali effettuate dal richiedente.





Il trend delle ammissioni a contributo nel periodo marzo-dicembre 2020 è paragonabile se


non superiore a quello dello stesso periodo nell'anno 2019. Il numero di provvedimenti emessi nel periodo marzo-giugno 2020 è superiore a quello relativo allo stesso periodo nell'anno 2019 (sebbene tale indicatore sia dipendente da un numero ragguardevole di pratiche di modesta entità del comune di Lucoli ammesse nel periodo marzo-giugno 2020).

Un ragguardevole lavoro è stato svolto relativamente alla presa in carico delle pratiche giacenti da più tempo come mostrato nel grafico degli avvii del procedimento. L'attività relativa a tale procedimento è raddoppiata rispetto il precedente.


La tendenza di Nulla osta all'erogazione delle richieste SAL nel periodo marzo-giugno 2020 è nettamente superiore a quello dello stesso periodo dell'anno 2019. Ciò anche in ragione della possibilità offerta dalla normativa speciale per i cantieri in corso di contabilizzare tutto quanto eseguito nel periodo precedente al lockdown e presentarlo, senza necessità di raggiungere le soglie minime ordinarie prefissate. A seguire la esecuzione delle lavorazioni in cantiere appare più rallentata alla luce di un numero minore di SAL presentati. L'andamento delle richieste di chiarimento da parte dell'USRC/SP non risente del lavoro in modalità smart-working come documentato dai grafici relativi all'andamento delle richieste di integrazione.

## Richieste di contributo

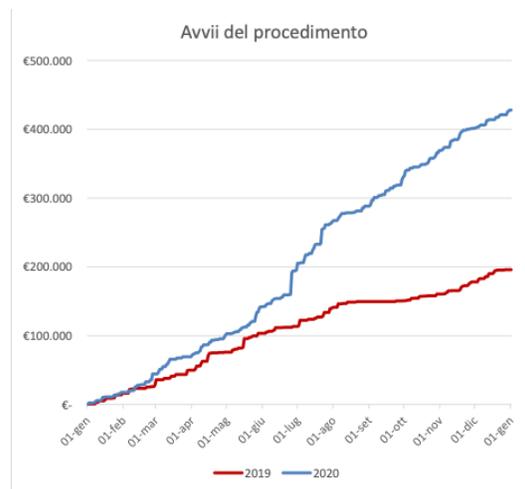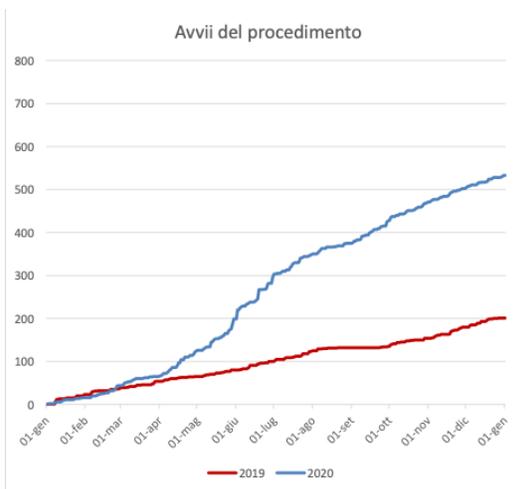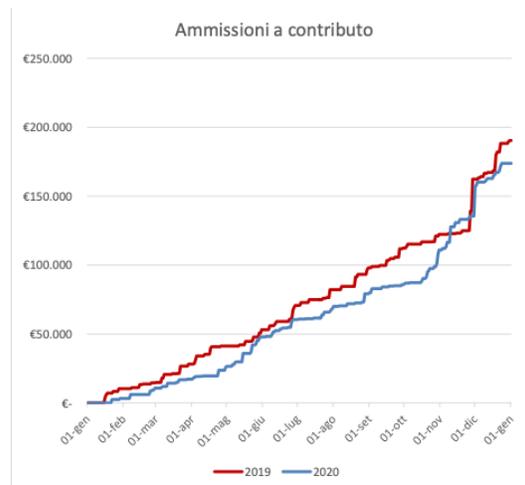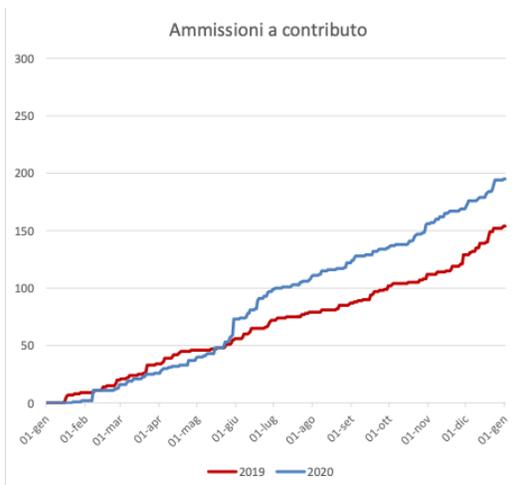




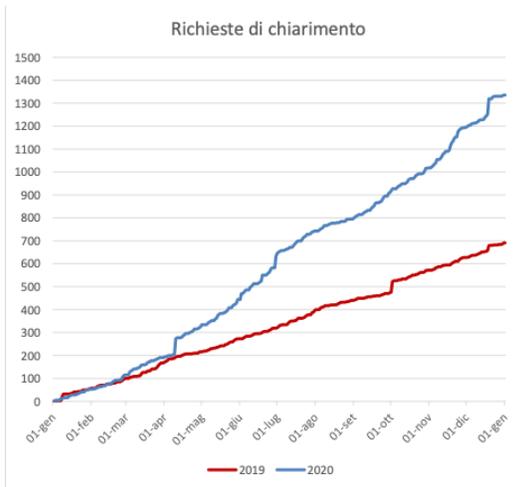


Numero

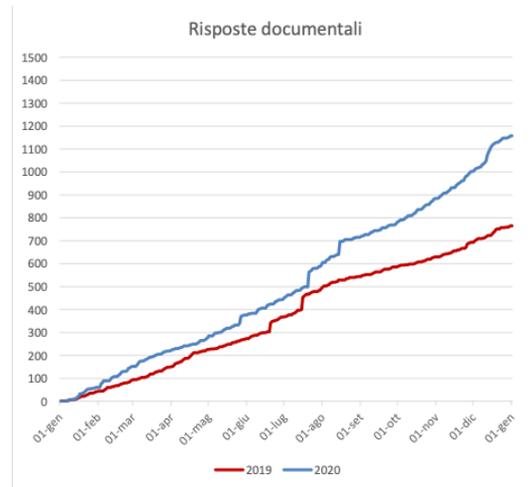

Numero

## Richieste di erogazione SAL

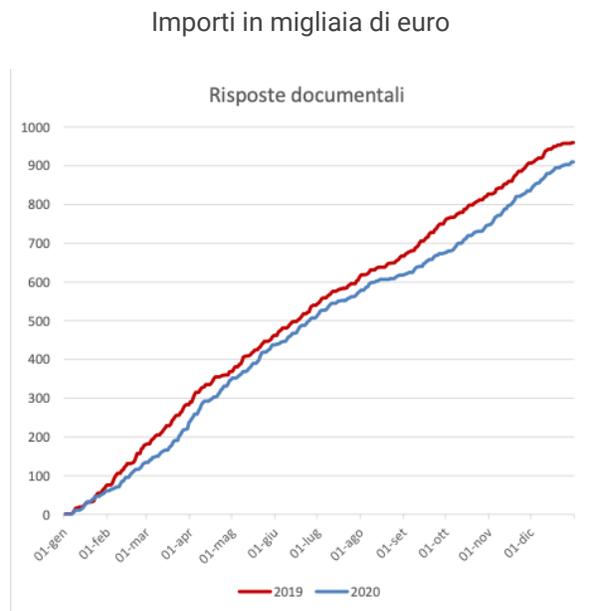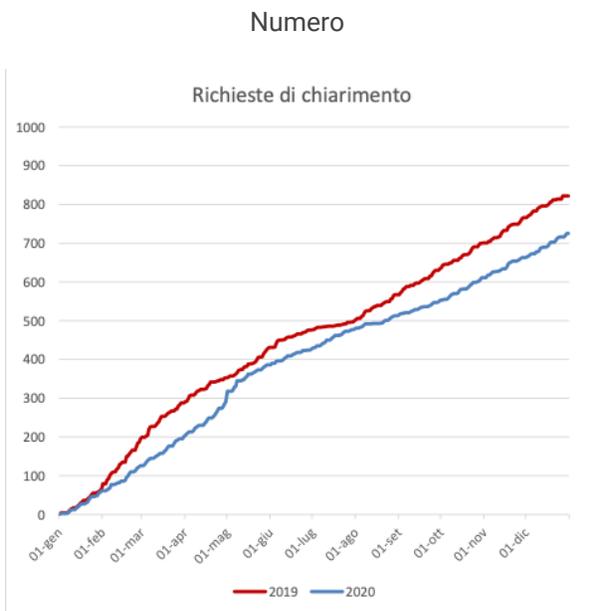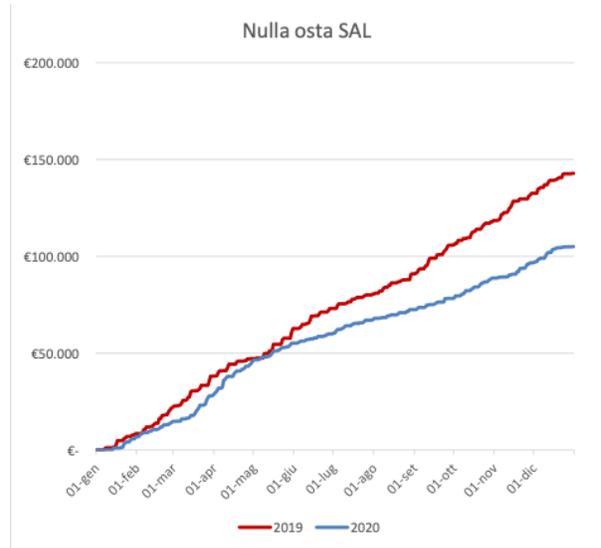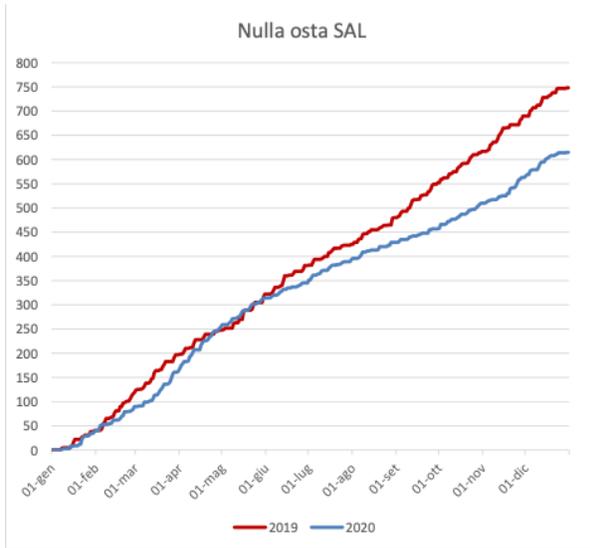

Numero

Numero



### 3.5 GESTIONE FONDI



L'USRC esegue il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata ex. art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, ed effettua un controllo costante dell'andamento della ricostruzione, consentendo di definire i fabbisogni economici futuri e di programmare quindi lo stanziamento delle risorse da parte degli organi centrali.

Attraverso il monitoraggio sono definiti i fabbisogni finanziari per la ricostruzione privata

dei 56 comuni del cratere, con la precipua finalità di garantire una ricostruzione senza soluzione di continuità attraverso la corretta allocazione delle risorse disponibili, coprendo l'intero territorio del cratere in maniera omogenea ed efficiente.

Il monitoraggio, realizzato interamente on-line con l'aggiornamento della Banca Dati dell'Emergenza (BDE), è inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato sul sito [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

La concessione di contributi, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al **31/10/2020**, segnala un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di **1.547 Mln€** (1.753 Mln€ includendo anche il canale di finanziamento agevolato).


Da gennaio 2015 il Settore ricostruzione privata dell'USRC cura l'attività di assegnazione e

trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni del Cratere. Nell'intento di assicurare una più efficace allocazione delle risorse, le Delibere CIPE 23/2014 e 22/2015 hanno infatti attribuito all'USRC il compito di assegnare le risorse per la ricostruzione privata ai Comuni del Cratere che abbiano integralmente impegnato le risorse precedentemente attribuite a copertura delle nuove istruttorie positivamente concluse e prive di copertura. L'USRC ha quindi adottato una procedura di assegnazione delle risorse che

prevede l'accertamento dei requisiti sia di carattere economico, per verificare l'utilizzo delle assegnazioni pregresse, sia di carattere tecnico, per accertare l'immediata cantierabilità dell'intervento. Il vantaggio della procedura è quello di assegnare le risorse ad interventi che troveranno immediata attuazione, garantendo un efficiente utilizzo di risorse pubbliche. Al **18/12/2020** l'USRC ha assegnato complessivamente **1.034 Mln€**, di cui trasferiti **803 Mln€**.

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
<b>A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC</b>	<b>€ 1.193.853.630,95</b>	
<b>B. Totale utilizzi USRC</b> Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni del cratere		<b>€ 1.034.078.884,71</b>
<b>C. Totale Disponibile</b> Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Cratere		<b>€ 159.774.746,24</b>

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 54 Comuni del Cratere e rappresentano circa il 60% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

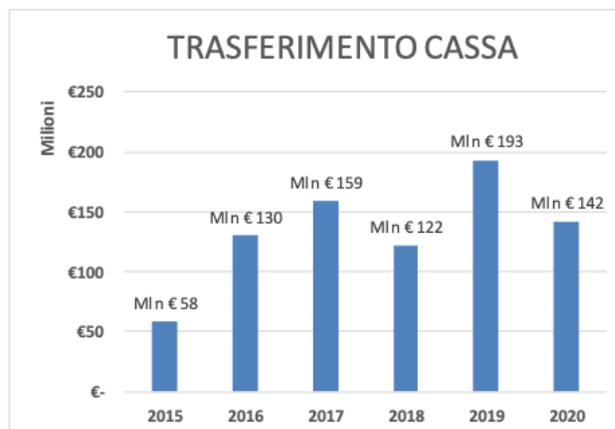

<http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/gestione-fondi-comuni-del-cratere>

Nel 2020 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 141.918.641,17** a 38 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati finanziamenti a 46 comuni per complessivi **€ 195.702.299,52**. Si riporta di seguito il dettaglio fondi ricostruzione privata cratere per singolo comune.

AO	COMUNE
2	COMUNE DI BARETE
2	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO
2	COMUNE DI CAMPOTOSTO
2	COMUNE DI CAPITIGNANO
2	COMUNE DI MONTEREALE
2	COMUNE DI PIZZOLI
2	COMUNE DI SCOPPITO
2	COMUNE DI TORNIMPARTE
3	COMUNE DI ARSITA
3	COMUNE DI CASTELLI
3	COMUNE DI COLLEDARA
3	COMUNE DI FANO ADRIANO
3	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
3	COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA
3	COMUNE DI PIETRACAMELA
3	COMUNE DI TOSSICIA
4	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
4	COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO
4	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI
5	COMUNE DI BRITTOLI
5	COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
5	COMUNE DI CAPESTRANO
5	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
5	COMUNE DI CUGNOLI
5	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA
5	COMUNE DI OFENA
5	COMUNE DI POPOLI
5	COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
6	COMUNE DI CAPORCIANO
6	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO
6	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
6	COMUNE DI NAVELLI
6	COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA
6	COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE
7	COMUNE DI BUGNARA
7	COMUNE DI CASTEL DI IERI
7	COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO
7	COMUNE DI COCULLO
7	COMUNE DI COLLARMELE
7	COMUNE DI GAGLIANO ATERNO
7	COMUNE DI GORIANO SICOLI
8	COMUNE DI ACCIANO
8	COMUNE DI BARISCIANO
8	COMUNE DI FAGNANO ALTO
8	COMUNE DI FONTECCHIO
8	COMUNE DI FOSSA
8	COMUNE DI OCRE
8	COMUNE DI POGGIO PICENZE
8	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI
8	COMUNE DI SANTEUSANIO FORCONESE
8	COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
8	COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO
9	COMUNE DI LUCOLI
9	COMUNE DI OVINDOLI
9	COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO
9	COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
<b>TOTALE 2020</b>	
<b>TOTALE 2019</b>	

ASSEGNAZIONI	
	IMPORTO (€)
2	€ 3.196.832,69
0	€ 0,00
1	€ 1.606.187,05
0	€ 0,00
5	€ 1.852.423,84
2	€ 572.862,07
3	€ 4.250.981,21
0	€ 0,00
0	€ 0,00
3	€ 1.723.545,16
0	€ 0,00
0	€ 0,00
1	€ 281.644,66
0	€ 0,00
0	€ 0,00
1	€ 145.431,44
0	€ 0,00
1	€ 584.565,79
2	€ 3.950.489,87
1	€ 178.268,85
3	€ 7.791.323,86
1	€ 66.450,59
1	€ 462.709,03
3	€ 1.105.444,90
1	€ 671.253,44
2	€ 1.533.609,76
0	€ 0,00
2	€ 1.367.883,04
2	€ 4.341.795,76
1	€ 534.296,41
1	€ 2.021.008,74
2	€ 9.153.792,68
3	€ 19.137.351,88
3	€ 9.329.165,18
1	€ 23.102,54
3	€ 6.214.161,30
2	€ 1.964.605,47
1	€ 959.628,25
0	€ 0,00
3	€ 3.967.096,91
1	€ 34.866,45
3	€ 2.147.845,32
4	€ 6.928.004,96
3	€ 5.038.453,96
2	€ 8.791.974,86
3	€ 9.108.436,00
1	€ 2.574.692,97
2	€ 4.593.030,29
6	€ 29.135.670,11
2	€ 14.534.675,27
2	€ 5.590.075,27
1	€ 941.949,96
4	€ 6.928.995,34
1	€ 512.857,36
2	€ 4.916.432,96
2	€ 4.936.426,07
<b>96</b>	<b>€ 195.702.299,52</b>
<b>83</b>	<b>€ 142.752.915,45</b>

EROGAZIONI	
	IMPORTO (€)
1	€ 1.759.552,16
0	€ 0,00
0	€ 0,00
0	€ 0,00
1	€ 2.696.709,79
2	€ 3.286.363,60
1	€ 1.570.666,22
0	€ 0,00
0	€ 0,00
0	€ 0,00
1	€ 2.036.485,96
0	€ 0,00
0	€ 0,00
1	€ 549.014,03
1	€ 3.379.235,91
1	€ 2.139.190,07
1	€ 2.184.651,32
0	€ 0,00
2	€ 5.485.479,84
1	€ 1.382.275,07
2	€ 2.175.695,55
3	€ 1.525.717,26
2	€ 1.038.284,01
1	€ 1.663.317,87
1	€ 1.220.745,59
0	€ 0,00
2	€ 4.169.562,48
1	€ 276.740,01
0	€ 0,00
1	€ 5.979.838,53
1	€ 4.574.871,87
1	€ 3.162.849,01
0	€ 0,00
1	€ 1.103.753,16
1	€ 2.056.791,44
0	€ 0,00
0	€ 0,00
0	€ 0,00
2	€ 3.755.963,44
2	€ 2.040.663,71
2	€ 9.970.136,51
1	€ 3.358.302,55
1	€ 4.412.982,00
2	€ 6.188.194,95
1	€ 1.518.291,68
1	€ 1.721.156,59
2	€ 11.117.271,19
2	€ 11.040.497,15
1	€ 3.022.670,34
2	€ 8.345.427,45
2	€ 10.753.724,84
0	€ 0,00
3	€ 5.465.287,93
1	€ 3.790.280,09
<b>55</b>	<b>€ 141.918.641,17</b>
<b>70</b>	<b>€ 187.131.919,49</b>

AREA OMOGENEA	ASSEGNAZIONI 2019		ASSEGNAZIONI 2020	
	N.	IMPORTO (€)	N.	IMPORTO (€)
AREA 2	8	€ 10.874.276,27	13	€ 11.479.286,86
AREA 3	4	€ 2.843.099,56	5	€ 2.150.621,26
AREA 4	6	€ 11.623.654,15	3	€ 4.535.055,66
AREA 5	11	€ 11.445.315,44	14	€ 13.176.943,47
AREA 6	9	€ 20.141.981,42	12	€ 44.517.410,65
AREA 7	10	€ 8.052.450,61	11	€ 13.163.460,92
AREA 8	27	€ 54.837.748,90	29	€ 89.384.808,97
AREA 9	8	€ 22.934.389,10	9	€ 17.294.711,73
<b>TOTALE</b>	<b>83</b>	<b>€ 142.752.915,45</b>	<b>96</b>	<b>€ 195.702.299,52</b>

AREA OMOGENEA	EROGAZIONI 2019		EROGAZIONI 2020	
	N.	IMPORTO (€)	N.	IMPORTO (€)
AREA 2	7	€ 14.554.677,57	5	€ 9.313.291,77
AREA 3	3	€ 4.405.877,38	2	€ 2.585.499,99
AREA 4	5	€ 12.370.360,60	3	€ 7.703.077,30
AREA 5	16	€ 24.545.279,40	12	€ 14.491.515,19
AREA 6	8	€ 19.866.929,79	6	€ 18.163.861,90
AREA 7	7	€ 10.282.813,05	4	€ 6.916.508,04
AREA 8	20	€ 85.110.762,77	17	€ 62.735.594,12
AREA 9	4	€ 15.995.218,93	6	€ 20.009.292,86
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>€ 187.131.919,49</b>	<b>55</b>	<b>€ 141.918.641,17</b>

Nel 2020 l'USRC ha assegnato per competenza **195 Mln€**, **53 Mln€** in più rispetto al 2019, mentre, a causa dell'emergenza covid-19 e la chiusura parziale di cantieri, nel 2020 l'USRC ha trasferito **142 Mln€**, **45 Mln€** in meno rispetto al 2019.

Nel 2020 il 45% del totale delle assegnazioni è stato utilizzato dai comuni afferenti all'area omogenea 8, sempre nello stesso anno il 44% dei trasferimenti totali è stato trasferito ai comuni afferenti all'area omogenea 8.

### 3.6 TRASPARENZA



L'attività di gestione dati svolta dal Settore Ricostruzione privata dell'USRC è volta prevalentemente alla standardizzazione delle basi dati utilizzate presso gli Sportelli Decentrati (ex UTR) con la finalità di uniformare il procedimento amministrativo di istruttoria delle richieste di contributo e degli stati avanzamento lavori.

E' stato predisposto dall'USRC, ed è completamente in uso, uno strumento unico per gli Sportelli Decentrati, a costo di sviluppo nullo, che consente la conoscenza temporale, storica e interrogabile in tempo reale della produttività degli Sportelli Decentrati, da intendersi come tutte quelle azioni aggiuntive rispetto alla ammissione a contributo. Lo strumento predisposto, peraltro, ha dato da subito indicazioni su alcune criticità sui procedimenti amministrativi e di gestione dei carichi lavorativi permettendo azioni volte ad aumentare l'efficacia del processo di ricostruzione. La potenzialità del database unico ha permesso altresì la **pubblicazione online accessibile senza restrizioni** sul sito [www.usrc.it](http://www.usrc.it) e su

quello [mic.usrc.it](http://mic.usrc.it) dello **stato delle istruttorie delle richieste di contributo e degli stati avanzamento lavori**.

La pagina è raggiungibile all'indirizzo:

<http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-della-pratica>

L'attività di monitoraggio e gestione dati si completa attraverso l'utilizzo di una tecnologia GIS (Sistema Informativo Geografico), che consente di geolocalizzare su mappa i dati del monitoraggio della ricostruzione privata nei 56 Comuni del cratere. L'attività svolta da uno specifico gruppo di lavoro del settore Ricostruzione Privata è identificabile nella raccolta presso i singoli comuni e gli Sportelli Decentrati (ex UTR) di dati cartacei relativi ai contributi concessi ed agli interventi effettuati ed in corso di realizzazione con conseguente trasposizione degli stessi su cartografia georeferenziata. I dati raccolti e implementati in un database GIS vengono pubblicati sul web attraverso delle mappe navigabili su una piattaforma Web-Gis, accessibile sul sito dell'USRC. Questa attività ha la **finalità** di rendere disponibili le informazioni relative alla ricostruzione privata a tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione, e più in generale, a tutti i soggetti interessati, attraverso il web e sfruttando le potenzialità della geolocalizzazione dei dati tramite GIS, al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione ai processi della ricostruzione.

### 3.7 CONTRATTI

Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione operano una attività di acquisizione dei contratti tra privati stipulati ai sensi dell'art. 67-quater comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ai fini della successiva trasmissione degli stessi ai Comuni interessati. Il comma 1 dell'art. 11 del D.L. 78/2015 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125 pone in capo ai soggetti "committenti" l'onere di trasmettere agli Uffici Speciali per la Ricostruzione copia della documentazione inerente i detti contratti tra privati, garantendone la regolarità formale.

**Al 31 Dicembre 2020 la situazione dei "contratti" è la seguente:**

Indicatore	Numero	Importo
Utenti Registrati	1.746	-
Pratiche Interessate	2.142	-
Contratti Aperti	7.624	2.129.146.908,85 €
di cui Protocollati	7.121	2.007.704.122,37 €
di cui da Protocollare	503	121.442.786,49 €
PEC Inviata ai Comuni	4.353	-
Allegati trasmessi	30.658	-
Comuni Interessati	115	-

### 3.8 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Con determina del Titolare n. 56 del 31.01.2020, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere si è dotato del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020-2022. Il Piano, adottato in esito ad una procedura pubblica che ha consentito forme di partecipazione degli stakeholders interessati, sposa un'interpretazione ampia del concetto di fenomeno corruttivo al fine di reprimere ed ancor prima prevenire ogni fenomeno di *maladministration* idoneo anche solo potenzialmente a sviare il corretto esercizio del potere pubblico nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ufficio.


Muovendo da una disamina del contesto esterno in cui l'USRC si trova ad operare ed attraverso il rilievo delle specificità interne dell'Ufficio stesso, il PTPCT introduce un sistema di graduale applicazione di misure anti corruttive e di promozione della trasparenza in attuazione dei più recenti indirizzi operativi emanati dall'A.N.A.C e strutturati secondo principi di fattibilità, sostenibilità ed effettiva aderenza alle specificità dell'Amministrazione e con l'utilizzo di un approccio qualitativo nella mappatura dei processi e nella misurazione e trattamento del rischio come auspicato nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2019. Il PTPCT, comprensivo dei relativi allegati, è accessibile in formato aperto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'USRC al seguente link:

<http://www.usrc.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione>

## 4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE

L'USRC è competente per i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere, ovvero dei Comuni non ricadenti nel cratere sismico ma che comunque hanno riportato danni aventi nesso di causalità con il sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39. I Comuni ricadenti nella fattispecie risultano **114**, di cui 34 nella provincia dell'Aquila, 32 nella provincia di Teramo, 42 nella provincia di Pescara e 6 nella provincia di Chieti.

**Le risorse stanziare per la Ricostruzione Privata** dei Comuni Fuori Cratere ammontano a **circa 374 milioni di Euro**, assegnate negli anni dalle seguenti delibere CIPE: dalla Delibera CIPE 95/2012 risultano circa 17 milioni, seguiti dai 10 milioni della Delibera CIPE 43/2012; le assegnazioni della Delibera CIPE 135/2012, sono 55 milioni di euro per tre anni (2013 - 2015) ai quali si sommano le annualità della Delibera CIPE 50/2013 pari 5,62 milioni l'anno dal 2014 al 2019 e i 32 milioni assegnati in via definitiva con la delibera CIPE 23/2014; la Delibera CIPE 22/2015 ha disposto l'assegnazione in via definitiva in favore dei comuni "fuori cratere" di ulteriori 132 milioni; in seguito, si sono aggiunte le risorse stanziare dalla delibera CIPE 113/2015 per ulteriori 30 milioni di euro e infine con la pubblicazione della Delibera CIPE 33/2019 alle risorse a disposizione si sono aggiunti 40 milioni di euro.

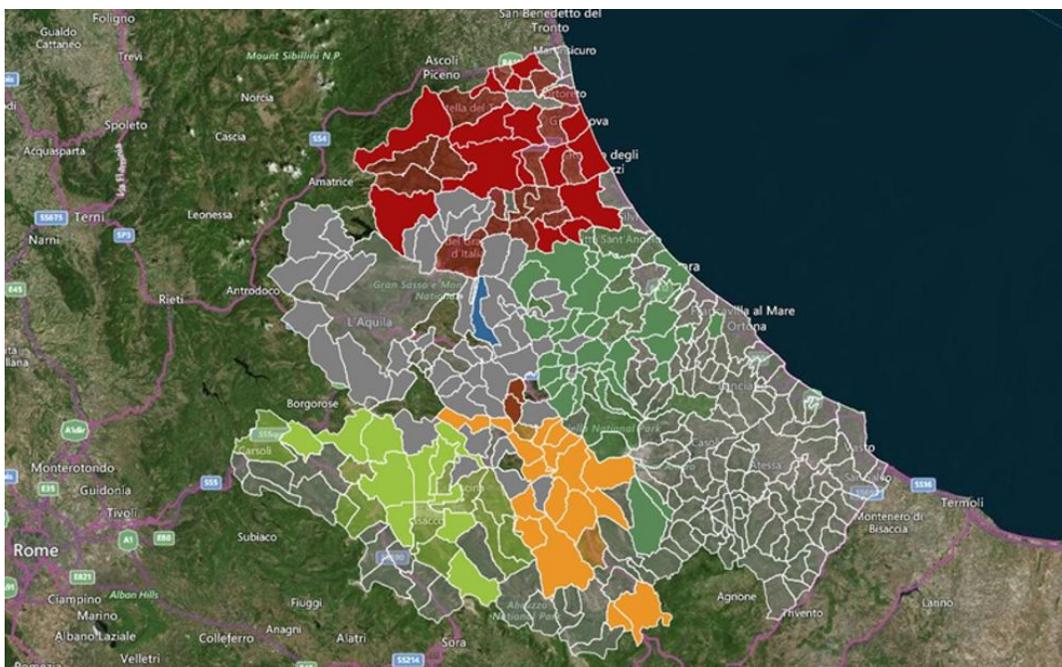

Analogamente a quanto attuato per il cratere già con la delibera CIPE 22/2015,

*“[...] le risorse sono ripartite, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, tra i singoli Comuni dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC), a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente, e a copertura degli importi riconosciuti in esito alle medesime istruttorie, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite [...]”*

I contributi ammessi per la ricostruzione privata dei comuni Fuori Cratere, dal 2009 ad oggi, ammontano a circa **456 Mln€**, di cui 84 Mln€ ammessi con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti dall'anno 2009-2012, mentre dei 374 Mln€ stanziati sul canale del contributo diretto, quelli finora ammessi a contributo dagli Uffici competenti risultano **372 Mln€**, di questi, sono stati concessi con decreto sindacale dai Comuni contribuiti per circa **343 Mln€**.

Analogamente a quanto avviene per i Comuni del Cratere, l'USRC assegna le risorse finanziarie ai singoli comuni per i soli interventi immediatamente attuabili e solo nel caso in cui i Comuni abbiano integralmente impegnato le risorse precedentemente assegnate.

Ad oggi, ai Comuni Fuori Cratere rispetto ai 374 stanziati risultano **assegnati 351 Mln€, di cui 323 Mln€ attribuiti da questo Ufficio con una nuova procedura avviata dall'anno 2015**.

Lo stato di avanzamento della ricostruzione privata fuori cratere al 31/12/2020 è sintetizzato nella seguente tabella:

AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI COMUNI FUORI CRATERE					
AO	IMPORTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE AL 31/12/2020	IMPORTO INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO AL 31/12/2020	% AMMESSO	DI CUI:	
				IMPORTI AMMESSI CON CONTRIBUTO USRC	% AMMESSO CON CONTRIBUTO USRC
AO 3	€ 227.724.015,90	€ 168.995.303,12	74%	€ 107.688.491,73	63,72%
AO 4	€ 26.912.259,29	€ 14.172.894,98	53%	€ 13.396.406,71	94,52%
AO 5	€ 162.575.100,35	€ 66.250.230,23	41%	€ 45.002.416,34	67,93%
AO 6	€ 34.019.849,20	€ 15.100.627,63	44%	€ 13.118.623,80	86,87%
AO 7	€ 296.755.976,73	€ 175.284.202,16	59%	€ 134.121.322,08	76,52%
AO 9	€ 43.218.746,30	€ 15.953.412,77	37%	€ 10.266.347,48	64,35%
	€ 791.205.947,77	€ 455.756.670,89	58%	€ 323.593.608,14	71,00%

Nella pagina che segue, invece, si riporta il dettaglio per singolo comune:

AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI COMUNI FUORI CRATERE

AO	COMUNE	IMPORTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE AL 31/12/2020	IMPORTO INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO	% AMMESSO	di cui:	
					IMPORTI AMMESSI CON CONTRIBUTO USRC	% AMMESSO CON CONTRIBUTO USRC
AO3	Ancarano	€ 1.703.256,00	€ 744.691,29	44%	€ 193.755,81	26%
AO3	Atri	€ 766.099,29	€ 550.276,70	72%	€ 190.164,82	35%
AO3	Basciano	€ 5.844.008,77	€ 5.044.941,53	86%	€ 3.085.430,61	61%
AO3	Bellante	€ 3.281.769,64	€ 1.460.612,26	45%	€ 402.906,17	28%
AO3	Bisenti	€ 41.791.831,29	€ 41.135.778,51	99%	€ 27.876.144,73	67%
AO3	Campoli	€ 4.118.794,36	€ 1.698.221,62	41%	€ 1.235.874,64	73%
AO3	Canzano	€ 7.026.791,70	€ 1.643.894,36	23%	€ 657.103,48	40%
AO3	Castel Castagna	€ 9.126.502,67	€ 7.575.520,78	83%	€ 4.974.955,26	68%
AO3	Castellota	€ 1.798.716,63	€ 1.061.115,13	59%	€ 149.965,85	14%
AO3	Castiglione Messer Raimondo	€ 12.282.819,94	€ 11.297.201,22	92%	€ 6.388.340,48	57%
AO3	Castleroti	€ 1.568.943,99	€ 1.017.021,59	65%	€ 727.767,97	72%
AO3	Cellino Attanasio	€ 1.970.866,53	€ 1.002.276,13	51%	€ 278.887,73	28%
AO3	Cernigliano	€ 12.842.460,77	€ 12.041.074,71	94%	€ 8.204.022,73	68%
AO3	Civitella del Tronto	€ 5.636.503,42	€ 783.674,07	14%	€ 379.790,92	48%
AO3	Controguerra	€ 2.085.706,97	€ 190.280,39	9%	€ 358.287,48	92%
AO3	Corchiani	€ 273.812,90	€ 273.812,90	100%	€ 723.812,90	100%
AO3	Cortino	€ 4.410.594,19	€ 3.431.041,42	78%	€ 3.152.520,85	92%
AO3	Crognaneto	€ 13.802.264,48	€ 10.360.627,13	75%	€ 2.620.952,22	25%
AO3	Guiliano	€ 83685,6	€ 51094,07	61%	€ 51094,07	100%
AO3	Isola del Gran Sasso d'Italia	€ 40.771.734,14	€ 38.500.087,19	94%	€ 28.638.553,14	74%
AO3	Montefino	€ 2.478.350,45	€ 2.439.455,47	98%	€ 491.517,31	20%
AO3	Morro d'Oro	€ 108.904,98	€ 108.755,29	100%	€ -	0%
AO3	Mossano Sant'Angelo	€ 582.556,60	€ 542.517,24	93%	€ 191.617,24	35%
AO3	Montesco	€ 453.123,91	€ 209.480,79	46%	€ 197.363,93	94%
AO3	Rocca Santa Maria	€ 516.626,15	€ 331.955,32	64%	€ 92.278,09	28%
AO3	Rosato degli Abruzzi	€ 506.989,97	€ -	0%	€ -	0%
AO3	Sant'Egidio alla Vibrata	€ 746.765,29	€ 312.744,99	42%	€ 34.601,72	11%
AO3	Teramo	€ 31.444.157,68	€ 18.642.048,47	59%	€ 12.952.114,99	69%
AO3	Torano Nuovo	€ 189.641,94	€ 189.641,94	100%	€ 189.641,94	100%
AO3	Tortorella Sicura	€ 11.431.902,01	€ 4.652.154,02	41%	€ 2.961.823,56	64%
AO3	Tortoreto	€ 45.084,58	€ 10.000,00	22%	€ 10.000,00	100%
AO3	Valle Castellana	€ 7.587.397,66	€ 927.475,60	12%	€ 261.820,06	32%
<b>TOTALE AREA OMOGENEA 3</b>		<b>€ 227.724.010,3</b>	<b>€ 168.924.103,3</b>	<b>74%</b>	<b>€ 107.658.492,2</b>	<b>64%</b>
AO4	Casaco	€ 26.912.259,29	€ 14.172.895,53	53%	€ 13.396.407,95	95%
<b>TOTALE AREA OMOGENEA 4</b>		<b>€ 26.912.259,29</b>	<b>€ 14.172.895,53</b>	<b>53%</b>	<b>€ 13.396.407,95</b>	<b>95%</b>
AO5	Abbategrano	€ 671.662,33	€ 293.594,79	44%	€ 40.416,02	17%
AO5	Alanno	€ 8.250.021,20	€ 5.686.722,83	69%	€ 1.929.127,48	34%
AO5	Bolegnano	€ 1.929.941,98	€ 814.625,91	42%	€ 555.946,74	68%
AO5	Caramanico Terme	€ 253.585,88	€ 64.769,90	26%	€ 64.769,90	100%
AO5	Carpineto della Nora	€ 2.424.999,10	€ 1.184.982,46	49%	€ 362.749,29	31%
AO5	Castiglione a Casauria	€ 14.388.680,17	€ 4.313.344,84	30%	€ 3.899.803,09	90%
AO5	Castignano	€ 724.243.751,03	€ 1.084.525,49	15%	€ 990.056,64	86%
AO5	Caspegli	€ 90.031,88	€ 90.000,00	100%	€ 80.000,00	89%
AO5	Chieti	€ 6.447.687,22	€ 869.798,98	13%	€ 524.940,65	60%
AO5	Citta' Sant'Angelo	€ 473.304,46	€ 473.304,46	100%	€ 311.923,89	66%
AO5	Civitavecchia	€ 8.188.643,97	€ 5.172.082,21	63%	€ 4.379.548,43	85%
AO5	Collecara inf. Noce	€ 5.455.906,42	€ 5.449.451,90	100%	€ 5.286.289,19	97%
AO5	Corvara	€ 4.098.879,42	€ 762.642,43	19%	€ 455.522,68	60%
AO5	Ellice	€ 1.923.433,27	€ 1.795.493,09	93%	€ 1.649.441,21	92%
AO5	Fara Filiorum Petri	€ 207.822,80	€ -	0%	€ -	0%
AO5	Fatindola	€ 3.081.369,61	€ 1.572.138,85	51%	€ 664.095,13	42%
AO5	Guardagrele	€ 39.857,93	€ 19.841,00	50%	€ -	0%
AO5	Lettomanoppello	€ 1.117.899,93	€ 732.176,62	65%	€ 186.598,70	25%
AO5	Lettopiana	€ 792.999,97	€ 414.839,15	52%	€ 337.903,16	81%
AO5	Loreto Aprutino	€ 6.788.991,62	€ 2.497.108,00	37%	€ 800.646,86	32%
AO5	Manoppello	€ 8.985.127,72	€ 6.337.493,94	71%	€ 4.783.550,87	75%
AO5	Montebelluno	€ 178.791,12	€ -	0%	€ 178.791,12	100%
AO5	Montorio al Vomano	€ 23.705,00	€ 23.705,00	100%	€ -	0%
AO5	Nociano	€ 1.155.148,15	€ 288.846,24	25%	€ 252.865,14	89%
AO5	Palena	€ 385.290,11	€ -	0%	€ -	0%
AO5	Penne	€ 18.032.914,16	€ 4.332.074,28	24%	€ 1.774.867,51	41%
AO5	Pescara	€ 6.763.817,92	€ 1.944.694,62	29%	€ 1.944.694,62	100%
AO5	Pescosansonesco	€ 1.548.638,16	€ 1.173.694,66	76%	€ 1.119.691,38	82%
AO5	Pianella	€ 1.062.137,39	€ 945.862,46	89%	€ 75.958,73	8%
AO5	Picciano	€ 2.038.789,82	€ 1.675.727,69	82%	€ 1.269.573,37	76%
AO5	Pietranico	€ 3.952.161,30	€ 1.675.149,83	42%	€ 931.817,90	56%
AO5	Rovamonte	€ 162.427,48	€ 295.275,17	183%	€ -	0%
AO5	Rosignano	€ 1.026.970,65	€ 1.006.992,82	98%	€ 261.527,91	26%
AO5	San Giovanni Teatino	€ 97.798,13	€ 78.230,50	80%	€ 28.371,11	36%
AO5	San Martino sulla Marrucina	€ 80.000,00	€ 50.172,49	63%	€ 54.640,37	109%
AO5	San Valentino in Abruzzo Citeriore	€ 952.505,87	€ 643.608,90	68%	€ 467.432,37	73%
AO5	Sant'Eufemia a Maiella	€ 1.065.461,07	€ 796.010,92	75%	€ 743.442,81	93%
AO5	Scafa	€ 1.748.127,60	€ 973.526,30	56%	€ 492.760,02	51%
AO5	Tocco da Casauria	€ 34.224.070,45	€ 8.187.902,90	24%	€ 6.763.390,39	81%
AO5	Tollo	€ 114.016.076,97	€ 34.074,23	0%	€ 53.974,02	100%
AO5	Turvalignani	€ 1.519.832,89	€ 489.949,46	32%	€ 472.052,64	96%
AO5	Vicoli	€ 2.100.483,56	€ 401.340,47	19%	€ 215.864,89	54%
AO5	Villa Celiera	€ 1.358.873,02	€ 1.182.724,05	87%	€ 646.307,09	55%
AO5	Villamagna	€ 114.313,53	€ -	0%	€ -	0%
<b>TOTALE AREA OMOGENEA 5</b>		<b>€ 162.575.100,00</b>	<b>€ 66.250.230,00</b>	<b>41%</b>	<b>€ 45.002.416,00</b>	<b>68%</b>
AO6	Collepietro	€ 10.570.389,76	€ 3.143.432,86	30%	€ 2.232.441,15	71%
AO6	San Benedetto in Perillis	€ 23.446.459,64	€ 11.957.194,77	51%	€ 39.886.182,65	91%
<b>TOTALE AREA OMOGENEA 6</b>		<b>€ 34.016.849,40</b>	<b>€ 15.100.627,63</b>	<b>44%</b>	<b>€ 13.118.624,80</b>	<b>87%</b>
AO7	Amatrice degli Abruzzi	€ 19.011.900,81	€ 18.175.230,55	96%	€ 12.027.133,12	68%
AO7	Casiano	€ 3.932.726,42	€ 2.287.340,54	58%	€ 817.341,12	36%
AO7	Castel di Sangro	€ 125.583,42	€ -	0%	€ -	0%
AO7	Corfinio	€ 9.947.814,90	€ 6.426.647,41	65%	€ 6.122.198,49	95%
AO7	Introdacqua	€ 4.855.640,69	€ 2.836.664,76	58%	€ 2.593.739,08	91%
AO7	Molina Aterno	€ 3.634.005,94	€ 1.871.704,54	52%	€ 1.465.645,05	78%
AO7	Paoentro	€ 9.983.515,16	€ 1.912.488,44	19%	€ 1.416.775,48	74%
AO7	Pettorano sul Gizio	€ 2.418.641,98	€ 2.270.562,62	94%	€ 836.370,52	37%
AO7	Pretola Peligna	€ 45.128.578,51	€ 17.986.956,89	40%	€ 17.775.674,98	99%
AO7	Prezza	€ 7.533.574,85	€ 3.017.922,25	40%	€ 1.279.739,70	42%
AO7	Raiano	€ 61.800.892,50	€ 42.187.222,34	68%	€ 35.950.262,82	85%
AO7	Rocca Pia	€ 207.019,28	€ 203.214,50	98%	€ 162.483,31	80%
AO7	Roccacasale	€ 2.559.421,79	€ -	0%	€ -	0%
AO7	Scanno	€ 2.572.592,95	€ 553.233,10	22%	€ 553.233,10	100%
AO7	Sedrano	€ 2.127.315,23	€ 807.867,86	38%	€ 453.281,80	56%
AO7	Sulmona	€ 68.260.928,22	€ 38.911.476,78	57%	€ 24.755.142,57	64%
AO7	Villalongo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100%	€ 2.000,00	100%
AO7	Vitotorta	€ 27.617.209,90	€ 25.826.461,40	94%	€ 27.993.093,65	100%
<b>TOTALE AREA OMOGENEA 7</b>		<b>€ 296.755.977,00</b>	<b>€ 175.284.202,00</b>	<b>59%</b>	<b>€ 134.121.322,00</b>	<b>77%</b>
AO9	Aveitoli	€ 8.844.721,12	€ 2.013.838,07	23%	€ 1.712.139,01	85%
AO9	Avazzano	€ 1.686.149,14	€ 499.634,22	30%	€ 282.656,78	57%
AO9	Bisegna	€ 182.908,64	€ 181.993,27	99%	€ 172.878,64	95%
AO9	Celano	€ 23.698.072,46	€ 8.842.636,41	37%	€ 4.019.410,39	45%
AO9	Cerchio	€ 8.000,00	€ 8.000,00	100%	€ -	0%
AO9	Majano de' Marsi	€ 2.757.486,36	€ 2.134.123,36	77%	€ 1.788.136,43	84%
AO9	Masa d'Alto	€ 463.786,48	€ 195.188,28	42%	€ 33.024,32	17%
AO9	Ortina dei Marsi	€ 1.587.643,23	€ 1.291.700,54	81%	€ 1.066.232,43	83%
AO9	Ortuzchio	€ 90.518,92	€ -	0%	€ -	0%
AO9	Pescina	€ 301.394,86	€ 254.141,53	84%	€ 58.226,31	23%
AO9	San Benedetto dei Marsi	€ 2.524.682,65	€ 119.635,00	5%	€ 921.109,10	73%
AO9	Sante Marie	€ 117.883,14	€ -	0%	€ -	0%
AO9	Trasacco	€ 212.522,09	€ 212.522,09	100%	€ 212.522,09	100%
AO9	Villavallelonga	€ 242.876,71	€ 200.000,00	83%	€ -	0%
<b>TOTALE AREA OMOGENEA 9</b>		<b>€ 43.210.746,00</b>	<b>€ 15.955.411,00</b>	<b>37%</b>	<b>€ 10.266.347,00</b>	<b>64%</b>

Per la RICOSTRUZIONE PRIVATA si riporta anche il dettaglio della chiusura dei procedimenti 2020 per singolo Responsabile del procedimento:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PRATICHE AMMESSE		PRATICHE CHIUSE (1)	
	NUMERO	IMPORTO (€)	NUMERO	IMPORTO (€)
FUORI CRATERE				
VALENTINA SCIPIONE	6	€ 2.542.282,64	6	€ 153.847,73
LORENZA CALOCERO	2	€ 105.141,08	11	€ 2.103.275,52
ROBERTA M GRASSO	5	€ 1.330.812,05	0	€ -
ERIKA CIOCCA	4	€ 5.089.328,00	0	€ -

(1) Procedimenti chiusi con archiviazione o diniego

*Chiusura dei procedimenti 2020 per singolo responsabile del procedimento*

A far data dal 2014, la Delibera CIPE 1/2014 ha previsto che:

*“Al fine di garantire uniformità nei processi amministrativi e nelle valutazioni che si concludono con la concessione dei contributi per la ricostruzione dell’edilizia privata, anche i Comuni fuori dal cratere sismico si avvarranno, per l’istruttoria delle pratiche volte alla concessione dei detti contributi, degli Uffici territoriali della ricostruzione dei Comuni del cratere – coordinati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere – con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.”*

I Comuni hanno aderito agli Sportelli Decentrati USRC “di frontiera”, passando dalle 28 adesioni del 2013 alle 75 del 2018, nelle province di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Questo processo ha portato all’interno degli Sportelli Decentrati USRC **1.107 pratiche** (di cui 296 evase), per un importo complessivamente richiesto di circa **270 Mln €** (di cui ca 85 Mln € ammessi a contributo).

Di seguito il dettaglio per area omogenea.

SP	nrPratiche ACQUISITE SPORTELLO	IMPORTO RICHIESTO	NrPratiche RICONOSCIUTO POSITIVO	IMPORTO RICONOSCIUTO POSITIVO al 31/12/2018
SP Dec 3	232	€ 30.614.226,00	61	€ 8.731.088,00
SP Dec 4	47	€ 21.805.728,00	39	€ 13.494.849,00
SP Dec 5	439	€ 84.063.269,00	80	€ 16.226.101,00
SP Dec 6	40	€ 19.873.389,00	28	€ 8.933.980,00
SP Dec 7	214	€ 91.042.371,00	53	€ 32.780.693,00
SP Dec 9	135	€ 22.475.847,00	35	€ 4.778.634,00
	<b>1107</b>	<b>€ 269.874.830,00</b>	<b>296</b>	<b>€ 84.945.345,00</b>

Dal 1° luglio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione sono stati soppressi (co. 32, art. 32-bis, L.n.172/2017). Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131/2012 sono state trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

A seguito delle modifiche normative intervenute con la L.172/2017 è stato avviato il processo di riorganizzazione dell'USRC, che ha coinvolto in particolar modo la ricostruzione privata dei Comuni fuori cratere già convenzionati con alcuni Comuni sede degli Sportelli Decentrati per lo svolgimento delle istruttorie per la verifica di ammissibilità a contributo. Il personale originariamente dedicato a tale attività contrattualizzato dai Comuni sede di UTR non può essere più assunto nelle forme in cui ha operato fino al 2018, per il mancato stanziamento della copertura finanziaria. Da allora, si è dovuto attendere il DL 18 aprile 2019, n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - che ha stanziato i fondi all'USRC necessari per contrattualizzare nuovo personale dedicato a tali attività. Sono state reclutate nel 2019 nove consulenti esperti per le istruttorie, nominati 4 responsabili del procedimento tra i dipendenti USRC, e contrattualizzate 4 figure interinali, con le quali è stata così consentita **la ripresa delle attività istruttorie** (ammissioni e SAL) con l'assegnazione di 489 pratiche su 793 giacenti presso gli Sportelli, e **l'avvio di 291 procedimenti**, per complessivi **85 Mln €** di pratiche su un totale 173 Mln € totali in attesa di verifiche.

Di seguito il dettaglio per singola area omogenea alla data del 31/12/2020 e quello **relativo al solo anno 2020**.

RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI COMUNI FUORI CRATERE														
pratiche assegnate/avviate da USRC post 31/12/2018 (chiusura attività Sportelli) al 31/12/2020														
AO	NR PRATICHE da SP a USRC	IMPORTO	ASSEGNATE TECNICI USRC	IMPORTO	AVVIATE USRC	IMPORTO	IN ATTESA D'INTEGRAZIONE USRC/SP	IMPORTO	AMMESSE	IMPORTO	DINIEGO/ARCHIVIAZIONE	IMPORTO	DA ASSEGNARE	IMPORTO
AO3	175	22.279.072,20 €	118	17.113.192,11 €	53	6.220.233,81 €	23	€ 385.968,56	4	€ 753.662,96	4	€ 190.521,99	57	5.165.880,09 €
AO4	10	5.027.904,25 €	6	3.462.152,33 €	3	1.809.964,39 €	1	444.539,07 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4	1.565.751,92 €
AO5	379	62.687.860,36 €	262	44.613.862,55 €	171	32.341.958,29 €	138	€ 24.642.692,09	8	€ 752.413,68	12	€ 729.714,61	117	18.073.997,81 €
AO6	22	14.715.089,24 €	16	12.401.546,19 €	7	8.249.746,76 €	4	€ 2.356.266,88	2	€ 1.490.878,25	2	€ 1.441.552,01	6	2.313.543,05 €
AO7	124	36.924.989,00 €	80	37.223.618,15 €	50	33.550.343,87 €	60	€ 22.786.602,37	3	€ 4.937.637,31	1	€ 123.134,29	44	19.701.369,85 €
AO9	83	11.166.142,67 €	7	3.323.325,56 €	7	3.323.325,56 €	80	€ 9.467.262,77	1	€ 34.985,76	0	€ 0,00	76	7.842.817,11 €
	793	172.801.056,72 €	489	118.137.696,89 €	291	85.495.572,68 €	306	60.083.336,74 €	18	9.469.577,96 €	20	2.484.922,90 €	304	54.663.359,83 €

**RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI COMUNI FUORI CRATERE**  
pratiche istruite da USRC nel **2020**

AO	ASSEGNATE TECNICI USRC	IMPORTO	AVVIATE USRC	IMPORTO	AMMESSE	IMPORTO	DINIEGO	IMPORTO
AO3	37	5.168.714,64 €	42	7.738.502,69 €	4	€ 753.662,96	4	€ 190.521,99
AO4	4	2.200.596,65 €	2	484.873,55 €	0	0,00 €	0	0,00 €
AO5	102	12.867.971,59 €	95	13.507.387,46 €	8	€ 752.413,68	12	€ 729.714,61
AO6	7	3.356.085,79 €	4	4.866.948,13 €	2	€ 3.490.878,25	1	€ 1.336.886,65
AO7	15	11.579.253,56 €	23	12.722.645,15 €	3	€ 4.437.637,31	2	€ 123.134,29
AO9	0	0,00 €	0	0,00 €	1	€ 34.985,76	0	€ 0,00
	<b>165</b>	<b>35.172.622,23 €</b>	<b>166</b>	<b>39.320.356,98 €</b>	<b>18</b>	<b>9.469.577,96 €</b>	<b>19</b>	<b>2.380.257,54 €</b>

Per quanto riguarda l'**istruttoria dei SAL** ereditati dagli Sportelli e ad oggi acquisiti da USRC, le richieste di liquidazione gestite per i Comuni Fuori Cratere **risultano 197** di cui **145 liquidate**.

Di seguito il dettaglio per singola area omogenea alla data del 31/12/2020 e quello relativo al solo **anno 2020**.

**RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI COMUNI FUORI CRATERE**

stati avanzamento lavori assegnate/avviate da USRC post 31/12/2018 (*chiusura attività Sportelli*) al 31/12/2020

AREA OMOGENEA	NR SAL	LIQUIDATI	IMPORTO LIQUIDATO	IN ATTESA D'INTEGRAZIONE	IN ISTRUTTORIA INTEGRAZIONE	ARCHIVIATA	IN ISTRUTTORIA
AO3	39	22	2.158.270,96 €	5	9	0	3
AO4	28	17	2.495.859,56 €	1	4	2	4
AO5	51	41	3.996.534,75 €	5	2	0	3
AO6	22	16	3.036.745,22 €	0	4	0	2
AO7	30	26	2.627.544,43 €	0	2	2	0
AO9	27	23	2.059.400,45 €	1	2	1	0
	<b>197</b>	<b>145</b>	<b>16.374.355,37 €</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

**RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI COMUNI FUORI CRATERE**

stati avanzamento lavori ISTRUITI da USRC NEL 2020

AREA OMOGENEA	NR SAL ACQUISITI NEL 2020	LIQUIDATI nel 2020	IMPORTO LIQUIDATO	IN ATTESA D'INTEGRAZIONE	IN ISTRUTTORIA INTEGRAZIONE	ARCHIVIATA	IN ISTRUTTORIA
AO3	9	12	1.063.947,54 €	2	1	0	2
AO4	13	14	1.888.841,52 €	0	2	1	2
AO5	28	26	2.410.403,98 €	4	2	0	2
AO6	10	12	2.386.184,29 €	0	3	0	2
AO7	11	17	1.860.706,03 €	0	2	1	0
AO9	6	15	985.760,81 €	1	0	0	0
					<b>ACQUISITI 2020</b>		
	<b>77</b>	<b>96</b>	<b>10.595.844,17 €</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

Le abitazioni, nei Comuni Fuori Cratere, per le quali è stata ripristinata l'agibilità, ad oggi si stima risultino essere circa 1.900, su un totale di circa 3.610 abitazioni inagibili alla data del 2009; **nel 2020 le abitazioni tornate agibili sono circa 240 e sono attualmente in corso 260 cantieri, di cui 45 avviati nel 2020.**

Analogamente a quanto avviene per la ricostruzione privata dei comuni del cratere, l'USRC esegue il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata ex. art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012. Il monitoraggio, realizzato interamente on-line con l'aggiornamento della Banca Dati del portale Aveianet è inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato sul sito [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

Al **31/12/2020** l'USRC ha assegnato complessivamente **323 Mln €**, di cui trasferiti **239 Mln €**.

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
<b>A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC</b>	<b>€ 346.770.424,74</b>	
<b>B. Totale utilizzi USRC</b> Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni Fuori Cratere		<b>€ 323.593.608,14</b>
<b>C. Totale Disponibile</b> Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Fuori Cratere		<b>€ 23.443.935,01</b> (comprensivi residui gestioni precedenti)

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 114 Comuni del Fuori Cratere e rappresentano circa il 90% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

Nel corso dell'anno **2020** sono stati complessivamente **trasferiti** da parte dell'USRC **€ 31.533.828,16** a 43 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati **assegnati** finanziamenti a 28 comuni per complessivi **€ 22.547.817,86**. Nella pagina seguente il dettaglio.

COMUNE	ASSEGNAZIONE FONDI		EROGAZIONE FONDI	
	NUMERO DI ASSEGNAZIONI	IMPORTO (€)	NUMERO DI EROGAZIONI	IMPORTO (€)
COMUNE DI ABBATEGGIO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI AIELLI	0	€ 0,00	2	€ 623.782,44
COMUNE DI ALANNO	2	€ 391.870,79	0	€ 0,00
COMUNE DI ANCARANO	1	€ 6.997,73	0	€ 0,00
COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI	1	€ 1.116.219,32	2	€ 726.478,29
COMUNE DI ATRI	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI AVEZZANO	0	€ 0,00	2	€ 150.772,78
COMUNE DI BASCIANO	0	€ 0,00	1	€ 160.509,76
COMUNE DI BELLANTE	1	€ 116.044,50	2	€ 104.386,42
COMUNE DI BISEGNA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI BISENTI	0	€ 0,00	2	€ 3.443.830,83
COMUNE DI BOLOGNANO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CALASCIO	2	€ 658.547,49	1	€ 1.442.162,19
COMUNE DI CAMPLI	1	€ 68.254,49	2	€ 188.227,22
COMUNE DI CANSANO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CANZANO	0	€ 0,00	1	€ 118.160,94
COMUNE DI CAPISTRELLO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CARAMANICO TERME	1	€ 29.550,08	1	€ 10.565,95
COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CARSOLI	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CASTEL CASTAGNA	0	€ 0,00	1	€ 284.689,09
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CASTELLAFIUME	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CASTELLALTO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA	0	€ 0,00	1	€ 650.036,26
COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	1	€ 1.991.375,46	1	€ 948.079,43
COMUNE DI CASTILENTI	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CATIGNANO	1	€ 633.288,66	0	€ 0,00
COMUNE DI CELANO	2	€ 1.685.032,79	2	€ 1.179.507,90
COMUNE DI CELLINO ATTANASIO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CEPAGATTI	0	€ 0,00	1	€ 12.667,46
COMUNE DI CERCHIO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CERMIGNANO	1	€ 3.136.819,12	1	€ 174.542,37
COMUNE DI CHIETI	2	€ 360.343,21	2	€ 360.343,21
COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CIVITAQUANA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI COLLECORVINO	0	€ 0,00	2	€ 1.751.937,26
COMUNE DI COLLELONGO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI COLLEPIETRO	0	€ 0,00	1	€ 271.297,38
COMUNE DI CONTROGUERRA	0	€ 0,00	2	€ 175.560,87
COMUNE DI CORFINIO	0	€ 0,00	3	€ 616.006,95
COMUNE DI CORROPOLI	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CORTINO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI CORVARA	0	€ 0,00	1	€ 15.447,70

COMUNE DI CROGNALETO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI ELICE	1	€ 276.826,27	2	€ 182.001,46
COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI FARINDOLA	0	€ 0,00	1	€ 33.393,45
COMUNE DI GIOIA DEI MARSI	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI GIULIANOVA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI GUARDIAGRELE	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI INTRODACQUA	0	€ 0,00	2	€ 540.345,85
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	1	€ 433.585,80	1	€ 1.783.504,20
COMUNE DI LETTOMANOPPELLO	1	€ 24.751,79	0	€ 0,00
COMUNE DI LETTOPALENA	0	€ 0,00	1	€ 181.485,89
COMUNE DI LORETO APRUTINO	0	€ 0,00	3	€ 172.259,12
COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI	0	€ 0,00	1	€ 169.477,34
COMUNE DI MANOPPELLO	1	€ 362.992,03	1	€ 272.201,88
COMUNE DI MASSA D'ALBE	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI MOLINA ATERNO	0	€ 0,00	2	€ 443.020,67
COMUNE DI MONTEFINO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI MONTESILVANO	1	€ 179.791,12	0	€ 0,00
COMUNE DI MORRO D'ORO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI MOSCUFO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI NERETO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI NOCCIANO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI NOTARESCO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI ORTONA DEI MARSI	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI ORTUCCHIO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI PACENTRO	0	€ 0,00	1	€ 71.107,87
COMUNE DI PALENA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI PENNE	2	€ 148.917,84	0	€ 0,00
COMUNE DI PESCARA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI PESCIANA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI PESCOSANSONESCO	1	€ 437.741,16	0	€ 0,00
COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI PIANELLA	1	€ 63.658,92	0	€ 0,00
COMUNE DI PICCIANO	1	€ 97.869,99	1	€ 122.002,78
COMUNE DI PIETRANICO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI PRATOLA PELIGNA	4	€ 3.869.213,90	1	€ 1.520.069,84
COMUNE DI PREZZA	0	€ 0,00	1	€ 105.596,57
COMUNE DI RAIANO	2	€ 581.150,41	1	€ 1.639.233,40
COMUNE DI ROCCA PIA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI ROCCACASALE	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI ROCCAMORICE	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI ROSCIANO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS	3	€ 3.513.168,97	2	€ 2.907.687,45
COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	0	€ 0,00	1	€ 4.195,19

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI SANTE MARIE	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA	1	€ 80.000,00	0	€ 0,00
COMUNE DI SCAFA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI SCANNO	1	€ 126.153,56	0	€ 0,00
COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI SECINARO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI SULMONA	2	€ 1.951.444,77	2	€ 4.091.084,42
COMUNE DI TERAMO	1	€ 206.207,69	1	€ 1.101.154,43
COMUNE DI TOCCO DA CASOURIA	0	€ 0,00	2	€ 990.235,35
COMUNE DI TOLLO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI TORANO NUOVO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI TORRICELLA SICURA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI TORTORETO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI TRASACCO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI TURRIVALIGNANI	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI VALLE CASTELLANA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI VICOLI	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI VILLA CELIERA	0	€ 0,00	1	€ 37.470,50
COMUNE DI VILLALAGO	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI VILVALLELONGA	0	€ 0,00	0	€ 0,00
COMUNE DI VITTORITO	0	€ 0,00	1	€ 1.757.307,80
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>€ 22.547.817,86</b>	<b>63</b>	<b>€ 31.533.828,16</b>

## 5. RICOSTRUZIONE PUBBLICA



Nel rispetto del riparto di competenze previsto nella gestione ordinaria, l'USRC cura la programmazione delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica, effettua il trasferimento delle somme e cura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi così come stabilito dal decreto del MEF del 20/10/2012.


Nel 2013 è stata definita la **Programmazione triennale della Ricostruzione Pubblica (2013 - 2015)**, finanziata dalla delibera CIPE 135/2012, per un importo complessivo di **126,45 Mln €**, così distribuiti:

- **76,7 Mln €** destinati ad interventi di ricostruzione pubblica relativi a *Case Comunali, Infrastrutture, Reti, Edilizia Residenziale Pubblica, Centri di Aggregazione, Edilizia Cimiteriale*;
- **49,8 Mln €** destinati all'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica di *reti servizi e spazi pubblici* all'interno dei Piani di Ricostruzione e alla *messa in sicurezza del sottosuolo interessato da cavità naturali e antropiche* che inficiano la ricostruzione pubblica e privata.

Il documento riepilogativo, disponibile nella sezione dedicata del sito [www.usrc.it](http://www.usrc.it) all'indirizzo che segue, indica gli interventi di competenza dei Comuni del cratere:

<http://www.usrc.it/index.php/attivita/ricostruzione-pubblica/programmazione-2013-2015>.

### STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AL 31/12/2020 (IN MLN DI EURO)

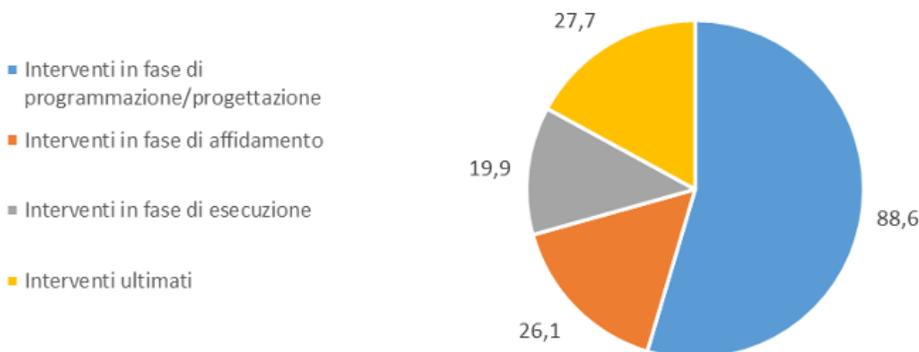

Sono ad oggi **190** i progetti finanziati in via definitiva, per complessivi **73,7 Mln €**, che rappresentano complessivamente oltre il 60% degli interventi programmati. Di questi:

- **104** interventi sono ultimati o in fase di collaudo, per un importo pari a **27,7 Mln €**;
- **28** interventi con lavori in corso, per un importo pari a **19,8 Mln €**;
- **58** interventi per i quali è in corso l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, per un importo pari a **26,1 Mln €**.

Risultano inoltre **120 interventi programmati**, con una copertura finanziaria di complessivi **88,8 Mln €**.

Per l'attuazione degli interventi afferenti alla **Programmazione triennale della Ricostruzione Pubblica**, sono stati trasferiti ai Comuni per il pagamento dei lavori eseguiti **44.954.754,42 €**.

Alcuni interventi ultimati finanziati con la deliberazione CIPE 135/2012:

Comune di Barisciano (AQ)  
Municipio € 1.692.000,00



Comune di Villa Sant'Angelo (AQ)  
Municipio € 293.431,00



Comune di Civitella Casanova (PE)  
Municipio € 876.895,00



Comune di Carapelle Calvisio (AQ)  
Municipio € 398.887,00



Comune di S. Pio delle Camere (AQ)  
Municipio € 1.149.743,00



Comune di Montereale (AQ)  
Scuola Media € 1.919.033,46



La **Delibera CIPE 48/2016** ha assegnato risorse per garantire la continuità della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo. In attesa della definizione e dell'andata a regime dei Programmi pluriennali di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione, è stato approvato un "*Piano Stralcio*", una tantum, per velocizzare i processi di ricostruzione dei territori interessati. In particolare, il CIPE con la suddetta delibera:

- ha definito gli indirizzi, i criteri e le modalità per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione; al fine di razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica, così da conseguire adeguati livelli di coordinamento, efficienza ed efficacia degli interventi stessi, in linea con quanto disposto dal decreto-legge n. 78/2015;
- ha approvato e assegnato risorse per la realizzazione del Piano Stralcio, disponendo, in particolare, l'assegnazione dell'importo complessivo di 57.417.829,28 €, a valere sulle disponibilità delle risorse stanziata dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per l'anno 2016.

In particolare, sono stati finanziati nei comuni del Cratere i seguenti interventi per **€ 14.518.905,01**:

Intervento	Stazione Appaltante	Importo	
<p>Completamento Piccolomini-casa Castello Comunale. <b>Comune di Capestrano</b></p>	<p>Provveditorato Interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna</p>	<p>€ 554.970,00</p>	
<p>Completamento intervento per riparazione e ripristino dell'edificio Comunale Polivalente Palazzo Tinozzi. <b>Comune di Cugnoli</b></p>	<p>Provincia di Pescara</p>	<p>€ 896.360,23</p>	
<p>Palazzo Muzi, Il Stralcio. <b>Comune di Fontecchio</b></p>	<p>Provveditorato Interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna</p>	<p>€ 4.752.204,00</p>	
<p>Ristrutturazione dell'ex Convento di Sant'Angelo d'Ocre. <b>Comune di Ocre</b></p>	<p>Provveditorato Interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna</p>	<p>€ 4.157.104,00</p>	
<p>Completamento ex scuola elementare da destinare a Casa Comunale. <b>Comune di San Demetrio ne' Vestini</b></p>	<p>Provveditorato Interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna</p>	<p>€ 1.994.768,00</p>	
<p>Programmazione, esecuzione e analisi delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche e progettazione preliminare delle opere di messa in sicurezza delle cavità sotterranee. <b>Comuni di Fagnano Alto, Barisciano, Navelli, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini.</b></p>	<p>Provveditorato Interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna</p>	<p>€ 2.163.498,78</p>	

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018 la **Delibera CIPE 28 febbraio 2018 n. 24**, *“Sisma Abruzzo 2009 – assegnazione di risorse al settore di ricostruzione pubblica “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali”*.

Il CIPE ha approvato il Piano annuale 2018, predisposto dalla Struttura di missione in collaborazione con gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativo al Settore di ricostruzione pubblica *“Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali”*, assegnando l'importo complessivo di € 81.685.696,42, di cui € 60.388.383,79 all'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila ed **€ 21.297.312,63 all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.**

Il Piano Annuale ha individuato 64 interventi – 24 nel Comune dell'Aquila, **21** negli altri Comuni del **cratere** e **14** nei Comuni **fuori cratere** sismico – per il ripristino di sedi istituzionali e altri edifici strategici, strutture ricreative e sportive, edilizia cimiteriale, nonché chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel corso del **2020** sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 6.227.223,04** per interventi pubblici e sono stati assegnati finanziamenti per 59 interventi pari a **€ 17.420.413,98**. Si riporta di seguito il dettaglio fondi OO.PP. per singolo comune.

Inoltre, nel primo semestre 2020 è stato finalizzato il lavoro di ricognizione e programmazione delle esigenze legate agli ulteriori interventi di ricostruzione pubblica. Nella seduta del CIPE del 14/05/2020, è stata approvata la seconda annualità del Piano relativo al *“Settore 4 - Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali”* per un importo complessivo di ca. 38 milioni di euro: con l'assegnazione di **oltre 30 milioni di euro all'USRC** per l'attuazione di **37 interventi in comuni del cratere e fuori cratere**, è stato dato concreto avvio all'esecuzione di opere le cui progettazioni erano state in parte finanziate con la prima annualità della deliberazione CIPE 24/2018, segno questo di grande proattività da parte degli enti locali nel dare concretezza allo stanziamento di fondi. Questo lavoro di programmazione è stato finalizzato con la pubblicazione in GU della **Delibera CIPE 18/2020** *“Sisma Abruzzo 2009 - Approvazione del secondo piano annuale e assegnazione di risorse al settore di ricostruzione pubblica «funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali»*”.

## 6. EDILIZIA SCOLASTICA



Con Decreto DiSET n. 48 del 14 marzo 2013, sono state trasferite all'USRC le competenze per l'attuazione del Piano denominato "**Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza**", finalizzato alla riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009, per tutte le scuole della Regione Abruzzo ad eccezione di quelli ricadenti nel Comune di L'Aquila, per una somma di € **155.787.593,30**.

Le competenze riguardano la conclusione delle procedure per il secondo programma stralcio, quasi completamente avviato nel 2011 dal Commissario Delegato per la Ricostruzione, e l'avvio del terzo programma stralcio.

Con Delibera CIPE 85/2013 è stata approvata la rimodulazione del Piano, predisposta dall'USRC su proposta delle Amministrazioni interessate, che ha aggiornato e modificato l'elenco delle scuole finanziate lasciando inalterate le assegnazioni di fondi a ciascuna Amministrazione beneficiaria.

Gli interventi previsti riguardano la **riparazione**, il **miglioramento sismico** e, in alcuni casi, la **costruzione di nuovi**

**edifici scolastici** coinvolgendo oltre **150 edifici, 4 province e 96 comuni**, e quasi **30.000 studenti** abruzzesi.

Con **Delibera CIPE n.77** del 6 agosto 2015 sono state assegnate risorse pari a € **6.237.211,00** destinate a interventi nei comuni del cratere e fuori del cratere. La **Deliberazione del CIPE n. 48/2016** ha assegnato ulteriori fondi pari ad € **8.342.067,76**.

Con **Delibera CIPE n. 110/2017** è stato approvato il Piano annuale 2018 per l'istruzione primaria e secondaria e sono stati assegnati complessivamente € 24.234.547,06 per un totale di 46 interventi, 29 dei quali già interessati dal Piano "Scuole d'Abruzzo-Il Futuro in Sicurezza", eccetto quelli ricadenti sul territorio comunale dell'Aquila, individuando come Soggetto competente e responsabile il MIUR. Successivamente la **Delibera n.CIPE n. 32/2019** ha modificato le precedenti Delibere n. 48/2016 e n. 110/2017 assegnando al MIUR la competenza della programmazione del Settore ed agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, nell'ambito territoriale di propria competenza, la responsabilità di attuazione del Piano annuale.

I requisiti degli interventi ammissibili a finanziamento (tra i quali, il nesso di causalità con il sisma, la funzionalità scolastica, il raggiungimento di un indicatore di rischio sismico almeno pari a 0.65) sono individuati nel "**Disciplinare relativo agli interventi di**

cui al D.C.D. 89/2011”, e nelle “Linee guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell’allegato al D.C.D.

n. 89/2011”, predisposti dall’USRC per fornire chiare indicazioni ai soggetti attuatori (Province e Comuni).

## ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI



**Comune di Ovindoli**  
Scuola materna ed elementare

Adeguamento sismico dell’edificio scolastico e sostituzione edilizia della palestra - € 1.475.000,00



**Comune di Montereale**  
Scuola media

Intervento di sostituzione edilizia  
€ 1.919.033,46



**Comune di Vittorito**  
Scuola elementare

Intervento di sostituzione edilizia  
€ 1.008.000,00




Comune di Raiano  
Scuola elementare



Intervento di sostituzione edilizia  
€ 3.160.000,00




### STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI (Dicembre 2020)

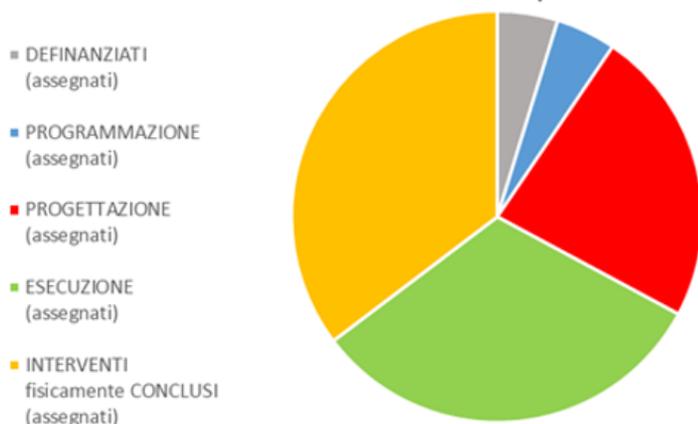

Sulla base dei criteri e delle procedure definiti dall'USRC nel 2013, ad oggi, sono stati **approvati 105 interventi** per oltre **99.9 Mln€**, immediatamente cantierabili, e sono state **trasferite** agli enti attuatori **risorse per 76,8 Mln€**.

Dei **105 interventi approvati**, **70** hanno concluso i lavori, **29** cantieri sono in corso e **6** stanno espletando le procedure di gara.

### TIPOLOGIE DI INTERVENTO

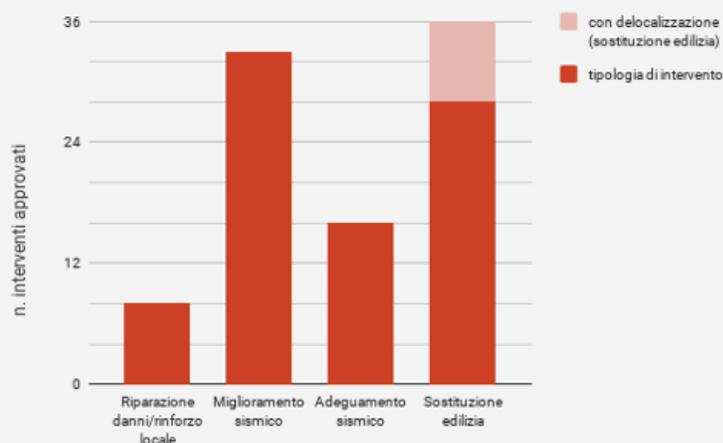

Gli interventi riguardano edifici che hanno manifestato un'elevata vulnerabilità sismica e sono finalizzati al raggiungimento del massimo livello di sicurezza conseguibile con il finanziamento disponibile; per quasi la metà di essi è prevista la sostituzione dei vecchi fabbricati con nuovi edifici scolastici.

Nel corso del **2020** sono stati complessivamente **trasferiti** da parte dell'USRC **9.761.828,84 €** a 23 soggetti attuatori degli interventi di edilizia scolastica e sono stati **assegnati** finanziamenti a 6 enti per interventi pari ad **3.623.517,78 €**.

Fra gli interventi finanziati, nel corso del 2020, ben **10** hanno concluso i lavori, mentre gli altri procedono con l'esecuzione dei lavori e la progettazione. Nel corso del mese di maggio, è stata avviata e conclusa la procedura di ricognizione del fabbisogno economico per la programmazione della II annualità degli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Le risorse per l'annualità 2020 sono state assegnate a dicembre dal Cipe e sono in attesa di essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi conclusi ed alcune immagini.

USRC - Edilizia scolastica - Interventi conclusi 2020	Importo	Tipo di intervento
I.T.C. "C. Rosa" di Nereto - Provincia di Teramo	1.308.494,00 €	miglioramento sismico
Liceo Classico Delfico - Provincia di Teramo	1.169.178,00 €	nuova costruzione
Scuola Don Bosco - Comune di Avezzano	473.041,00 €	nuova costruzione
Scuola media Capograssi - Comune di Sulmona	2.551.000,00 €	miglioramento sismico
Istituto omnicomprensivo del Comune di Carsoli.	1.980.842,08 €	nuova costruzione
Scuola media - Comune di Castel di Sangro	4.720.000,00 €	nuova costruzione - delocal.
Scuola materna Polo Marrocchi – Comune di Campi	600.000,00 €	miglioramento sismico
Scuola primaria di Cerratina - Comune di Pianella	59.900,00 €	miglioramento sismico
Scuola materna e media in Via Alcide de Gasperi - Comune di Montebello Di Bertona	500.000,00 €	nuova costruzione
Scuola elementare - Nuovo polo scolastico - Comune di Oricola	726.300,00 €	nuova costruzione
<b>Totale</b>	<b>14.088.755,08 €</b>	

### ALCUNI INTERVENTI INAUGURATI NEL 2020



**Comune di Oricola**  
Scuola primaria – Nuovo Polo



Intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione  
€ 726.000,00






Comune di Sulmona  
Scuola secondaria di 1° grado



Intervento di miglioramento sismico  
€ 2.551.000,00

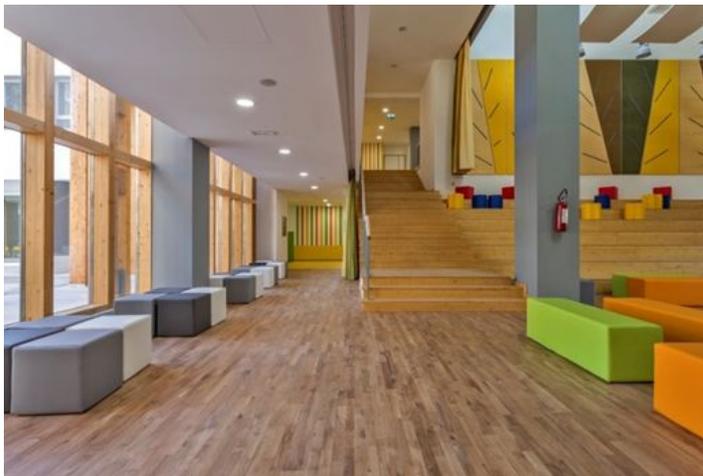

AGORA' (spazio centrale) della nuova Scuola elementare di Celano

L'U.S.R.C. ha contribuito a diffondere presso le amministrazioni competenti le **indicazioni dettate dalle Linee guida del MIUR**, attraverso incontri, materiale informativo. Le nuove scuole sono state progettate e realizzate con l'idea di rinnovare gli spazi dedicati alla didattica, pensati in maniera più fluida e flessibile, e con un nuovo rapporto con il territorio; la scuola, infatti, è concepita come «*centro civico*», luogo aperto al territorio e al servizio della comunità oltre gli orari scolastici, acquisendo una nuova identità.

L'Ufficio ha inoltre provveduto alla copertura economica delle spese necessarie alla **sistemazione provvisoria degli studenti** (mediante affitto di strutture alternative, adeguamento di locali di proprietà dell'amministrazione, affitto di moduli prefabbricati...), necessaria a garantire la continuità didattica durante l'esecuzione degli interventi, ed ha definito i criteri di ripartizione delle somme disponibili alle singole amministrazioni richiedenti, in funzione del numero degli alunni e dell'entità dei lavori da effettuare.



## 7. SVILUPPO DEL TERRITORIO

La L. 134/2012 individua tra le finalità della gestione ordinaria della ricostruzione quella di assicurare l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (art.67-ter, co.1) ed assegna all'USRC la competenza anche in ordine allo sviluppo dei territori (art.67-ter, co.2).


Allo scopo, **l'art. 11, co. 12, del D.L. n. 78/2015**, ha destinato una quota (**fino al 4%**) delle risorse finanziarie stanziata per la ricostruzione al **Programma di sviluppo RESTART**, predisposto della SdM – Struttura di Missione (ex DPCM 1 giugno 2014, confermata con modificazioni dal DPCM 4 ottobre 2019) ed approvato con **Delibera CIPE n. 49/2016**, con una dotazione finanziaria pari a **219,7 mln€**, per interventi da attuarsi nel territorio del Cratere sismico abruzzese. Tali risorse sono aggiuntive a quelle già assegnate allo sviluppo con **Delibera CIPE n. 135/2012**, pari a **100 mln€**.

Con successive **delibere CIPE n. 70/2017, 115/2017, 25/2018, 56/2018, 20/2019, 54/2019, 16/2020 e 17/2020**, sono stati approvati ulteriori interventi del Programma di sviluppo RESTART ed assegnate ulteriori risorse per l'attuazione degli interventi.

Nella Tabella che segue è riportato lo stato di avanzamento del Programma per ciascuna delle Priorità o Ambiti tematici, con riferimento alle Delibere CIPE sopra richiamate:

RIEPILOGO PROGRAMMA SVILUPPO (DELIBERA CIPE N. 49/2016 + DELIBERA CIPE N. 135/2012)						
PRIORITA' - AMBITI TEMATICI RESTART	RIPARTO FINANZIARIO / DOTAZIONE PRIORITA'	INCIDENZA SUL TOTALE PROGRAMMA	TOTALE RISORSE APPROVATE	% RISORSE APPROVATE SU DOTAZIONE PRIORITA'	RISORSE RESIDUE	% RISORSE RESIDUE SU DOTAZIONE PRIORITA'
	mln€	%	mln€	%	mln€	%
A - Sistema imprenditoriale e produttivo	130,1	41%	89,2	69%	40,9	31%
B - Turismo e ambiente	80,3	25%	61,1	76%	19,2	24%
C - Cultura	14,8	6%	14,8	100%	0,0	0%
D - Alta formazione	21,8	4%	19,0	87%	2,8	13%
E - Ricerca e innovazione tecnologica	58,9	20%	57,7	98%	1,2	2%
F - Agenda digitale	9,4	2%	6,8	72%	2,6	28%
G - Governance, monitoraggio e valutazione del programma di Sviluppo	4,4	2%	4,4	100%	0,0	0%
<b>TOTALE</b>	<b>319,7</b>	<b>100%</b>	<b>253,1</b>	<b>79%</b>	<b>66,6</b>	<b>21%</b>

#### PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA RESTART

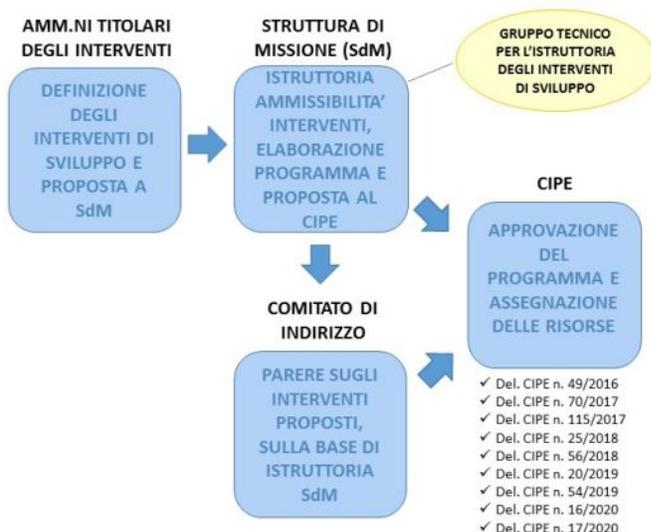

Nell'ambito della procedura di approvazione degli interventi del programma RESTART, l'USRC è componente del **Gruppo tecnico per l'istruttoria degli interventi di sviluppo**, competente alla valutazione delle proposte di intervento presentate dalle Amministrazioni Titolari, a supporto della SdM – Struttura di Missione, e fa parte del **Comitato di Indirizzo**, nella figura del Titolare.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, l'USRC è inoltre competente, in fase di attuazione del programma, al **trasferimento delle risorse destinate agli interventi di RESTART a titolarità dei Comuni del Cratere sismico**, ad esclusione di L'Aquila, previa istruttoria positiva da parte della SdM e trasferimento delle relative risorse da parte del MEF – Dipartimento del Tesoro.

Fin ad oggi, l'USRC ha effettuato il trasferimento di risorse per un importo complessivo pari a € **191.275,44**, destinate ai seguenti interventi del Programma RESTART, entrambi ricadenti nella Priorità D – Alta formazione:

- *"Potenziamento del curriculum in ambito linguistico e scientifico"*, a titolarità del Comune di Scoppito;
- *"Wayne in Abruzzo"*, a titolarità del Comune di Gagliano Aterno.

Il sito internet istituzionale dell'USRC rende disponibile l'informativa in ordine allo stato di attuazione del Programma RESTART, al link che segue:

<http://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/programma-di-sviluppo-restart>

A far data dall'anno 2019, l'USRC sta affiancando la Struttura di Missione ed i 56 Comuni del Cratere nella predisposizione, da parte delle Aree Omogenee (AO) del Cratere, di **8 PIT – Progetti Integrati per il Turismo**, a valere sulle risorse disponibili per la **Priorità B – Turismo e Ambiente**. Con **delibera CIPE n. 16 del 14 maggio 2020** è stato approvato il primo PIT, *"Terre della Baronìa"*, proposto da **5 Comuni** del Cratere (Comuni di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Ofena e Castelvecchio Calvisio) afferenti prevalentemente **all'A04**, per un importo pari a € **5.353.716,39**.

Per gli ulteriori **7 PIT** delle restanti Aree Omogenee è in corso di espletamento l'iter istruttorio propedeutico all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo e del CIPE.

Il fabbisogno finanziario espresso dal territorio nei PIT non ancora pervenuti all'approvazione, pari complessivamente a circa 60 mln€, è ampiamente superiore all'attuale disponibilità finanziaria residua sulla Priorità B del Programma di Sviluppo RESTART, pari a 19,2 mln€. Sarebbe pertanto necessaria una rimodulazione delle risorse del Programma RESTART che possa assicurare alla Priorità B sufficiente dotazione finanziaria per i PIT proposti. I PIT hanno l'obiettivo di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico del territorio del Cratere, a completamento e valorizzazione delle azioni di ricostruzione dei borghi, in linea con la vocazione turistica prevalente dell'AO di appartenenza.

I **PIT - Progetti integrati per il Turismo** sono diretti a potenziare:

- **Turismo storico culturale e religioso:** valorizzazione della fruizione delle aree archeologiche, dei castelli e delle fortificazioni, del patrimonio architettonico e culturale, nonché delle attrattive di interesse storico-religioso;
- **Turismo naturalistico:** promozione delle aree ad alto valore ambientale (parchi e riserve naturali), dei percorsi storico ambientali (i Tratturi e la via della Lana) e della montagna (stazioni sciistiche, sentieristica, ecc.);
- **Turismo dei borghi, delle tradizioni popolari ed enogastronomico:** valorizzazione dei borghi storici, delle feste popolari, delle produzioni tipiche di alta qualità.

I PIT predisposti intendono valorizzare le peculiarità di ciascuna Area Omogenea, dalla componente religiosa (A07), a quella naturalistica e paesaggistica (A02, A05, A08, A03, A09), enogastronomica e culturale (A06, A04), mettendo a sistema i diversi percorsi di mobilità lenta (i cammini, i tratturi, ecc.), i siti di interesse culturale ed i borghi. Gli interventi fisici sono affiancati da interventi immateriali di marketing territoriale, con la costruzione di *brand identity* utili alla riconoscibilità dell'offerta territoriale.

In tema di **valorizzazione turistica del territorio**, l'USRC ha dato avvio all'implementazione di **"STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE"**, un quadro di area vasta delle risorse turistiche del territorio del Cratere, composto dall'analisi dei principali tematismi/valori e dalla sintesi degli stessi in una Visione guida, che mette a sistema le emergenze puntuali di valore storico, architettonico e naturalistico ed i percorsi fisici e tematici che le collegano, con l'obiettivo di delineare un sistema integrato di fruizione e conoscenza dei luoghi, funzionale a consolidare l'identità e la cultura del territorio.

In linea con gli obiettivi posti dall'OCSE nel Rapporto del 2013, *"L'azione delle politiche a seguito di disastri naturali: aiutare le regioni a sviluppare resilienza"*, le analisi e gli scenari di valorizzazione sviluppati dall'USRC si rivolgono all'intero territorio del Cratere, ad una scala di area vasta adeguata a restituire una visione unitaria delle risorse territoriali e funzionale alla costruzione di un'offerta turistica integrata e diffusa.

La Visione guida e le analisi ad essa presupposte sono rese disponibili ai Comuni del Cratere, quale strumento a supporto delle decisioni e delle proposte di intervento in materia di sviluppo del territorio, sul sito istituzionale dell'USRC, al seguente link:


<http://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/strategie-sviluppo-turistico>

Nel settembre 2020, l'USRC ha inoltre risposto alla call del Dipartimento della Presidenza della Regione Abruzzo volta ad individuare le proposte progettuali della Regione Abruzzo quale contributo al **PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** nell'ambito del percorso di programmazione avviato dalla Conferenza delle Regioni con il Governo centrale. La Regione Abruzzo ha posto in essere un processo di censimento e mappatura dei progetti inteso a selezionare le proposte rispondenti:

- alle linee strategiche e alle missioni strutturali di intervento del PNRR;
- ai criteri di selezione e valutazione dei progetti in coerenza alle Linee guida del Governo.

L'USRC ha presentato in tale sede il Progetto *«Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani»*, per un importo di 70 mln€, entrato a far parte, insieme ad altre 73 proposte progettuali regionali, della "Banca progetti" della Regione Abruzzo, oggetto della proposta-contributo al PNRR *"L'Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese"* inviata il 15 ottobre 2020 dalla Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri agli Affari Europei e agli Affari regionali. Il documento è disponibile al seguente link:

<https://www.regione.abruzzo.it/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr>

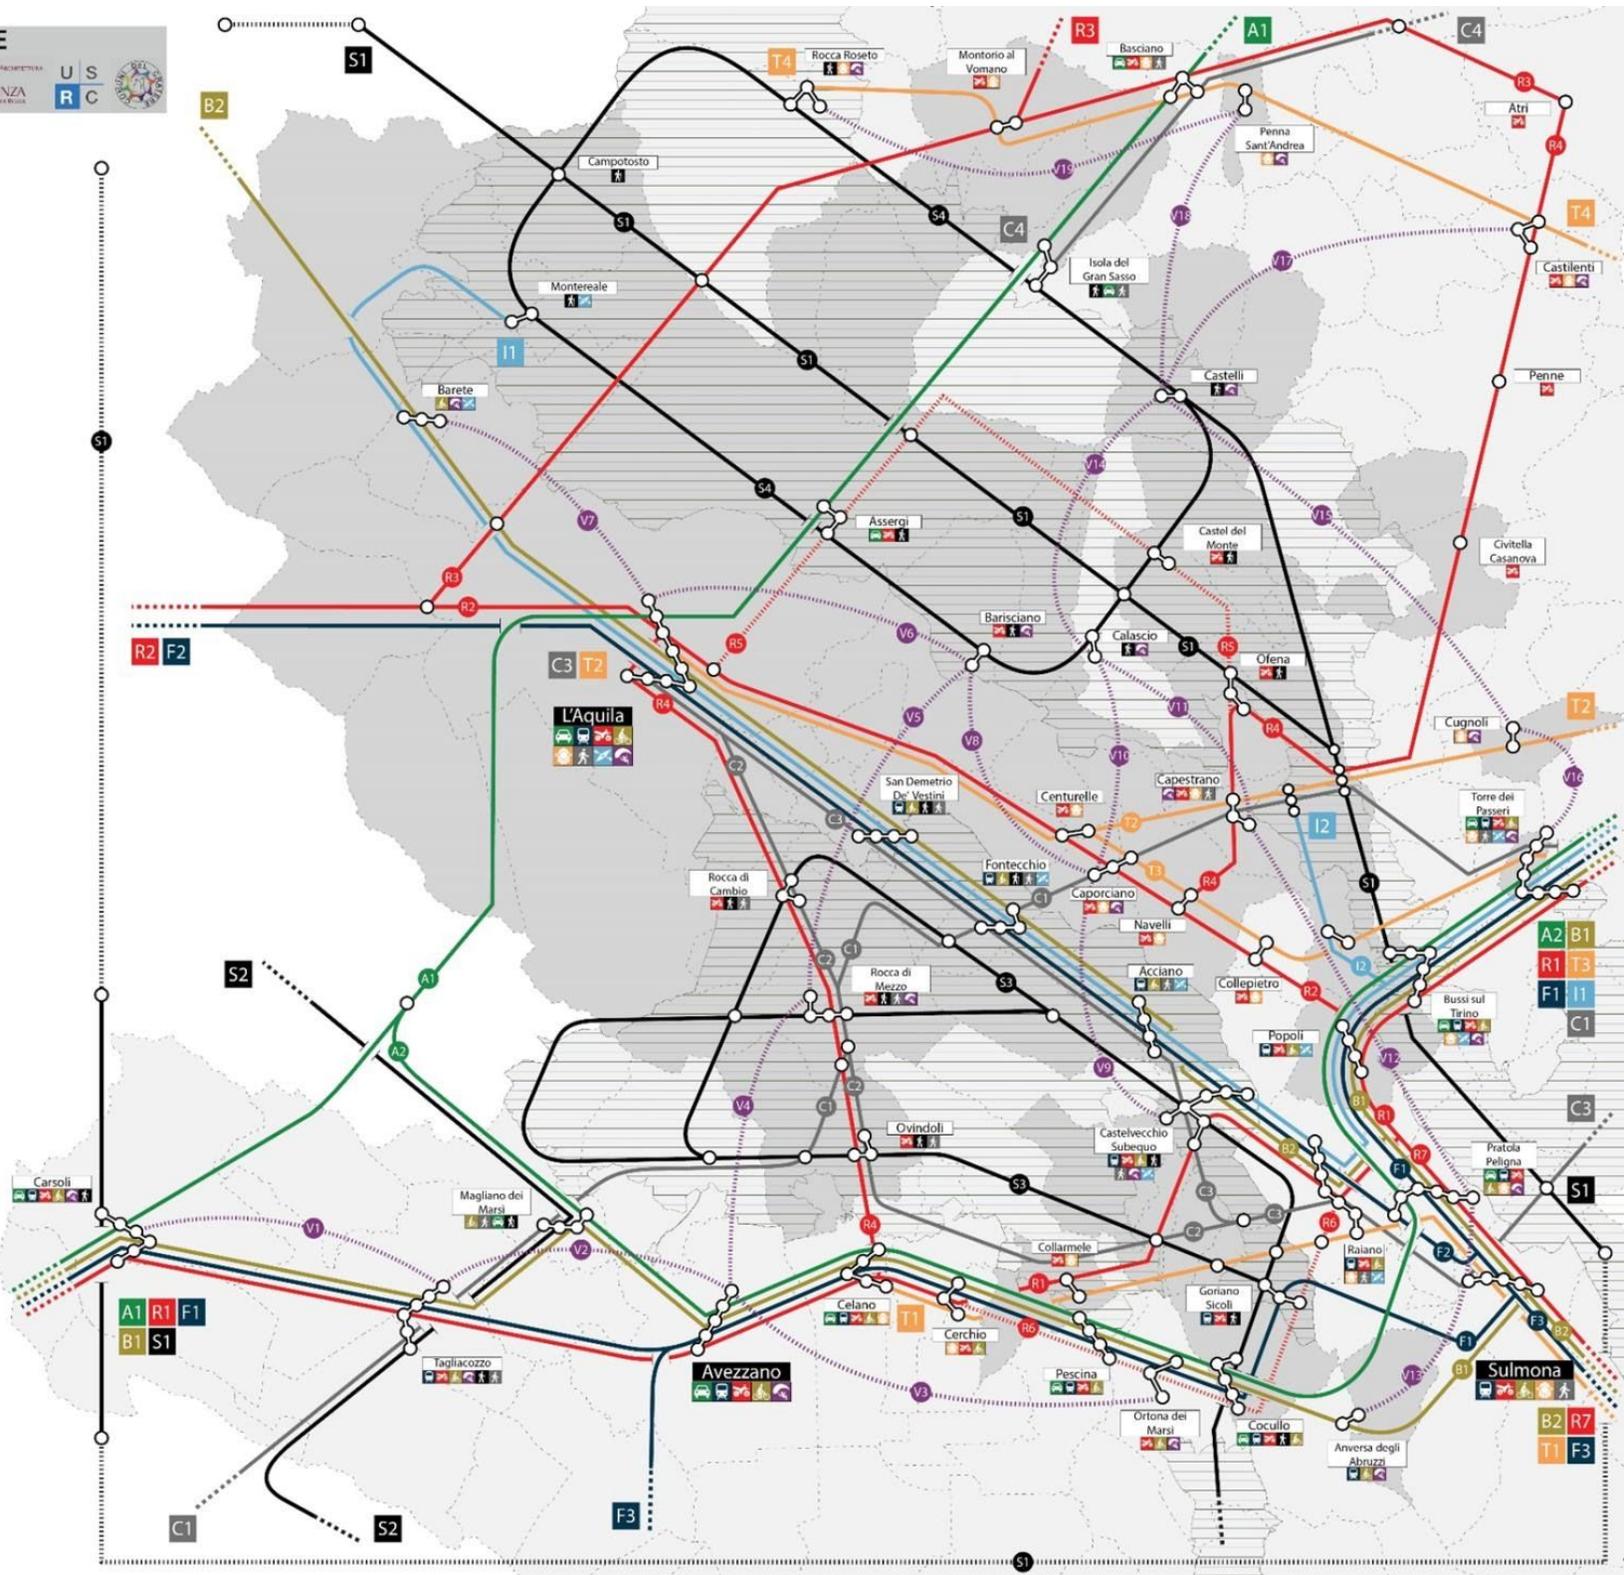

STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE: Visione guida.

## 8. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

L'USRC gestisce i movimenti contabili dalle previsioni di entrata/spesa alla registrazione contabile delle entrate ed uscite effettive, emettendo mandati di pagamento, registrando ordinativi di incasso ed ottemperando ai dettami della rendicontazione ex L. 1992, n. 225 e ss. mm.ii.

A far data dall'aprile 2013, sono stati eseguiti **n. 9809** mandati di pagamento per un totale **€ 1.282.527.716,27** (dato al **28/12/2020**).

Di questi, nel 2020 sono stati eseguiti **n° 1265** mandati di pagamento per complessivi **€ 198.347.512,94**.

Per il dettaglio si veda il sito <http://www.usrc.it/ammtrasparente.aspx>

Di seguito alcune delle principali attività di gestione fondi dell'USRC, oltre quelli della ricostruzione privata, OOPP, ed edilizia scolastica:

### A) SPESE OBBLIGATORIE

L'Area Amministrativo-Contabile dell'USRC esegue l'istruttoria delle rendicontazioni effettuate dai Comuni sul portale di interscambio AVEIANET dove gli stessi possono compilare le schede relative alle diverse tipologie di spesa (CAS, LOCAZIONE TEMPORANEA ALLOGGI, TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO, CONTRATTI DI LOCAZIONE) al fine di richiedere il trasferimento dei fondi.

Nel 2020 è stato trasferito per le spese obbligatorie (contributo di autonoma sistemazione, locazione temporanea di alloggi ad uso abitativo, trasloco e deposito temporaneo del mobilio), in favore dei Comuni del Cratere e Fuori Cratere un importo totale pari ad **€ 653.257,89** così suddiviso:

- **€ 174.780,65** per contributo di autonoma sistemazione;
- **€ 197.344,66** per contratti di locazione;
- **€ 281.132,58** per trasloco e deposito temporaneo del mobilio.

Di seguito il dettaglio per singolo comune e annualità:

TABELLA 1 – CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE

<b>IMPORTI EROGATI NELL'ANNO 2020</b>			
<b>SOGGETTO BENEFICIARIO</b>	<b>annualità 2017</b>	<b>annualità 2018</b>	<b>TOTALE</b>
COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA		€ 18.600,00	€ 18.600,00
COMUNE DI CELANO		€ 125.880,65	€ 125.880,65
COMUNE DI MONTEREALE	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 7.200,00
COMUNE DI ROCCA DI MEZZO		€ 11.700,00	€ 11.700,00
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI		€ 1.800,00	€ 1.800,00
COMUNE DI VITTORITO	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 9.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.400,00</b>	<b>€ 166.380,65</b>	<b>€ 174.780,65</b>

Si precisa che per le annualità 2019 e 2020 non è stato previsto il finanziamento del contributo di autonoma sistemazione. Considerato il perdurare delle esigenze di assistenza alla popolazione interessata dagli interventi di ricostruzione privata supportate dalla sussistenza di contratti di locazione, l'Ufficio Speciale ha rappresentato alla Struttura di Missione la necessità di destinare una quota dell'assegnazione, disposta dalla Delibera CIPE n.114/2017, per l'anno 2018 alla voce di spesa "Contributo di autonoma sistemazione", a copertura di maggiori esigenze finanziarie connesse alla misura "Contratti di locazione" annualità 2019. Detta esigenza è stata oggetto di informativa al CIPE da parte della Struttura di Missione che nella seduta del 29 settembre 2020 ha udito la proposta di rimodulazione delle risorse assegnate all'Ufficio Speciale con Delibera CIPE n.114/2017 (G.U.n.102 del 4 maggio 2018) ai sensi del punto 2.4 della stessa. Pertanto, in alternativa al riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (non finanziato dal CIPE per l'annualità 2019), i nuclei familiari che hanno diritto al godimento di misure di assistenza alla popolazione, possono richiedere il rimborso delle spese occorrenti per il pagamento dei suddetti contratti di locazione.

TABELLA 2- CONTRATTI DI LOCAZIONE (RIMODULAZIONE CIPE N.114/2017)

<b>IMPORTI EROGATI NELL'ANNO 2020</b>		
<b>SOGGETTO BENEFICIARIO</b>	<b>annualità 2019</b>	<b>TOTALE</b>
COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO	€ 26.300,00	€ 26.300,00

TABELLA 3 – LOCAZIONE TEMPORANEA ALLOGGI AD USO ABITATIVO

IMPORTI EROGATI NELL'ANNO 2020					
SOGGETTO BENEFICIARIO	annualità 2016	annualità 2017	annualità 2018	annualità 2019	TOTALE
COMUNE DI CANZANO	€ 3.200,00	€ 1.200,00			€ 4.400,00
COMUNE DI GAGLIANO ATERNO	€ 650,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.250,00	€ 11.700,00
COMUNE DI LUCOLI			€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 14.400,00
COMUNE DI MANOPPELLO			€ 912,00	€ 760,00	€ 1.672,00
COMUNE DI MONTEREALE			€ 3.733,33		€ 3.733,33
COMUNE DI OFENA			€ 1.946,00	€ 3.000,00	€ 4.946,00
COMUNE DI OVINDOLI			€ 16.743,33	€ 2.450,00	€ 19.193,33
COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO	€ 800,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00		€ 20.000,00
COMUNE DI ROCCA DI MEZZO			€ 28.400,00		€ 28.400,00
COMUNE DI SCOPPITO			€ 42.230,00	€ 20.370,00	€ 62.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.650,00</b>	<b>€ 14.700,00</b>	<b>€ 114.664,66</b>	<b>€ 37.030,00</b>	<b>€ 171.044,66</b>

TABELLA 4 – TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO

IMPORTI EROGATI NELL'ANNO 2020						
SOGGETTO BENEFICIARIO	annualità 2011	annualità 2012	annualità 2017	annualità 2018	annualità 2019	TOTALE
COMUNE DI ACCIANO					€ 2.343,40	€ 2.343,40
COMUNE DI BARISCIANO					€ 10.158,60	€ 10.158,60
COMUNE DI BISENTI	€ 960,00	€ 1.573,00				€ 2.533,00
COMUNE DI CALASCIO					€ 1.952,00	€ 1.952,00
COMUNE DI CAMPOTOSTO					€ 1.830,00	€ 1.830,00
COMUNE DI CAPESTRANO					€ 37.902,26	€ 37.902,26
COMUNE DI CAPITIGNANO					€ 439,20	€ 439,20
COMUNE DI CAPORCIANO					€ 3.000,00	€ 3.000,00
COMUNE DI FAGNANO ALTO				€ 4.709,20	€ 8.771,20	€ 13.480,40
COMUNE DI LUCOLI					€ 40.408,60	€ 40.408,60
COMUNE DI MONTEREALE				€ 3.172,00	€ 13.954,00	€ 17.126,00
COMUNE DI OFENA					€ 10.000,00	€ 10.000,00
COMUNE DI OVINDOLI				€ 549,00	€ 439,20	€ 988,20
COMUNE DI PIZZOLI					€ 8.198,66	€ 8.198,66
COMUNE DI POGGIO PICENZE					€ 1.427,40	€ 1.427,40
COMUNE DI POPOLI					€ 4.941,00	€ 4.941,00
COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA					€ 2.500,00	€ 2.500,00
COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO					€ 33.927,06	€ 33.927,06
COMUNE DI ROCCA DI MEZZO				€ 3.176,00	€ 32.808,99	€ 35.984,99
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI					€ 10.100,81	€ 10.100,81
COMUNE DI SANT'ELUSANIO FORCONESE				€ 2.316,00		€ 2.316,00
COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO				€ 1.366,40	€ 5.307,04	€ 6.673,44
COMUNE DI SCOPPITO					€ 12.151,20	€ 12.151,20
COMUNE DI SULMONA			€ 4.890,00	€ 2.600,00		€ 7.490,00
COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI					€ 13.260,36	€ 13.260,36
<b>TOTALE</b>	<b>€ 960,00</b>	<b>€ 1.573,00</b>	<b>€ 4.890,00</b>	<b>€ 17.888,60</b>	<b>€ 255.820,98</b>	<b>€ 281.132,58</b>

## B) CO.CO.CO.

Nel 2020 è stato trasferito dall'USRC ai comuni del cratere per le spese relative ai i co.co.co. € 1.360.255,37 ripartiti come segue:

- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2017	€ 104.400,00
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2018	€ 306.000,00
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2019	€ 787.999,37
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2020	€ 170.856,00

## C) VIDEOSORVEGLIANZA

Nel 2020 sono stati erogati fondi per il finanziamento del "Safe Community – Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico" per un importo complessivo pari ad € **243.807,65** come riportato in tabella:

<b>SOGGETTO BENEFICIARIO</b>	<b>Importo</b>
COMUNE DI BARETE	€ 31.993,28
COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO	€ 38.487,31
COMUNE DI CASTEL DI IERI	€ 32.000,00
COMUNE DI COCULLO	€ 31.956,19
COMUNE DI GORIANO SICOLI	€ 32.000,00
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	€ 7.783,05
COMUNE DI OFENA	€ 29.596,22
COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA	€ 32.000,00
COMUNE DI TORNIMPARTE	€ 7.991,60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 243.807,65</b>

## CREDITS

- Copertina [<https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/castelli-di-fondazione-dellaquila-fossa-il-baronato-del-gran-rifiuto.html>]
- pag.9 [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centro\\_storico\\_Navelli.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centro_storico_Navelli.jpg) - Sayatek, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons ]
- pag.11 [<https://www.fmdos.cl/noticias/santo-stefano-di-sessanio-pueblo-en-italia-ofrece-casi-10-mil-dolares-por-mudarte-alla/> ]
- pag.20 [[https://abruzzoturismo.it/sites/default/files/2020-09/800px-Corno\\_grande\\_e\\_Pietracamela%2C\\_Gran\\_Sasso%2C\\_Province\\_of\\_Teramo%2C\\_Abruzzo%2C\\_Italy\\_-\\_panoramio.jpg](https://abruzzoturismo.it/sites/default/files/2020-09/800px-Corno_grande_e_Pietracamela%2C_Gran_Sasso%2C_Province_of_Teramo%2C_Abruzzo%2C_Italy_-_panoramio.jpg) ]
- pag.29 [<https://plus.google.com/u/0/photos/106464908274500266961/albums/5827462851712378177/5827462855272517746> ]
- pag.55 [<https://i0.wp.com/www.abruzzo-segreto.it/wp-content/uploads/Veduta-aerea-Chiesa-di-Madonna-del-Campo-03.jpg?fit=1920%2C1280&ssl=1>]
- Tutte le illustrazioni [<https://www.freepik.com/pch-vector>]
