# Le attività USRC ad oggi

**Nota informativa - Fossa 22 LUGLIO 2014**

## Il modello di GOVERNANCE

è stato delineato dal D.L. 83/2012, conv. in Legge 134/2012 e dal successivo D.L. 43/2013, conv. in Legge 71/2013. Le suddette disposizioni, nel segnare la chiusura dello stato di emergenza alla data del 16 settembre 2012, stabiliscono l'avvio della fase di **GESTIONE ORDINARIA** con la seguente articolazione:

**D.I.S.E.T.** ➔ Coordinamento delle autorità centrali e di indirizzo e impulso verso Uffici Speciali

**U.S.R.C.** ➔ Coordinamento e supporto agli otto Uffici Territoriali per la ricostruzione; assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica promuovendone la qualità; monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi; garanzia degli standard informativi; controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori;




**U.T.R.** (Ufficio Territoriale della Ricostruzione) ➔ Cura l'istruttoria delle pratiche della ricostruzione privata dei comuni del cratere e degli altri comuni dell'Abruzzo con essi convenzionati.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

## Il modello Organizzativo




## Aree Omogenee

Comuni Capofila

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
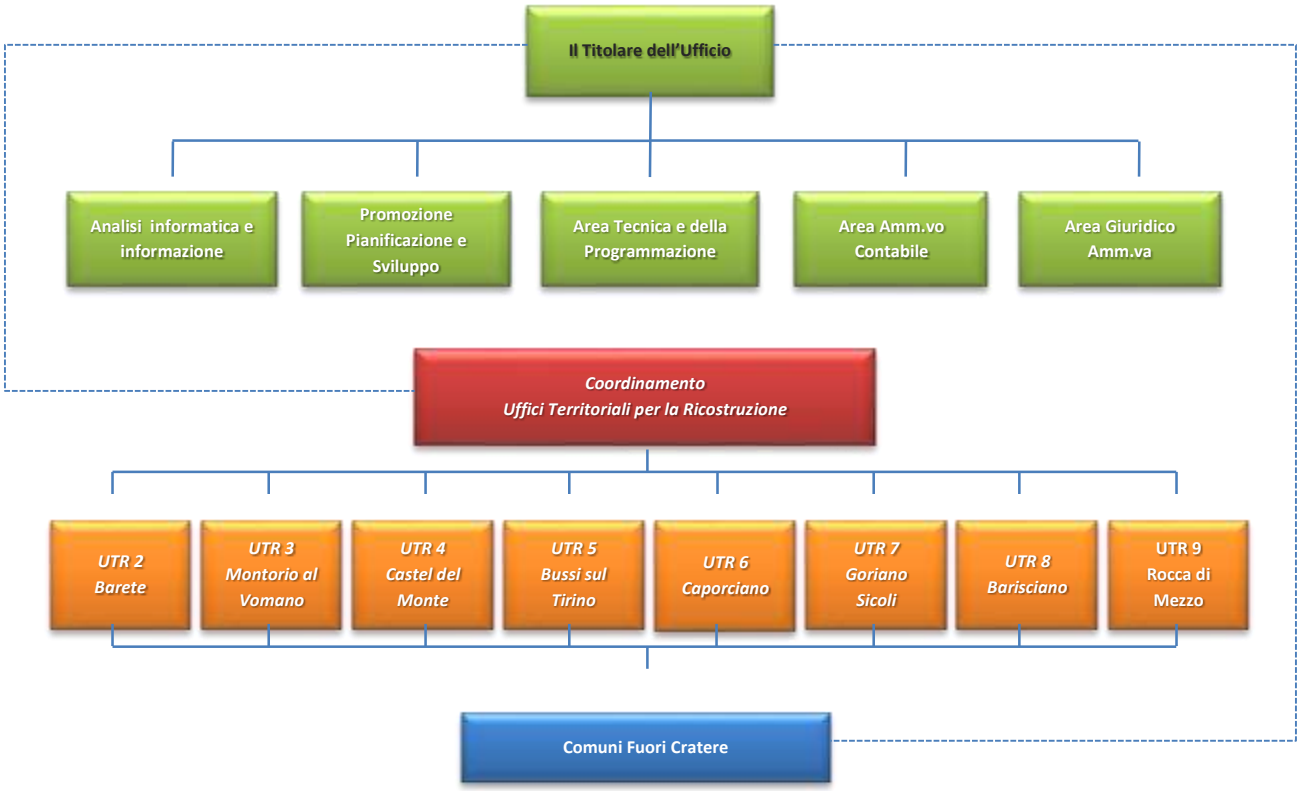
# LOCALIZZAZIONE UFFICI TERRITORIALI E CONTATTI

Le pratiche di **ricostruzione privata** sono **delegate** in via ordinaria agli **uffici territoriali (UTR)** costituiti tramite **convenzioni di comuni**. Gli UTR gestiscono le numerose attività comunali legate alla ricostruzione post-sisma del 6.4.2009 secondo il Decreto Commissario Delegato per la ricostruzione/Presidente Regione Abruzzo n.131 del 29.6.2012 "Costituzione degli otto uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art.3 dell'OPCM 4013/2012".

## UTR - Barete

Piazza Duomo, 1

Responsabile Dott.ssa Elisabetta Pace

email : elisabetta.pace@utr2.usrc.it

Area Omogenea 2

- Barete
- Cagnano Amiterno
- Campotosto
- Caprignano
- Montereale
- Pizzoli
- Scoppito
- Tornimparte

info@utr2.usrc.it-366.9627673

## UTR - Montorio al Vomano

via Luigi Bernardi Patrizi presso edificio Comunale "Palazzo Patrizi"

Responsabile (pro tempore) Geom. Ennio Cingoli

email : urbanistica@comune.montorio.te.it

Area Omogenea 3

- Castelli
- Colledara
- Fano Adriano
- Montorio al Vomano
- Penna Sant' Andrea
- Pietracamela
- Torricella

info@utr3.usrc.it-366.9627672

## UTR - Rocca di Mezzo

via delle Cese snc, Locali Ludoteca Comunale

Responsabile Ing. Raffaele Iacovitti

email : lavori.pubblici@comune.roccadimezzo.aq.it

Area Omogenea 9

- Lucoli
- Ovindoli
- Rocca di Cambio
- Rocca di Mezzo

info@utr9.usrc.it-366.9608381

## UTR - Castel del Monte

Via del Municipio

Responsabile Ing. Daniele Antonelli

email : daniele.antonelli@utr4.usrc.it

Area Omogenea 4

- Castel del Monte
- Santo Stefano di Sessanio
- Villa Santa Lucia degli Abruzzi

info@utr4.usrc.it-366.9614129

## UTR - Barisciano

Via Provinciale - presso fondazione Paideia

Responsabile Ing. Luciano Rossi

email : luciano.rossi@utr8.usrc.it

Area Omogenea 8

- Acciano
- Barisciano
- Fagnano Alto
- Fontecchio
- Fossa
- Ocre
- Poggio Picenze
- San Demetrio Ne' Vestini
- Sant' Eusanio Forconese
- Tione degli Abruzzi
- Villa Sant' Angelo

info@utr8.usrc.it-366.9627661

## UTR - Bussi sul Tirino

via Silvio Pellico

Responsabile Arch. Angelo Melchiorre

email : angelomelchiorre@libero.it

Area Omogenea 5

- Bussi sul Tirino
- Capestrano
- Civitella Casanova
- Cugnoli
- Montebello di Bertona
- Ofena
- Popoli
- Torre de' Passeri

info@utr5.usrc.it-366.9608375

## UTR - Caporciano

via Roma ,24

Responsabile Ing. Gianluca Caramanico

email : gianluca.caramanico@gmail.com

Area Omogenea 6

- Caporciano
- Carapelle Calvisio
- Castelvecchio Calvisio
- Navelli
- Prata D' Ansidonia
- San Pio delle Camere

info@utr6.usrc.it-366.9280591

## UTR - Goriano Sicoli

via Claudia Valeria snc

Coordinatore Sandro Ciacchi

email : s.ciacchi@libero.it

Area Omogenea 7

- Bugnara
- Castel di Ieri
- Castelvecchio Subequo
- Cocullo
- Collarmele
- Gagliano Aterno
- Goriano Sicoli

info@utr7.usrc.it-366.9608372

## 1. Piani di Ricostruzione

La **Legge n. 77 del 24 giugno 2009**, di conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, all' art.14, co.5-bis, ha previsto che la ricostruzione dei centri storici dei Comuni del cratere avvenga attraverso i Piani di Ricostruzione, i cui obiettivi, contenuti e procedura di approvazione sono definiti dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo n.3 del 9 marzo 2010.

La **Legge n. 134 del 7 agosto 2012**, nel disporre la chiusura dello stato d'emergenza in Abruzzo, all'art. 67-quinquies ha introdotto il termine del 10 dicembre 2012 per la predisposizione dei Piani di Ricostruzione ai sensi della L.77/2009. La suddetta legge ha attribuito natura strategica ai Piani e, se asseverati dalla Provincia, anche urbanistica.

L'intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, siglata il 9 agosto 2012, all'art.3, co.1, lettera f), ha previsto che USRC "effettua l'istruttoria dei piani di ricostruzione dei singoli Comuni delle otto aree omogenee negli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica".

Con il ritorno alla gestione ordinaria, anche la procedura di approvazione del piano di Ricostruzione si è modificata: l'**Intesa** tra Sindaco, Presidente della Provincia e Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, con cui veniva approvato il Piano sotto il profilo urbanistico ed economico-finanziario, con la chiusura dello stato di emergenza è stata sostituita dall'espressione di un **Nulla osta** da parte dell'Ufficio Speciale, che ne attesta la congruità economica, e dalla conclusione di un **Accordo di programma** con la Provincia, qualora il Piano abbia valenza urbanistica, costituendo variante allo strumento vigente.

Dei **55** Comuni del Cratere che si avvalgono del Piano di Ricostruzione, attualmente risultano:

- **34** Comuni con PdR pervenuto all'Intesa / Nulla Osta;
- **12** Comuni con PdR adottato;
- **9** Comuni con PdR predisposto e non ancora adottato.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

L'Ufficio Speciale ha espresso il Nulla Osta al Piano di Ricostruzione dei centri storici di Villa Sant'Angelo, Goriano Sicoli, Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Sant'Eusanio Forconese, Fossa, Acciano, Navelli, Castelvecchio Subequo, Castelvecchio Calvisio, Campotosto, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Castel di Ieri, Capitignano, Collarmele, Ocre, Penna Sant'Andrea, Fagnano Alto, Bugnara, Arsita e per la frazione di Castelnuovo del Comune di San Pio delle Camere. Per i comuni di Barete e Barisciano è stato siglato il Nulla Osta riferito agli ambiti non inclusi nelle Intese già sottoscritte con il Commissario delegato per la ricostruzione ed il Presidente della Provincia. L'espressione del Nulla Osta sui Piani, congiuntamente alla conclusione dell'Accordo di programma per il profilo urbanistico, permette ai Comuni di impegnare le risorse per la ricostruzione dei centri storici e consente il più celere compimento del processo di ricostruzione.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

| | |
|---|---|
| 2 | BARETE |
| | CAGNANO AMITERNO |
| | CAMPOTOSTO |
| | CAPITIGNANO |
| | MONTEREALE |
| | PIZZOLI |
| | SCOPPITO |
| | TORNIMPARTE |
| 3 | ARSITA |
| | CASTELLI |
| | COLLEDARA |
| | FANO ADRIANO |
| | MONTORIO AL VOMANO |
| | PENNA SANT'ANDREA |
| | PIETRACAMELA |
| | TOSSICIA |
| 4 | CASTEL DEL MONTE |
| | SANTO STEFANO DI SESSANIO |
| | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI |
| 5 | BRITTOLI |
| | BUSSI SUL TIRINO |
| | CAPESTRANO |
| | CIVITELLA CASANOVA |
| | CUGNOLI |
| | MONTEBELLO DI BERTONA |
| | OFENA |
| | POPOLI |
| | TORRE DE' PASSERI |
| 6 | CAPORCIANO |
| | NAVELLI |
| | PRATA D'ANSIDONIA |
| | SAN PIO DELLE CAMERE |
| | CASTELVECCHIO CALVISIO |
| | CARAPELLE CALVISIO |
| 7 | BUGNARA |
| | CASTEL DI IERI |
| | CASTELVECCHIO SUBEQUO |
| | COCULLO |
| | COLLARMELE |
| | GAGLIANO ATERNO |
| | GORIANO SICOLI |
| 8 | ACCIANO |
| | BARISCIANO |
| | FAGNANO ALTO |
| | FONTECCHIO |
| | FOSSA |
| | OCRE |
| | POGGIO PICENZE |
| | SAN DEMETRIO NE' VESTINI |
| | SANT'EUSANIO FORCONESE |
| | TIONE DEGLI ABRUZZI |
| | VILLA SANT'ANGELO |
| 9 | LUCOLI |
| | OVINDOLI |
| | ROCCA DI CAMBIO |
| | ROCCA DI MEZZO |



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it






**Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

## 2. Ricostruzione Pubblica

Il ritorno all'ordinario prevede che provengano dal territorio le scelte, gli indirizzi politici e la programmazione delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica. Infatti il tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee, composto dai rappresentanti dei comuni capofila delle otto aree in cui è suddiviso il cratere, di comune accordo e valutate priorità e necessità provenienti dal territorio, assumono le scelte circa la destinazione delle somme disponibili; l'USRC recepisce le volontà del Tavolo di Coordinamento, effettua il trasferimento delle somme e cura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi così come stabilito dal decreto del MEF del 20/10/2012.

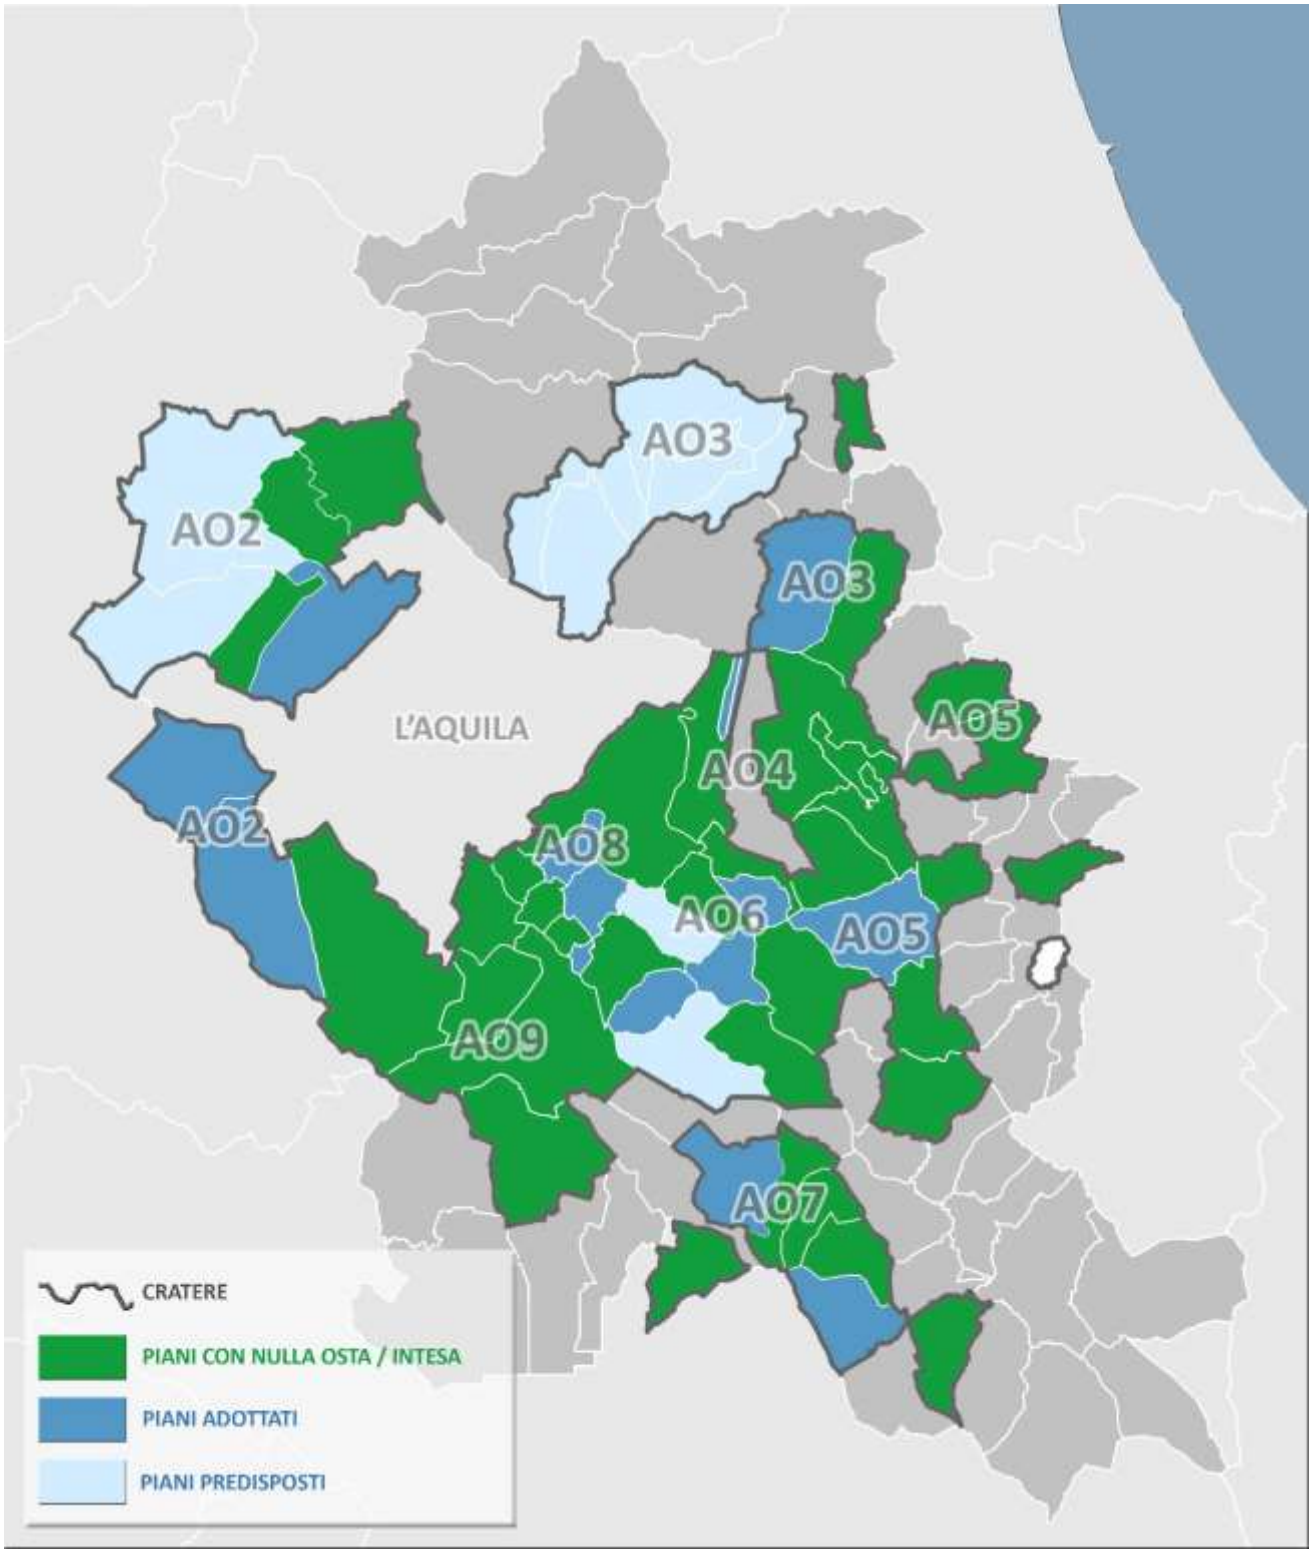L'attività svolta nel corso del 2013 dal Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee ha condotto alla complessiva definizione della **programmazione triennale della Ricostruzione Pubblica (2013 - 2015)** finanziata dalla delibera CIPE 135/2012; il documento riepilogativo, disponibile nella sezione dedicata del sito www.usrc.it all'indirizzo http://www.usrc.it/RicostruzionePub01.aspx, contiene gli interventi di competenza dei comuni del cratere, per un **importo complessivo di 126,45 milioni di euro (di cui 79 disponibili per cassa e trasferiti ai Comuni in base alle necessità) corrispondenti all'attuazione nel triennio di 150 progetti (*Case Comunali, Infrastrutture, Reti, Edilizia Residenziale Pubblica, Centri di Aggregazione*) per 75.2 milioni di euro e all'attuazione dei Piani di Ricostruzione e degli interventi di Ricostruzione Pubblica all'interno degli ambiti definiti dai PDR (51.3 milioni di euro per il ripristino di reti, servizi, infrastrutture e viabilità all'interno dei centri storici, nonché per la messa in sicurezza del sottosuolo interessato da cavità naturali e antropiche che inficiano la ricostruzione pubblica e privata).**



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it




Già con le sole risorse disponibili per cassa nei primi mesi del 2013 (pari a quasi 16 milioni di euro), erano state destinate dal Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee a interventi con carattere di priorità ed urgenza condivisi da tutto il territorio, nonché a garantire la copertura finanziaria alla redazione dei Piani di Ricostruzione dei comuni che ne erano ancora privi affinché tutti potessero avere uno strumento di programmazione della Ricostruzione Privata e Pubblica dei Centri Storici danneggiati. Infine, con l'intento di dare un segnale di ripresa a tutti i Comuni, sono stati finanziati 47 progetti di Ricostruzione Pubblica (uno per comune) per un importo complessivo di 4.7 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Riparazione e Ricostruzione deli immobili e delle infrastrutture di proprietà Pubblica danneggiati dal sisma del 06/04/2009, rispetto alla programmazione triennale che ammonta a complessivi 126.5 milioni di euro sul triennio 2013 – 2015, risulta:

- 75.2 milioni di euro per 150 interventi di cui:
  - **31 bandi avviati per 10.2 milioni di euro**
  - 54 interventi in fase di predisposizione della progettazione esecutiva per 27 milioni di euro
  - 65 interventi in fase di programmazione per 38 milioni di euro
- 51.3 milioni programmati per l'attuazione dei Piani di Ricostruzione e delle opere pubbliche di riparazione dei danni da sisma previste all'interno degli Ambiti dei PDR.

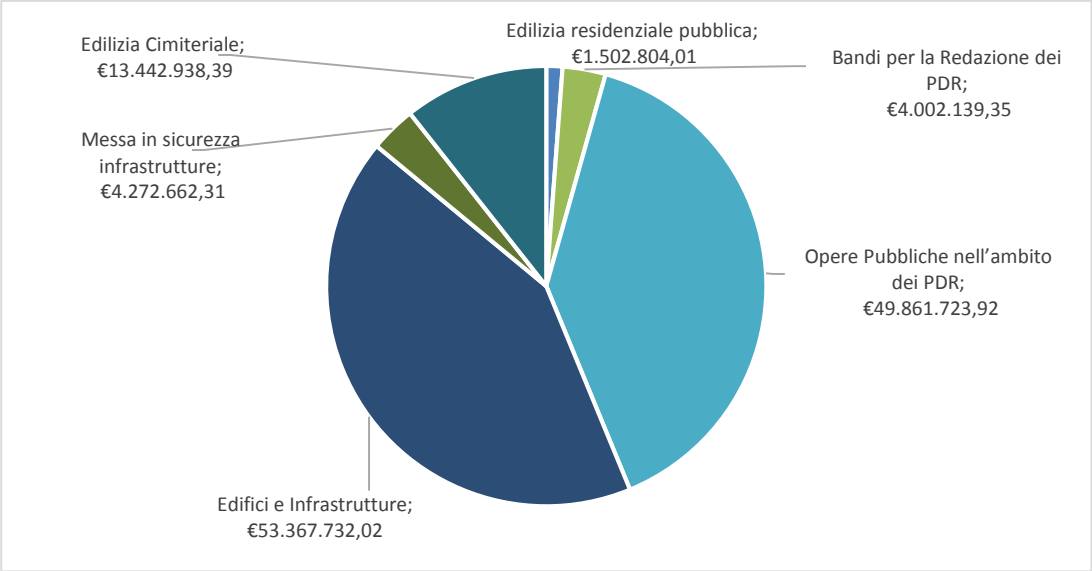

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

## 3. Privata-UTR

Il settore Ricostruzione privata dell'Area Tecnica e della Programmazione si occupa della gestione della ricostruzione dei comuni del cratere e sviluppa la sua attività su 3 temi principali: definizione del modello integrato del cratere per la ricostruzione dei centri storici, monitoraggio sull'andamento della ricostruzione privata, coordinamento degli UTR e programmazione delle risorse.

### DEFINIZIONE DEL MODELLO INTEGRATO DEL CRATERE PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI

Il Modello Integrato Cratere (MIC) è operativo dal 24/02/2014 e rappresenta il nuovo strumento di natura parametrica per la definizione del contributo per la ricostruzione privata nei centri storici dei comuni del cratere.

Il modello parametrico, frutto di un lavoro di costante condivisione e collaborazione con le amministrazioni e gli ordini professionali, è orientato al soddisfacimento dei seguenti obiettivi:

a) determinazione di un livello di contributo concedibile comprensivo delle opportune maggiorazioni per migliorare la sicurezza e superare le difficoltà di cantierizzazione;

b) ottimizzazione degli interventi finalizzata al raggiungimento del massimo livello di sicurezza, eliminando il vincolo del rispetto del limite di contributo per gli interventi di rinforzo strutturale (400-600 €/mq);

c) ripartizione delle somme destinate alle varie tipologie di intervento non più vincolata da tetti di spesa, bensì definita dal progettista nei limiti del contributo concedibile;

d) snellimento dell'iter istruttorio e facilitazione della predisposizione dei progetti da parte dei tecnici;

e) possibilità di incrementare il contributo fino ad un massimo del 60% in presenza di caratteristiche di pregio.

A seguito dell'entrata in vigore del MIC, il settore ricostruzione privata dell'USRC ha istituito una task force per fornire assistenza e formazione sia agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR) sia ai professionisti privati coinvolti nella ricostruzione. USRC e UTR stanno così portando avanti dei progetti pilota istruiti congiuntamente che hanno finora

mostrato un tempo di istruttoria medio, includendo i tempi di attesa delle integrazioni, di circa 30 gg. Infatti, le prime ammissioni a contributo si sono avute già a marzo 2014, ad un mese appena dall'introduzione del MIC. Da questi progetti pilota si evince una incidenza media delle maggiorazioni del 24%, di cui circa il 17% ascrivibili al pregio di cui all'intesa n. 2 dell'USRC tra il direttore Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo, il Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere e il Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, e il restante 7% a difficoltà di cantierizzazione, amplificazione locale e rimozione opere di messe in sicurezza.

A quattro mesi dalla sua introduzione, il MIC sembra aver ricevuto un pieno riconoscimento da parte del territorio, ad oggi risultano infatti inserite on-line 584 schede MIC che cubano 657 M€, di cui 204 già consegnate agli UTR per una richiesta totale di contributo di circa 262 M€. Anche sul lato pratiche ammesse i risultato sembrano positivi, con 19 M€ ammessi da marzo a giugno di cui oltre 12 M€ nel solo mese di giugno, con il risultato complessivo che ad oggi la metà dei contributi ammessi risultano richiesti con il modello parametrico.

Per quel che riguarda il risparmio di risorse pubbliche, al momento infatti le richieste tramite MIC risultano inferiori al limite imposto dal modello parametrico di oltre il 5%. Quel che si evince è, infatti, una predilezione netta per richieste più contenute a fronte di procedure di approvazione più snelle.

**MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA**

Il settore ricostruzione privata realizza il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata ex. art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, attraverso il quale oltre ad un controllo costante sull'andamento della ricostruzione, vengono definiti i fabbisogni economici futuri.

Il monitoraggio, realizzato interamente on-line con l'aggiornamento della Banca dati dell'Emergenza, è inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato in formato open data sul nostro sito www.usrc.it. Grazie ad un intensa attività di snellimento delle procedure di definizione del contributo, nei primi mesi dell'anno la capacità di concessione di contributi dei comuni del cratere è aumentata fino a quasi 50 milioni di euro al mese. Ad oggi sono stati impegnati complessivamente circa 520 milioni di euro a fronte dei 598 stanziati per la ricostruzione privata (di cui 500 finora trasferiti). Pertanto, 78 milioni non sono stati ancora impegnati da comuni che hanno ancora rimanenze residue, che impegneranno nelle prossime settimane; di contro, ci sono ad oggi



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

17 comuni che hanno già impegnato interamente i fondi a loro assegnati, e che hanno esigenze di copertura ulteriori per circa 57 milioni di euro.

Per quel che riguarda il monitoraggio dei lavori di ricostruzione, il settore ricostruzione privata raccoglie dai comuni e dagli UTR realizzando un aggiornamento continuo. La fotografia al 31 maggio 2014 riporta la seguente situazione:

- **823 cantieri aperti, di cui 236 all'interno dei centri storici e delle zone perimetrate;**
- **3.223 abitazioni tornate agibili** (escludendo i 9983 interventi realizzati su abitazioni con esito di agibilità A), **di cui 1.641 abitazioni principali e 1.582 seconde case**.

Sfruttando la tecnologia gis, i dati del monitoraggio della ricostruzione privata sono raccolti all'interno di una piattaforma web-gis pubblicata sul sito dell'USRC che consente di geolocalizzare on-line tutti gli interventi di ricostruzione privata. Al momento l'applicativo è disponibile per 9 comuni pilota, a breve sarà esteso all'intero cratere.

**COORDINAMENTO UTR**

L'attività di coordinamento degli otto UTR ha avuto inizio contestualmente alla loro istituzione e ad oggi continua ad essere una delle attività principali del settore ricostruzione privata dell'USRC. Tale attività di coordinamento è finalizzata alla omogeneizzazione della gestione delle pratiche da parte degli UTR e si sostanzia nelle seguenti attività:

- formazione on the job del personale UTR;
- supporto tecnico relativo ad aspetti procedurali non codificati che emergono durante la fase di istruttoria delle pratiche sisma;
- raccolta ed elaborazione FAQ;
- stesura schema di regolamento per il funzionamento degli UTR;
- stesura e predisposizione dei provvedimenti inerenti disposizioni procedurali da adottare nell'intero ambito dei comuni del cratere;
- istituzione commissione consultiva interna finalizzata alla predisposizione di pareri.

A giugno 2014 gli UTR hanno registrato la loro miglior performance mensile dall'inizio della loro attività. Questo risultato è spiegabile in parte dall'introduzione del MIC, in parte dall'affinamento delle procedure istruttorie e delle modalità operative degli UTR, e in parte dall'applicazione del modello di gestione per obiettivi introdotto dall'USRC e condiviso con gli UTR stessi.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO**

L'attività di coordinamento degli UTR consente di monitorare le richieste di contributi per la ricostruzione e in questo modo di definire il futuro fabbisogno di risorse per i singoli comuni del cratere. Ad oggi, risulta dagli UTR un fabbisogno di 537 milioni di euro, suddivisi come segue:

| UTR | Totale presentati | Progetti presentati in zona perimetrata | Progetti presentati fuori perimetrazione | TOTALE RICHIESTO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 216 | 104 | 112 | 46.291.632,64 |
| 3 | 127 | 0 | 127 | 9.956.554,81 |
| 4 | 55 | 18 | 37 | 9.159.293,64 |
| 5 | 659 | 317 | 342 | 156.206.187,06 |
| 6 | 73 | 32 | 41 | 65.779.615,39 |
| 7 | 54 | 17 | 37 | 4.951.458,95 |
| 8 | 324 | 177 | 147 | 181.155.459,84 |
| 9 | 117 | 63 | 54 | 64.281.958,81 |
| **TOT** | **1625** | **728** | **897** | **537.782.161,13** |

Aggiungendo alle pratiche depositate presso gli UTR i 128 milioni di euro depositati presso gli uffici tecnici dei comuni, attualmente i comuni del cratere esprimono per la ricostruzione privata un fabbisogno di 665 Milioni di euro, un importo destinato ad aumentare ulteriormente in base alle pratiche che verranno a breve presentate come previsto dalla programmazione dei piani di ricostruzione.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

## 4. Scuole

Nell'ambito delle competenze assegnate relativamente al Piano Scuole d'Abruzzo-il futuro in sicurezza, l'USRC sta procedendo ad avviare 146 interventi (3 del II stralcio+143 del III stralcio) per oltre 136 milioni di euro finalizzati a garantire idonee condizioni di sicurezza agli edifici scolastici danneggiati dal sisma collocati in tutta la Regione Abruzzo. Come definito nel Disciplinare di attuazione del Piano e nelle "Linee guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell'allegato al D.C.D. n. 89/2011", due documenti predisposti dall'USRC per fornire chiare indicazioni ai soggetti attuatori (Province e Comuni), gli interventi dovranno prevedere il massimo livello di sicurezza raggiungibile in relazione alle caratteristiche dei fabbricati e alle somme disponibili.




Dopo i primi mesi di attività dedicati alla definizione dei criteri e delle procedure da porre in essere per eseguire gli interventi, ad oggi le Amministrazioni stanno procedendo alla trasmissione dei progetti con ritmo crescente. Con un significativo impulso a partire dal maggio di quest'anno infatti -(come illustrato dal grafico a lato che indica in orizzontale i mesi del 2014 e in verticale l'ammontare delle somme)- sono stati approvati interventi per quasi 17 milioni di euro. Interventi immediatamente cantierabili per i quali le Amministrazioni stanno concludendo le procedure necessarie per l'affidamento dei lavori al fine di aprire i cantieri entro l'estate.

Gli interventi riguardano edifici che hanno mostrato un'elevata vulnerabilità sismica e consentiranno di raggiungere un idoneo livello di sicurezza; per quasi la metà di essi è prevista la sostituzione dei vecchi fabbricati con nuovi edifici scolastici, adeguati su tutti i profili agli standard richiesti dalle vigenti normative.

In basso si riporta lo stato di attuazione nel dettaglio distinto per i due stralci del Piano di competenza USRC:

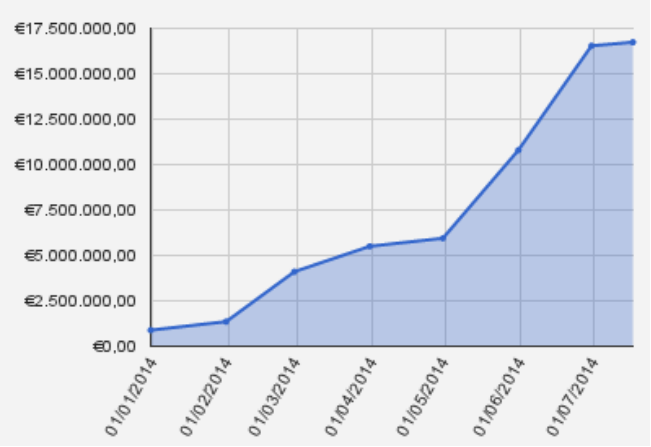

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

*Stato di attuazione-II stralcio*

| Fase | Totale interventi | Totale assegnato | Trasferimenti |
|---|---|---|---|
| PROGRAMMAZIONE | 2 | € 160.000,00 | 0 |
| PROGETTAZIONE | 0 | € 0,00 | 0 |
| LAVORI IN CORSO | 2 | € 8.116.696,74 | € 5.452.718,97 |
| INTERVENTI CONCLUSI | 8 | € 40.452.757,24 | € 32.300.851,60 |
| | 12 | € 48.729.453,98 | € 37.753.570,57 |

*Stato di attuazione-III stralcio*

| Fase attuazione | Totale interventi | Totale assegnato | Trasferimenti |
|---|---|---|---|
| PROGRAMMAZIONE | 76 | € 53.199.309,98 | 0 |
| PROGETTAZIONE | 48 | € 63.189.348,36 | 0 |
| LAVORI IN CORSO | 16 | € 17.591.557,74 | € 4.039.405,77 |
| INTERVENTI CONCLUSI | 3 | € 780.000,00 | € 745.244,13 |
| | 143 | € 134.760.216,08 | € 4.784.649,90 |

L'ufficio sta vagliando inoltre le richieste pervenute dalle Amministrazioni per la copertura economica delle spese necessarie alla sistemazione provvisoria degli studenti (mdiante affitto di strutture alternative, adeguamento di locali di proprietà dell'amministrazione, affitto di moduli prefabbricati…), necessaria a garantire la continuità didattica durante l'esecuzione degli interventi. Nei prossimi mesi verranno definiti i criteri di ripartizione delle somme disponibili.

Dopo la pubblicazione del nuovo sito web dell'USRC, nell'area funzionale "Scuole d'Abruzzo", sono disponibili informazioni aggiornate sugli interventi approvati, la descrizione degli edifici e degli interventi progettati, le foto, i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, i fondi trasferiti alle Amministrazioni e quelli liquidati da quest'ultime ai beneficiari.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

## 5. Pagamenti

L'area Amministrativo Contabile dell'USRC si è costituita l'8 aprile 2013 e, in seguito al passaggio di consegne con il DISET avvenuto il 16 aprile 2013, ha immediatamente iniziato la sua attività di gestione dei trasferimenti e delle rendicontazioni eseguendo i primi mandati di pagamento il 24 aprile 2013.

Alla data attuale sono stati eseguiti **n. 1141** mandati di pagamento per un totale di ***€. 79.766.608,88**. Tali mandati si riferiscono in parte a pratiche già istruite dal DISET in seno alla gestione stralcio ed in parte a pratiche istruite ex-novo dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione.

Per il dettaglio si veda il sito http://www.usrc.it/ammtrasparente.aspx

## 6. Macerie

a. Macerie Rimosse 11.207,26 ton.
b. Macerie rimosse Comune Campotosto = 1.892,69 ton.
c. Macerie rimosse Comune San Pio delle Camere (fraz. Castelnuovo) = 9.314,57
d. Spese effettuata circa 515.533,96 €

## 7. Espropri

Ai sensi dell'art. 1 dell'accordo del 18 gennaio 2013, è stato convenuto di "Demandare ai Titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza, in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività, nei termini previsti dalla delibera CIPE del 21.12.2012".

Il servizio Centralizzato Espropri ha iniziato ad operare alla data del 3 giugno 2013.

E' stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra gli Uffici Speciali e l'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento di attività tecnico-estimative.

Ad oggi le istruttorie in corso sono 277, le particelle in lavorazione 682 , le istruttorie concluse 110 e le particelle stimate dall'Agenzia delle Entrate 1000.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

Nel 2013 sono stati impegnati 4.852.461,13 euro, da gennaio a luglio 2014 sono stati impegnati € 2.638.233,54, la previsione di spesa per gli anni 2014-2016 è pari a 19.252.461,13.

## 8. Comuni "Fuori Cratere"

Il D.L. 43 del 29/04/2013 assegna a USRC le competenze circa il trasferimento delle somme per la Ricostruzione post sisma dei "Comuni Fuori Cratere" ovvero comuni non ricadenti nel cratere sismico, ma che comunque hanno riportato danni aventi nesso di causalità con il sisma del 6 aprile 2009. Le attuali risorse per Ricostruzione Pubblica e Privata stanziati dalla delibera CIPE 135/2012, ammontano a 55 milioni di euro per tre anni (2013 - 2015) ai quali si sommano le annualità della delibera CIPE 50/2013 (solo edilizia privata) pari 5,62 milioni l'anno dal 2014 al 2019, a fronte di fabbisogni comprovati da decreti di contributo emessi pari a 80 milioni di euro. Il metodo di ripartizione delle risorse presuppone che le scelte provengano sempre dal territorio, ovvero da Sindaci e Amministratori locali, i quali, valutate le risorse, le criticità e le particolari condizioni di urgenza e priorità di oltre 90 comuni sulle quattro province abruzzesi, concordano circa la ripartizione delle risorse disponibili. L'USRC recepisce gli indirizzi e la programmazione, cura il trasferimento dei fondi e ne effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo quanto disposto dal decreto del MEF del 29/10/2012.

Nel corso del 2013 sono stati trasferiti 30 milioni (Competenza 2013 della CIPE 135/2012) in quota proporzionale ai decreti di ammissione a contributo emessi e certificati dai comuni "Fuori Cratere" al 31/03/2013 oltre a circa 2 milioni di euro relativi a economie di precedenti delibere CIPE e comunque già finalizzati all'edilizia privata "fuori cratere".

Le ulteriori risorse di cassa del 2013 (10 milioni di euro) sono state ripartite nel corso dell'incontro del 11/03/2014 da parte della rappresentanza dei Comuni "Fuori Cratere" insieme a circa 1.6 milioni di euro che sono stati destinati a sanare situazioni con carattere di priorità.

Le competenze della CIPE 135/2012 del 2014 (10 milioni) e del 2015 (5 milioni) sono state destinate in quota parte e prioritariamente ad alcuni Comuni (*San Benedetto in Perillis, Collepietro, Calascio*) che presentano un livello di danno elevato e diffuso e che, nella prima fase non hanno potuto beneficiare di trasferimenti, ferma restando la verifica nel corso del



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

monitoraggio di pratiche positivamente istruite da finanziare. Complessivamente i comuni "Fuori Cratere" devono decidere sulla ripartizione programmatica di circa 26 milioni di cui 15 derivanti dalla delibera CIPE 135/2012 e 11,2 dalla delibera CIPE 50/2013.

Dal mese di Gennaio 2014 a Giugno 2014, con il fine di uniformare il processo di istruttoria delle istanze di ammissione a finanziamento nei Comuni "Fuori Cratere" è stato promosso il processo di adesione dei Comuni agli UTR di frontiera, passando dalle 28 adesioni del 2013 alle attuali 43 nelle province di L'Aquila (ambito Marsica e Valle Peligna), Pescara e Chieti. Non sono state stipulate convenzioni tra l'UTR di Montorio al Vomano (TE) e i comuni "Fuori Cratere" della Provincia di Teramo. Questo processo ha portato all'interno degli UTR, n°**631** pratiche precedentemente depositate presso gli Uffici Tecnici Comunali per un importo complessivamente richiesto di **122 milioni di euro**.

Al 30/06/2014 risultano positivamente istruite e restituite ai comuni titolari dei procedimenti, n°**32** pratiche per **11 milioni di euro**: l'istruttoria delle pratiche avviene secondo le modalità disciplinate dalle OPCM emanate nell'immediato dopo sisma e non con il modello parametrico introdotto dal DPCM del 07/02/2013 valido solo per L'Aquila e per i Comuni del Cratere.

L'USRC ha provveduto ad implementare una procedura di monitoraggio degli interventi di ricostruzione privata post-sisma, basata su piattaforma web, sia per ottemperare agli obblighi previsti dal decreto del MEF del 29/10/2012 (monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione) sia per provvedere all'assegnazione della competenza (copertura finanziaria degli interventi) da attribuire ai singoli comuni sulla base dei criteri di ripartizione che provengono dalla rappresentanza dei Comuni "Fuori Cratere".

Le risorse "programmatiche" disponibili e da assegnare ai comuni "Fuori Cratere" ammontano ad oggi a complessivi 26 milioni di euro di cui:

- 10 milioni da CIPE 135/2012 annualità 2014
- 5 milioni da CIPE 135/2012 annualità 2015 (possibilità di impegno sin dal 2014, autorizzata con CIPE 01/2014 registrata in Corte dei Conti il 25/06/2014)
- 5.62 milioni da CIPE 50/2013 annualità 2014 (autorizzato impegno con CIPE 01/2014 registrata in Corte dei Conti il 25/06/2014)
- 5.62 milioni da CIPE 50/2013 annualità 2015 (possibilità di impegno sin dal 2014, autorizzata con CIPE 01/2014 registrata in Corte dei Conti il 25/06/2014)

Le priorità nella ripartizione delle risorse, già indicate nel mese di marzo 2014, verranno confermate in prossimi incontri anche alla luce dei dati del monitoraggio bimestrale di cui

al decreto del MEF del 29/10/2012. Ulteriori risorse quantificabili in circa 32 milioni di euro verranno rese disponibili da una prossima seduta del Comitato CIPE.



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**
**P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)**
**info@usrc.it**
