USRC

Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Le attività U.S.R.C. ad oggi

Nota informativa

Anno 2019

20 GENNAIO 2020

Sommario

1 GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE 3
2 PIANI DI RICOSTRUZIONE 6
3 RICOSTRUZIONE PRIVATA CRATERE 8
3.1 STATO DI AVANZAMENTO 8
3.2 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 13
3.2.1 MODELLO INTEGRATO DEL CRATERE 17
3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI 19
3.4 GESTIONE FONDI 21
3.5 TRASPARENZA 24
3.6 TRASPARENZA – CONTRATTI 25
4 RICOSTRUZIONE PRIVATA "FUORI CRATERE" 26
5 RICOSTRUZIONE PUBBLICA 34
6 EDILIZIA SCOLASTICA 39
7 SVILUPPO DEL TERRITORIO 44
8 GESTIONE DELLA CONTABILITA' SPECIALE 46

1 GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE

La Legge 7 agosto 2012, n.134 (cosiddetta "Legge Barca"), artt. 67-bis e 67-ter, ha disposto la cessazione al 31 agosto 2012 dello stato di emergenza successivo al sisma del 6 aprile 2009 ed ha istituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, **USRC**), con sede a Fossa (AQ), per le finalità attinenti la gestione ordinaria della ricostruzione, sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, nei territori dei Comuni del Cratere, ad esclusione di L'Aquila, e dei Comuni fuori Cratere (cfr. L.125/2015, art.11, co.13).

L'Intesa[1] dell'agosto 2012, ha disciplinato gli aspetti organizzativi dell'Ufficio, prevedendo per esso una dotazione di risorse umane di 50 unità ad esso assegnate, di cui 25 a tempo determinato (art. 67-ter, co. 3, L. n.134/2012), dipendenti del Comune di Fossa, e 25 a tempo indeterminato (art. 67-ter, co. 6, L. n.134/2012), dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Legge 7 agosto 2012, n.134, ha assegnato all'USRC, tra l'altro, il coordinamento degli otto Uffici territoriali per la ricostruzione (di seguito, UTR), costituiti ai sensi dell'OPCM n.4013 del 2012 dai Comuni di ciascuna Area Omogenea per l'esame delle richieste di contributo degli immobili privati, per i quali la L. n. 134/2012 ha previsto una dotazione di risorse umane complessivamente pari a 72 unità di personale a tempo indeterminato (art. 67-ter, co. 5, L. n. 134/2012), dipendenti dei Comuni del Cratere.

Dal 1º luglio 2018 gli UTR sono stati soppressi e le relative competenze sono state trasferite all'USRC (co.32, art.2-bis, L. n.172/2017). Da allora, il Titolare dell'USRC ha in capo la direzione ed il coordinamento esclusivi del personale in servizio presso gli UTR, assegnato anch'esso all'USRC (co.3, art.22, L.55/2019), nonché la gestione del processo di soppressione di detti Uffici attraverso specifici provvedimenti organizzativi e gestionali. In una prima fase del processo sono stati costituiti, tramite convenzioni con i Comuni, 8 Sportelli Decentrati dell'USRC (di seguito, SP) presso le medesime sedi dei soppressi UTR, incaricati - nelle more della riorganizzazione prevista per legge - dei medesimi compiti degli Uffici territoriali soppressi.

Più di recente, nel corso dell'anno 2019, la riorganizzazione ha avuto maggiore impulso con la definitiva soppressione di 3 degli 8 Sportelli Decentrati (SP n. 2 con sede in Barete (AQ), SP n. 4 con sede in Castel del Monte (AQ), e SP n. 6 con sede in Caporciano(AQ)) ed il trasferimento del relativo personale presso la sede dell'USRC a Fossa (AQ). Contestualmente alla riorganizzazione logistica, nell'anno 2019 è stato posto in essere anche l'accentramento delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, la cui gestione è transitata dai soppressi UTR all'USRC.

[1] Intesa sottoscritta ai sensi dell' art. 67-ter della Legge 7 agosto 2012, n.134.

In esito all'evoluzione normativa sopra descritta, l'USRC, oltre al coordinamento del processo di ricostruzione privata, condotto sin dall'avvio dell'Ufficio nel 2013, ha oggi in capo direttamente anche l'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, attualmente effettuata nella sede centrale di Fossa e nei 5 Sportelli Decentrati nelle Aree omogenee del Cratere.

La competenza per l'istruttoria dei contributi alla ricostruzione privata va ad aggiungersi alle altre competenze assegnate all'Ufficio sin dalla sua istituzione. L'USRC, infatti, cura la programmazione ed istruttoria tecnica degli interventi di ricostruzione pubblica e del Piano "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza", cura l'attuazione dei Piani di Ricostruzione (dei quali ha effettuato l'istruttoria nel profilo di congruità economica), cura l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, gestisce la contabilità speciale, effettua il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, cura la trasmissione periodica dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, effettua la gestione delle assegnazioni e dei trasferimenti dei fondi per la ricostruzione privata, promuove l'attrattività e lo sviluppo economico e sociale del territorio del cratere.

USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere			
AVVIO DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO	8 aprile 2013		
RISORSE UMANE	**72** unità di personale attualmente in servizio su complessive **122 previste** (25 MIT; 25 Tempi determinati comune di Fossa; 72 Tempi indeterminati comuni capofila già sedi UTR), di cui: • **42** in servizio presso la sede centrale dell'USRC • **27** in servizio presso le sedi degli Sportelli Decentrati dell'USRC • **3** in servizio presso il comune di Barete		
SEDE USRC	FOSSA (AQ), Villaggio San Lorenzo, Piazza Gemona, 1		
SEDI SPORTELLI DECENTRATI USRC	*AREA OMOGENEA (AO) N.*	*COMUNE CAPOFILA AO*	*COMUNE SEDE SP*
SP 3	3	COLLEDARA	MONTORIO AL VOMANO
SP 5	5	CUGNOLI	BUSSI SUL TIRINO
SP 7	7	GORIANO SICOLI	GORIANO SICOLI
SP 8	8	BARISCIANO	BARISCIANO
SP 9	9	ROCCA DI MEZZO	ROCCA DI MEZZO

L'USRC è inoltre competente anche sui Comuni fuori Cratere (cfr. L. 71/2013, art.7, co.6; L.125/2015, art.11, co.13) per ciò che attiene la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata ed i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione.

In particolare, ai sensi della Delibera CIPE n. 1/2014, al fine di garantire uniformità nei processi tecnici ed amministrativi per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata, anche i Comuni fuori Cratere sismico, per l'istruttoria delle richieste di contributo, si avvalgono degli UTR. A seguito delle modifiche introdotte dalla L. L.172/2017, a far data dal 1º luglio 2018 anche tale competenza è in capo all'USRC.

2 PIANI DI RICOSTRUZIONE

La Legge n. 77 del 24 giugno 2009, di conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, all' art.14, co.5-bis, ha previsto che la ricostruzione dei centri storici dei Comuni del cratere avvenga previa predisposizione dei Piani di Ricostruzione, i cui obiettivi, contenuti e procedura di approvazione sono definiti dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo n.3 del 9 marzo 2010.

Dei **56 Comuni del Cratere, 55** Comuni hanno predisposto il PdR e sono pervenuti alla conclusione dell'iter di approvazione. Di questi:

- **11 Comuni** hanno raggiunto l'Intesa sul PdR tra Sindaco, Presidente della Provincia e Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, nel corso dello stato di emergenza;
- **44 Comuni** (2 dei quali, Barete e Barisciano, con riferimento agli Ambiti non oggetto di Intesa nella fase emergenziale) hanno ottenuto l'attestazione della congruità economica del PdR con Nulla osta dell'USRC, nella gestione ordinaria.

L'USRC ha stimato le risorse residue occorrenti per la ricostruzione del centro storico di **1 Comune**, Torre de' Passeri, unico nel Cratere a non aver predisposto il PdR, non avendo raggiunto nel corso dello stato di emergenza l'Intesa sulla Perimetrazione del centro storico (art.3, DCD 3/2010).

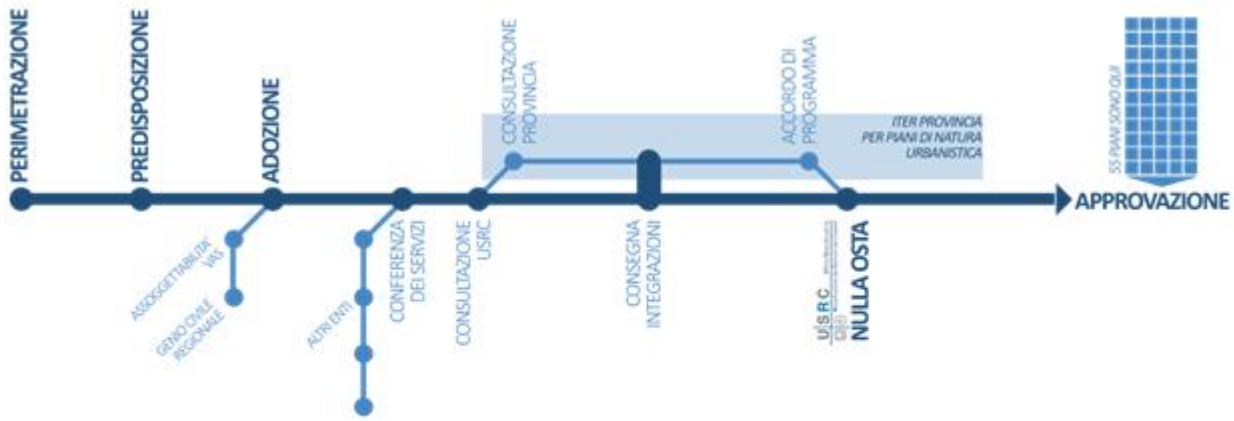

Dei **55 Comuni** del Cratere che si avvalgono del Piano di Ricostruzione:
- ✓ 11 Comuni con PdR pervenuto all'**Intesa**, recepita da USRC;
- ✓ 2 Comuni (Barete e Barisciano) con **Intesa** relativa ad alcuni degli Ambiti di PdR e **Nulla Osta** relativo ai restanti Ambiti di PdR non inclusi nell'Intesa;
- ✓ 42 Comuni con PdR pervenuto al **Nulla Osta** di USRC.

→ 55 INTESA/NULLA OSTA

La **Legge n. 134 del 7 agosto 2012**, all'art. 67-quinquies, ha attribuito al Piano di Ricostruzione **natura strategica** - come tale, è finalizzato a quantificare le esigenze finanziarie per la ricostruzione e a disciplinare

le modalità di attuazione ed il cronoprogramma degli interventi di ricostruzione del centro storico – ovvero, se asseverato dalla Provincia, anche **urbanistica**, qualora abbia contenuti urbanistici che aggiornano, modificano, integrano o sostituiscono gli strumenti di pianificazione vigenti.

Dei Piani di ricostruzione approvati dai **55 Comuni del Cratere**, **8** hanno **natura strategica**, mentre **47** hanno natura anche **urbanistica**.

A conclusione del processo di pianificazione, il quadro programmatico delle risorse necessarie per la ricostruzione dei centri storici dei 56 Comuni del Cratere ammonta a complessivi **3,4 Mld €**, di cui **3,1 Mld €** per interventi di **ricostruzione privata** e **0,3 Mld €** per interventi di **ricostruzione pubblica**.

3 RICOSTRUZIONE PRIVATA CRATERE

3.1 STATO DI AVANZAMENTO

Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere è stimato un fabbisogno finanziario complessivo pari a **5 Mld €**, così articolati:

- ✓ **3,1 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati negli Ambiti dei Piani di Ricostruzione;
- ✓ **1,0 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati nei centri storici, ma esterni agli Ambiti dei Piani di Ricostruzione;
- ✓ **0,4 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati fuori dai centri storici (periferie);
- ✓ **0,5 Mld €** necessari alla copertura dei maggiori costi dovuti all'aggravamento del danno causato dal sisma 2016, a valere sulle risorse della contabilità del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Centro Italia (art.4, D.L. 189/2016).

Dal 2009 ad oggi, nei 56 Comuni del Cratere, risultano concessi (con decreto comunale) e ammessi (con istruttoria positiva e in attesa decreto) contributi per un importo complessivo pari a 1,8 Mld € (dato periferia + centro storico). Il precedente valore arriva a **1,7 Mld €** se non vengono considerati gli importi corrispondenti agli esiti di agibilità A. Tale valore, **1,7 mld €**, corrisponde al **34%** del fabbisogno finanziario previsto, distribuiti nel tempo come da grafico che segue (**dato al 31/12/2019**).

La concessione di contributi, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al **31/12/2019**, segnala un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di **1.606 milioni di euro** (1.812 M€ includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Nel solo anno 2019, l'importo di contributi concessi e ammessi (in via di concessione) è pari a **222 milioni di euro.**

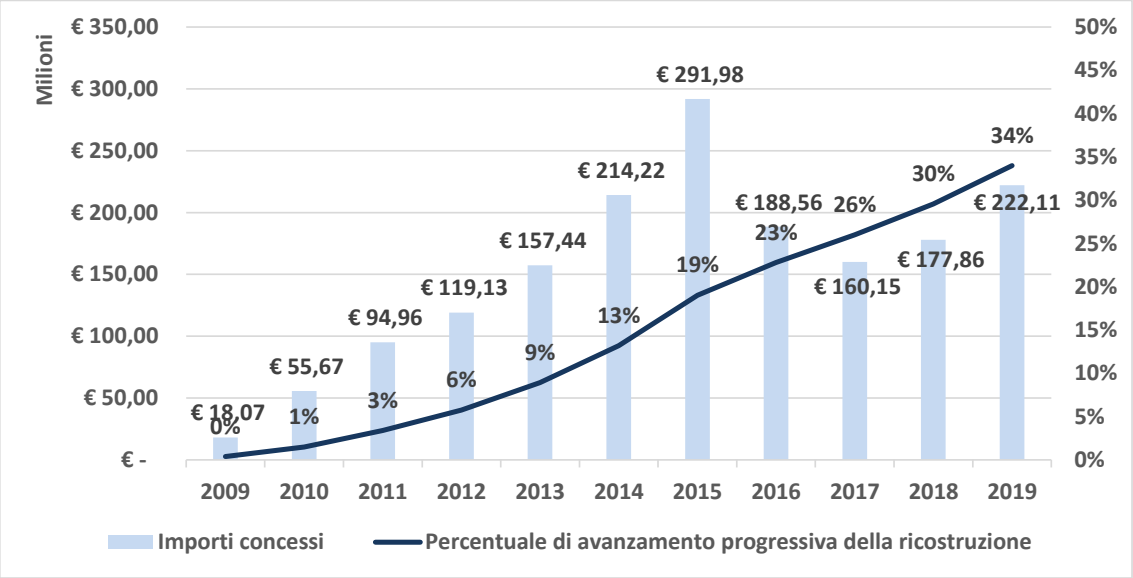

Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere

Il dato è significativo se rapportato alle precedenti annualità, essendo il secondo miglior risultato finora raggiunto, dove il massimo è stato raggiunto quando non era ancora avviata l'attività di verifica dei SAL da parte dello stesso personale incaricato delle istruttorie delle richieste di contributo.

Occorre tuttavia rapportare il dato medio del cratere con le specificità della singola Area omogenea. Nel dettaglio, per le Aree omogenee nn. 2 e 3 l'indice di avanzamento della ricostruzione privata è, ad oggi, pari al 15% del fabbisogno previsto, come rilevato nel prossimo diagramma, in primis perché tali aree sono state interessate anche dal sisma del 2016 e dalle problematiche legate alla sovrapposizione del danno tra i 2 sismi (12 Comuni del Cratere sisma 2009, situati nelle AO n.2 e n.3, appartengono anche al Cratere sisma 2016); in particolar modo per l'area omogenea 2 si è aggiunta la radicale trasformazione con la chiusura dello sportello, fortemente voluta da parte dei sindaci dell'Area Omogenea e resasi indispensabile poi con l'uscita di parte del personale dello stesso sportello.

Per far fronte agli specifici problemi delle Aree 2 e 3 e ridurre il gap rispetto alle altre Aree Omogenee si adotteranno misure eccezionali nel 2020.

Nelle altre Aree omogenee del Cratere, l'indice di avanzamento della ricostruzione privata è invece significativamente superiore della media dell'intero cratere, attestandosi al 44%. Si vedano, a riguardo, i grafici sotto riportati.

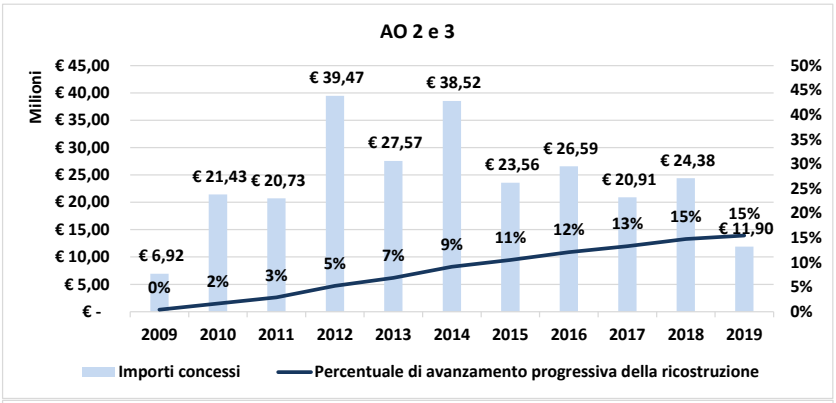

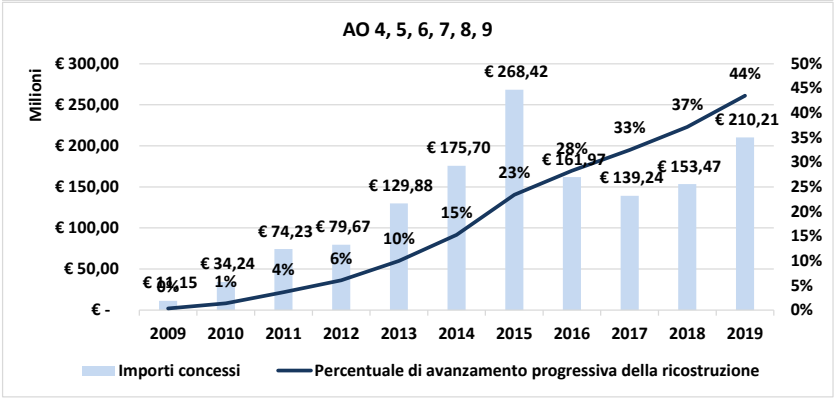

Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere. Specifica per AO.

In realtà, laddove si rappresentano i dati di avanzamento per singola Area Omogenea o per singolo comune, si riesce a comprendere quanto parlare di avanzamento complessivo della ricostruzione privata del cratere sia poco rappresentativo del fatto che nei piccoli comuni lo stato della ricostruzione privata è fortemente variabile; tale variabilità è osservabile in primis tra Aree Omogenee, dove le scelte in fase di emergenza legate allo sviluppo dei Piani di Ricostruzione ha giocato un ruolo determinante: si pensi ad esempio che nel 2012 i comuni dell'Area Omogenea 5 avevano tutti completato i Piani di Ricostruzione e potevano pertanto affrontare la ricostruzione dei centri storici con il proprio Ufficio Territoriale di Bussi sul Tirino a partire dal 2013, anno in cui la nuova Governance USRC/UTR diventava operativa, mentre i comuni dell'Area Omogenea 3 completavano i Piani di Ricostruzione nel 2015.

	Atteso	Ammesso	Percentuale
AO2	€ 1.262	€ 170	13%
AO3	€ 433	€ 92	21%
AO4	€ 221	€ 72	33%
AO5	€ 298	€ 199	67%
AO6	€ 558	€ 194	35%
AO7	€ 256	€ 115	45%
AO8	€ 1.549	€ 650	42%
AO9	€ 411	€ 208	51%
Totale	€ 4.988	€ 1.700	34%

Percentuale di Ammissione a contributo per singola Area Omogenea (dati al 31/12/2019)

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento in termini di cantieri e SAL, invece, ad oggi è stato liquidato un importo complessivo pari a **1 miliardo di euro** (dato periferia + centro storico). La maggior parte delle erogazioni hanno interessato l'Area Omogenea n.8, che comprende il più alto numero di Comuni (11) con la maggior entità di danno, seguita dall'Area Omogenea 5; sono allo stesso livello di liquidazioni le Aree Omogenee 2, 6 e 9; chiudono Goriano Sicoli, Montorio e Castel del Monte, per ragioni principalmente di minore estensione territoriale rispetto alle altre aree omogenee.

Il dato delle liquidazioni per l'avanzamento dei cantieri del 2019 è confortante, essendo il miglior risultato raggiunto da USRC, raggiungendo il valore massimo di importi liquidati nel 2017; come si dirà nel seguito, le nuove procedure volte allo snellimento delle istruttorie SAL introdotte nel luglio 2019 hanno già dato i primi risultati.

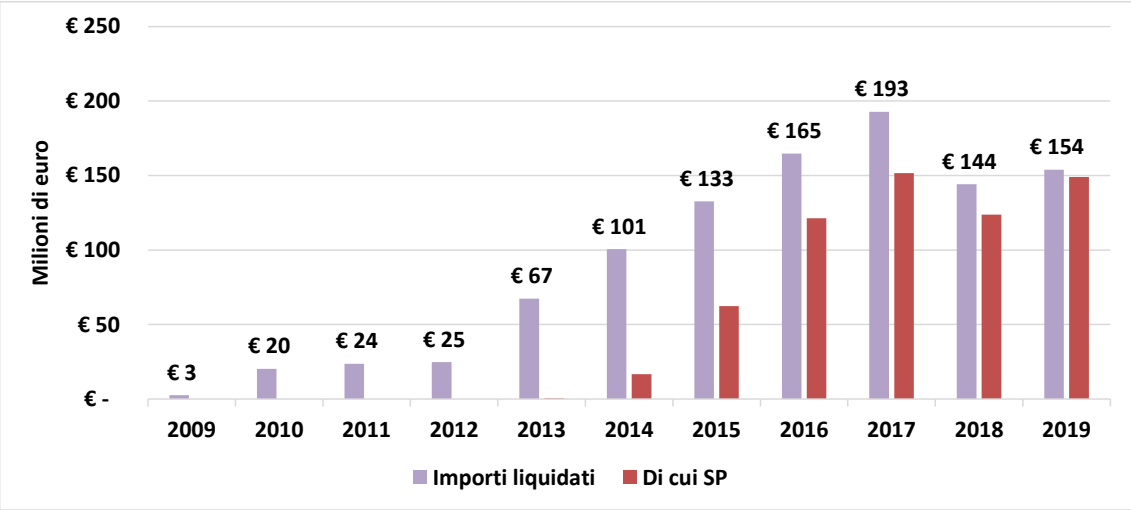

Avanzamento nel tempo delle erogazioni a seguito di ammissione SAL per la ricostruzione privata nei Comuni del Cratere.

Area	Capofila	Perc.	Importo	Di cui USRC/SP
2	Barete	10,09%	€ 103.697.752,89	€ 55.600.223,51
3	Montorio al Vomano	6,67%	€ 83.360.269,01	€ 11.364.891,25
4	Castel del Monte	3,87%	€ 38.758.654,09	€ 38.748.178,01
5	Bussi sul tirino	14,85%	€ 153.599.153,44	€ 115.765.848,62
6	Caporciano	10,04%	€ 105.524.947,95	€ 76.504.131,54
7	Goriano Sicoli	7,94%	€ 86.327.309,09	€ 45.224.302,69
8	Barisciano	35,74%	€ 381.697.880,25	€ 221.750.265,46
9	Rocca di Mezzo	10,10%	€ 107.690.931,32	€ 65.761.687,83

Distribuzione degli importi totali dei contributi liquidati tra le aree omogenee

Osservando l'andamento delle ammissioni a contributo dal 2009 al 2019 emerge un progressivo incremento della capacità di ammissione mensile media fino al 2015, che passa dai 9,9 Milioni di € del 2012 ai 24 Milioni di € nel 2015. A partire dal 2015 si osserva invece un calo della capacità di ammissione fino al 2017, anno in cui il trend si inverte nuovamente.

Anno	Importo totale (Milioni di €)	Media mensile (Milioni di €)	Percentuale annua su totale
fino al 2011	168,70	14,06	10%
2012	119,13	9,93	7%
2013	157,44	13,12	9%
2014	214,22	17,85	13%
2015	291,98	24,33	17%
2016	188,56	15,71	11%
2017	160,15	13,35	9%
2018	177,86	14,82	10%
2019	222,11	18,51	13%

Tabella 1: Andamento ammissioni contributi

La riduzione delle ammissioni va spiegata anzitutto con il notevole aumento dell'attività di istruttoria degli stati di avanzamento lavori negli anni 2015-2017, come riportato nella tabella sottostante riferita agli importi ammessi a liquidazione da parte degli uffici preposti (prima UTR, ora SP e USRC):

Anno	Importo totale SP/USRC (Milioni di €)	Media mensile (Milioni di €)	Percentuale annua su totale
2015	62,27	5,19	10%
2016	121,31	10,11	20%
2017	151,69	12,64	25%
2018	123,78	10,31	20%
2019	149,04	12,42	25%

Tabella 2: Andamento istruttorie SAL

E' interessante notare come per la prima volta nel 2019 si assiste ad un incremento congiunto dei trend sia nella ammissione delle pratiche che nella liquidazione dei SAL, pur in corrispondenza di una riduzione complessiva del personale degli sportelli (da 55 a 37 risorse umane). Ciò si spiega con un riequilibrio delle attività in capo al personale USRC, con un incremento dei carichi di lavoro per il personale MIT e a tempo determinato con sede a Fossa, che dalla seconda metà del 2018 inizia a svolgere anche l'attività di istruttoria delle pratiche di ricostruzione privata, ad invarianza dei carichi lavorativi per il personale degli sportelli, che si concentrano maggiormente sui SAL pur continuando a istruire le pratiche già avviate.

Si riporta di seguito il riparto per Area Omogenea degli importi delle istruttorie SAL, ammessi nell'anno 2019 dall'USRC e dagli sportelli decentrati:

AREA	Comune	Nulla osta ammesso SP/USRC [migliaia di €]
2	Barete	€ 11.303
3	Montorio Al Vomano	€ 5.216
4	Castel del Monte	€ 9.382
5	Bussi sul Tirino	€ 23.060
6	Caporciano	€ 15.243
7	Goriano Sicoli	€ 9.782
8	Barisciano	€ 56.788
9	Rocca di Mezzo	€ 18.266
Totale		€ 149.039

Tabella 3: Riparto per Area Omogenea delle ammissioni SAL nell'anno 2019

3.2 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

In attuazione del co.32, art.2-bis, della legge 4 dicembre 2017, n.172, la competenza dei **procedimenti tecnico-amministrativi relativi alla ricostruzione privata nei centri storici** è attribuita all'**Ufficio speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere**, che la esplica attraverso l'**Ufficio centrale** con sede a Fossa e mediante i 5 **Sportelli Decentrati** siti nelle Aree Omogenee del Cratere, diretti e coordinati dal Titolare dell'USRC. Degli originari 8 Sportelli Decentrati (già Uffici Territoriali per la Ricostruzione) al fine di ottimizzare la gestione del flusso documentale e razionalizzare l'utilizzo del personale, nell'ottobre 2019 sono stati soppressi gli Sportelli Decentrati di Barete (area 2), Castel del Monte (area 4) e Caporciano (area 6).

Oltre al coordinamento procedurale e normativo in materia di ricostruzione privata, l'USRC svolge da luglio 2018 anche l'istruttoria delle richieste di contributo per la ricostruzione privata e la verifica dei relativi SAL

direttamente presso la sede di Fossa. Con la soppressione dei precedenti 3 sportelli tutte le funzioni esercitate da essi sono passate, assieme alle istanze, all'USRC. Al 31/12/2019 risultano 621 istanze per un totale di 562 milioni di € presso la sede di Fossa.

Il coordinamento funzionale degli Sportelli Decentrati è finalizzato alla **gestione e standardizzazione delle procedure** ed al **controllo di efficacia ed efficienza** del processo di riconoscimento ed erogazione del contributo.

L'attività di coordinamento ha consentito di pervenire, ad oggi, a **processi istruttori** sostanzialmente **uniformi** anche tra i diversi Sportelli Decentrati. Tale risultato è stato ottenuto in particolare a seguito dell'introduzione del **Modello Integrato Cratere**.

La principale attività di coordinamento dal punto di vista tecnico prevede l'analisi e la condivisione di problematiche emerse nell'ambito delle attività istruttorie, poste dai Responsabili del procedimento operanti presso l'USRC e presso gli Sportelli Decentrati in un tavolo di coordinamento che si riunisce con cadenza periodica e in occasione di particolari problematiche.

Grazie ad un sistema di scambio informazioni costruito su una unica e omogenea struttura dati il Settore Ricostruzione Privata dell'USRC può pubblicare con frequenza quasi settimanale le informazioni sull'andamento dello stato istruttorio delle richieste di contributo e degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) depositate presso l'USRC e gli Sportelli Decentrati.

Il quadro di avanzamento delle pratiche Sisma 2009 all'interno degli Sportelli e dell'USRC è suddiviso in:

- Pratiche Presentate
- Pratiche Ammesse
- Pratiche con Archiviazione e Dinieghi
- Pratiche in attesa di ammissione

	Presentate [n.]	Presentate [€]	Ammesse [n.]	Ammesse [€]	Archiviazione e dinieghi [n.]	Archiviazione e dinieghi [€]	Pratiche in attesa di ammissione [n.]	Pratiche in attesa di ammissione [€]
SP 3	283	103.895.193,81	121	42.875.699,99	97	7.941.785,54	65	50.931.250,41
SP 5	681	274.784.671,88	232	153.904.510,31	212	10.122.459,52	237	89.137.541,23
SP 7	234	215.397.132,11	124	103.403.066,05	35	25.037.721,98	75	80.069.681,98
SP 8	863	896.362.690,91	451	412.717.464,26	153	100.540.339,77	259	311.663.528,99
SP 9	389	209.780.686,21	184	128.088.156,05	20	9.062.151,01	185	62.445.524,30
USRC	621	562.911.624,56	19	36.727.082,00	6	3.228.343,38	596	510.799.806,28
	-	-	-	-	-	-	-	-
SP chiusi dal 10/2019								
SP 2	456	166.376.293,75	195	89.775.368,17	261	61.763.135,12	0	0
SP 4	138	103.113.214,87	117	84.659.165,81	21	4.363.902,48	0	0
SP 6	107	137.913.538,06	101	110.527.056,55	6	11.064.142,29	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT	**3772**	**2.670.535.046,16**	**1544**	**1.162.677.569,19**	**811**	**233.123.981,09**	**1417**	**1.105.047.333,19**
								Dati al 02/01/2020

Ai fini di una più completa valutazione delle pratiche in attesa di ammissione, si riporta di seguito il dettaglio in termini di:

- Pratiche da istruire;
- Pratiche in istruttoria presso gli SP/USRC;
- Pratiche in integrazione presso i tecnici.

	Da Istruire [n.]	Da Istruire [€]	In istruttoria [n.]	In istruttoria [€]	In integrazione presso i tecnici [n.]	In integrazione presso tecnici [€]
SP 3	12	11.247.196,71	12	7.410.311,56	41	32.273.742,14
SP 5	121	42.390.398,42	26	13.320.307,66	90	33.426.835,15
SP 7	3	2.001.732,09	30	33.778.371,29	42	44.289.578,60
SP 8	186	217.466.577,86	19	22.744.367,50	54	71.452.583,63
SP 9	19	19.902.477,61	68	17.490.308,53	98	25.052.738,16
USRC	351	304.221.395,28	110	89.144.542,04	135	117.433.868,96
TOT	**692**	**597.229.777,97**	**265**	**183.888.208,58**	**460**	**323.929.346,64**

Lo stato dei procedimenti istruttori per le istanze relative alla ricostruzione privata a fine anno 2019 è riportato raffrontato a quello di fine 2018 nella figura seguente.

	Totali		Ammissione		Archiviazioni e Dinieghi		Da istruire		Di cui già avviata l'istruttoria		In integrazione presso tecnici	
	[N]	[€]	[N]	[€]	[N]	[€]	[N]	[€]	[N]	[€]	[N]	[€]
2019	3772	€ 2.670.535.046	1544	€ 1.162.677.569	811	€ 233.123.981	957	€ 781.117.987	265	€ 183.888.209	460	€ 323.929.347
2018	3434	€ 2.307.704.156	1398	€ 980.105.223	755	€ 216.527.969	792	€ 683.733.627	251	€ 282.185.841	489	€ 299.180.104

Delle 792 istanze da istruire a fine 2018, 544 sono state assegnate nel corso del 2019, per un importo di 491 Milioni di € (tra le 544 sono state considerate anche le istanze assegnate prima del 2017 ma il cui avvio del procedimento è stato effettuato nel 2019). Al fine di ridurre le pesanti giacenze riscontrate a inizio 2019 da parte della nuova gestione, sono stati anche reclutati consulenti esperti nella istruttoria delle pratiche che hanno acquisito una parte sostanziale delle nuove pratiche assegnate, ma con dipendenti USRC nel ruolo di responsabili del procedimento.

Di seguito il dettaglio delle pratiche effettivamente assegnate ai responsabili del procedimento nel 2019, di quelle ammesse e di quelle istruite nello stesso periodo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PRATICHE ASSEGNATE		PRATICHE AMMESSE		PRATICHE ISTRUITE (1)	
	NUMERO	IMPORTO (€)	NUMERO	IMPORTO (€)	NUMERO	IMPORTO (€)
CRATERE						
GEOM. SACCHINI	13	€ 4.287.942,72	13	€ 10.943.566,71	93	€ 63.887.268,16
ING. CICIONI	10	€ 2.438.702,69	23	€ 15.717.220,62	55	€ 40.325.024,49
ARCH. AMICOSANTE	25	€ 30.496.807,38	20	€ 28.744.863,31	102	€ 140.869.852,80
ING. ROSSI	27	€ 33.005.886,22	35	€ 56.028.116,98	106	€ 275.865.305,23
ING. FERRINI	28	€ 40.428.763,20	0	€ -	7	€ 7.994.706,45
GEOL. PIPPONZI	41	€ 32.062.496,32	5	€ 13.887.768,64	62	€ 89.324.703,54
ING. MATTUCCI	32	€ 53.517.966,64	4	€ 9.094.767,26	32	€ 66.671.717,17
GEOM. DI POMPEO	50	€ 32.362.008,88	0	€ -	16	€ 7.105.602,35
ING. TAURINO	60	€ 47.478.695,55	1	€ 411.657,85	15	€ 13.276.970,61
ING. VENEZI	4	€ 3.594.814,77	0	€ -	2	€ 2.128.840,94
ING. COLABIANCHI	30	€ 30.627.011,61	0	€ -	2	€ 1.776.741,42
ING. GALEOTA	1	€ 7.862.562,28	0	€ -	1	€ 7.862.562,28
DOTT. BIANCHI	43	€ 36.454.296,29	23	€ 22.363.485,80	123	€ 76.143.937,13
ARCH. BRUNETTI	66	€ 94.865.672,76	8	€ 13.005.781,50	23	€ 37.876.230,07
ING. CAPRI	34	€ 16.038.998,43	12	€ 8.820.136,58	50	€ 34.522.517,47
ALTRO PERSONALE (ad es cessato dal servizio nel 2019)	n.d.		27	€ 43.097.087,49	n.d.	
Totali	464	€ 465.522.625,74	171	€ 222.114.452,74	689	€ 865.631.980,11

3.2.1 MODELLO INTEGRATO DEL CRATERE

Per il combinato disposto dell'art. 4 comma 10 e 12 del DPCM Abruzzo del 4 febbraio 2013, il settore Ricostruzione Privata dell'USRC ha sviluppato tra giugno 2013 e febbraio 2014, anche attraverso uno studio di fattibilità con **l'Università Federico II e Cineas**, apposita scheda parametrica (**Modello Integrato per i Comuni del Cratere**) relativa alla procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei Centri Storici dei 56 Comuni del Cratere. Il modello, perseguendo lo scopo di semplificare la procedura di emissione del contributo ha previsto, tra l'altro, una particolare intesa con la **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo, Sovrintendenza ed Ordini professionali** al fine di individuare specifiche maggiorazioni tabellari per la presenza di elementi di particolare valenza architettonica e complessità strutturale che consentono un incremento al contributo fino ad un massimo del 60% per gli edifici ordinari e fino ad un massimo del 100% per gli edifici vincolati. Contestualmente alla predisposizione del modello, il settore Ricostruzione Privata ha inteso:

- predisporre un **sistema accessibile attraverso interfaccia web** che consenta al progettista incaricato di determinare univocamente e in modo standard il contributo concedibile per i lavori. Tale sistema permette ad oggi di acquisire la maggior parte delle informazioni sullo stato di consistenza dell'edificio danneggiato, in una **banca dati unica ai fini del monitoraggio** fisico ed economico della ricostruzione nei centri storici;
- predisporre una **manualistica tecnica** esaustiva di ogni fattispecie riscontrabile.

Con la contestuale pubblicazione del Decreto n1/USRC contenente le disposizioni in materia di scheda parametrica e la messa online dell'interfaccia sul sito mic.usrc.it, completo della manualistica, il c.d. "Allegato tecnico", e dei video tutorial, il **MIC** ha ricevuto un pieno riconoscimento da parte del territorio coinvolto nella ricostruzione. Non sono state infatti riscontrate criticità del sistema online, non è stato necessario predisporre FAQ o decreti di correzione e il personale addetto è stato dedicato al miglioramento della piattaforma.

All'indirizzo:

http://www.usrc.it/home/news/912-16-19-settembre-l-usrc-partecipa-al-xviii-convegno-dell-anidis

e' possibile scaricare un documento di sintesi che riporta l'esito dei primi studi fatti sul MIC da Enti di ricerca quali CNR, ReLUIS, oltre che del DPC, in termini di analisi del danno e costi di ricostruzione nei comuni del Cratere colpiti dal sisma di L'Aquila 2009. Il documento contiene anche un primo confronto con i costi relativi alla ricostruzione effettuata attraverso le cd. OPCM nella prima fase dell'emergenza.

Dal punto di vista delle richieste di contributo parametriche si rilevano **1.600** istanze consegnate agli Sportelli Decentrati e all'USRC per una richiesta totale di contributo di circa **1.956 M€**. Di queste ad oggi sono state **ammesse 788 MIC** per un importo di **957 Milioni di €,** con un tempo medio di ammissione al contributo pari a 255 gg. Alle istanze ammesse corrispondono 408 cantieri MIC avviati e 233 cantieri con lavori già terminati a cui corrisponde il ripristino della agibilità.

Schede MIC Presentate [numero]	Schede MIC Presentate [importo]	Schede MIC Ammesse [numero]	Schede MIC Ammesse [importo]	Cantieri MIC aperti	Cantieri MIC chiusi
1.600	1.956M€	788	957M€	408	233

Nel solo anno appena concluso, le schede MIC ammesse sono state 112 per un totale di 177 milioni di € mentre quelle presentate sono state 173 per un totale di 190 milioni di €.

Si riporta di seguito l'andamento delle approvazioni del contributo alla ricostruzione privata attraverso la Scheda MIC negli anni 2019, 2018 e dall'aprile 2014, data di introduzione del modello.

Numero di Schede MIC approvate e contributi ammessi (milioni di €) mensilmente

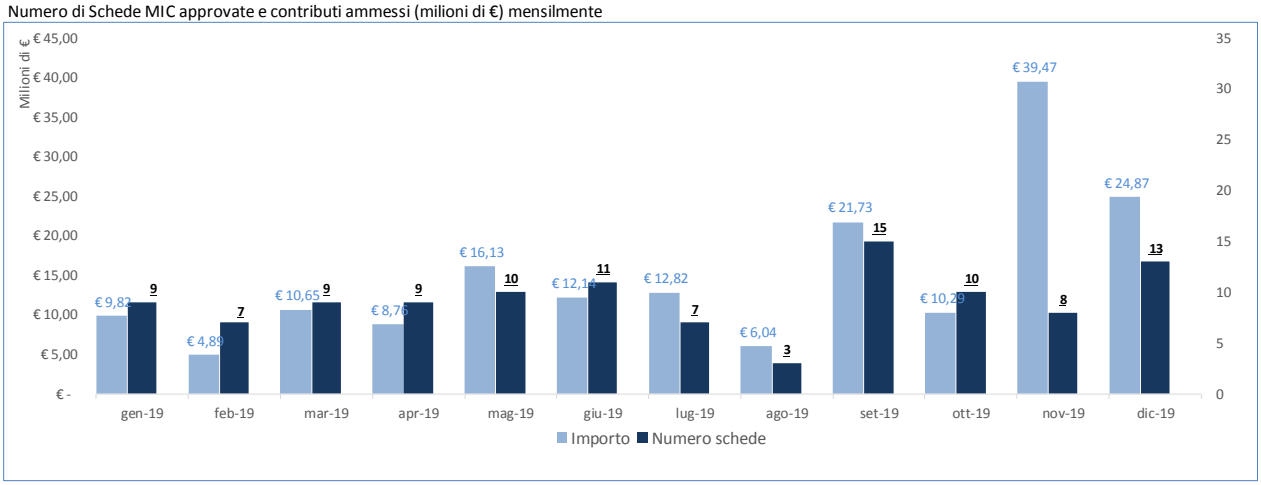

Numero di Schede MIC approvate e contributi ammessi (milioni di €) mensilmente

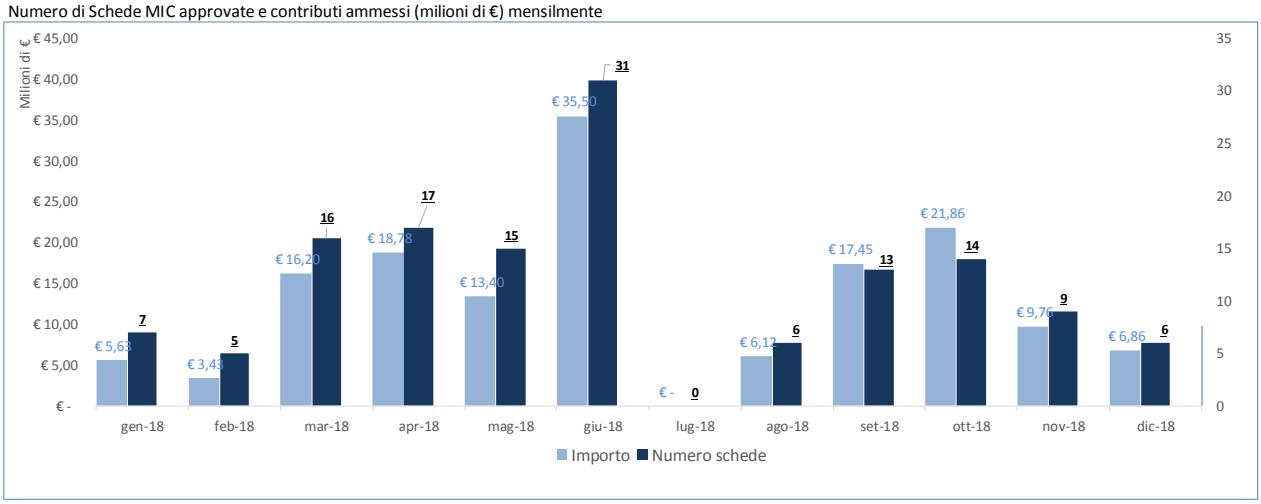

Numero di Schede MIC approvate e contributi ammessi (milioni di €) mensilmente

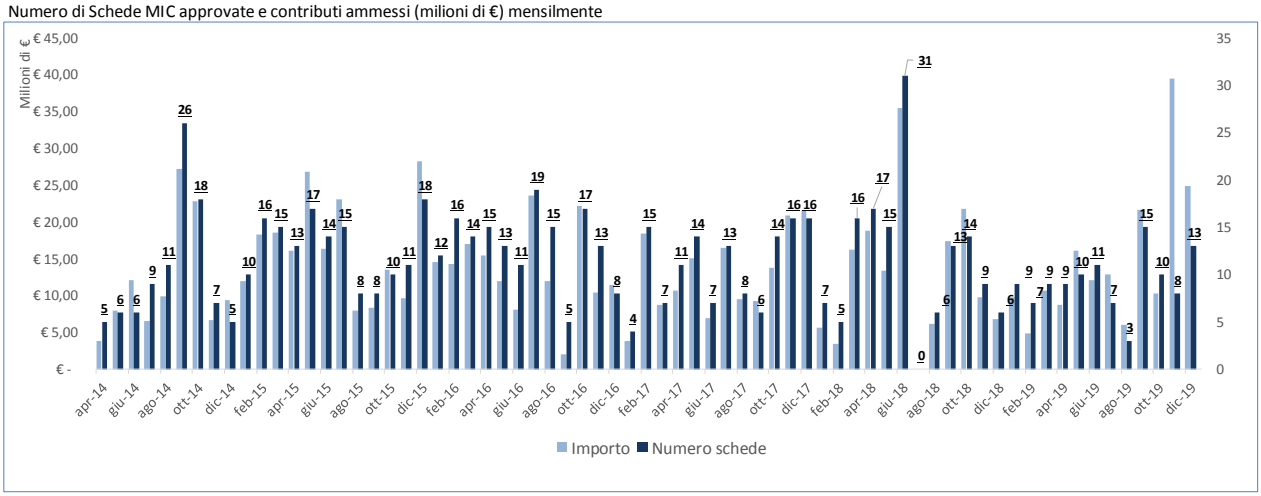

3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

L'attività istruttoria per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori è determinante per garantire il necessario flusso finanziario alle imprese, ai professionisti e ai presidenti di consorzio coinvolti nella ricostruzione unitamente al necessario controllo dei cantieri previsto.

Con la **Circolare USRC n. 12 del 31 luglio 2019** e n. 13 del 01 agosto 2019 sono state predisposte specifiche procedura di snellimento dell'iter di liquidazione dei SAL. Ai sensi di quanto disposto il Comune eroga il SAL parziale previa verifica di completezza della documentazione e istruttoria semplificata da parte dello Sportello decentrato USRC (prima il 30% dei SAL intermedi era estratto a sorte e sottoposto a controllo analitico) e solo il 30% dei SAL finali (il 100% prima della Circolare 12/19) viene sottoposto a controllo analitico mediante estrazione a campione. Il controllo a campione avviene tramite sorteggio effettuato dall'USRC sul 30% dei SAL finali presentati presso tutti gli Sportelli Decentrati e l'USRC medesimo, nell'intervallo temporale intercorrente tra due sorteggi successivi.

Il sorteggio è effettuato, presso la sede dell'USRC, mediante query sul database informatico dell'USRC che contiene i dati relativi alle pratiche in istruttoria presso gli Sportelli Decentrati.

All'esito di ogni sorteggio l'USRC provvede a pubblicare l'elenco delle pratiche estratte e delle non estratte.

Il quadro di avanzamento delle pratiche Sisma 2009 all'interno degli Sportelli e dell'USRC è suddiviso in:

- SAL Presentati
- SAL con NULLA OSTA
- SAL Archiviati
- SAL in attesa di nulla osta

Di seguito lo stato di avanzamento dei SAL al 31/12/2019:

	Richieste Presentate [n.]	Richieste Presentate [€]	Nulla Osta [n.]	Nulla Osta [€]	Archiviate [n.]	Archiviate [€]	In attesa di nulla osta [n.]	In attesa di nulla osta [€]
SP 3	179	12.544.023,34	152	11.364.891,25	4	143.512,83	23	972.022,33
SP 5	675	117.763.235,61	633	107.817.593,56	15	953.863,30	27	6.124.960,13
SP 7	341	50.632.085,94	317	47.059.572,42	6	345.862,70	18	2.290.218,05
SP 8	1267	236.062.518,77	1132	211.725.052,42	13	290.171,14	121	19.554.067,84
SP 9	523	76.373.533,13	457	64.604.757,32	9	575.956,56	57	9.149.876,95
USRC	132	25.659.308,52	27	4.710.058,53	1	34.444,00	104	19.730.719,37
	-	-	-	-	-	-	-	-
SP chiusi dal 10/2019								
SP 2	401	55.154.802,73	382	50.446.685,07	19	1.360.566,33	0	0
SP 4	275	37.425.356,22	274	37.055.290,48	1	169.947,22	0	0
SP 6	348	70.943.322,09	335	73.620.789,53	13	2.376.959,71	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT	**4141**	**682.558.186,35**	**3709**	**608.404.690,58**	**81**	**6.251.283,79**	**350**	**57.821.864,67**
								Dati al 02/01/2020

Ai fini di una valutazione dello stato istruttorio dei SAL in attesa di nulla osta, si riporta di seguito il dettaglio al 31/12/2019 di:

- SAL in istruttoria presso gli uffici;
- SAL in integrazione presso i tecnici.

	In Istruttoria [n.]	In Istruttoria [€]	In integrazione presso i tecnici [n.]	In integrazione presso tecnici [€]
SP 3	16	592.668,91	7	379.353,42
SP 5	16	4.844.767,50	11	1.280.192,63
SP 7	11	1.942.898,91	7	347.319,14
SP 8	64	13.509.171,36	57	6.044.896,48
SP 9	26	4.245.576,18	31	4.904.300,77
USRC	64	15.331.763,10	40	4.398.956,27
TOT	**197**	**40.466.845,96**	**153**	**17.355.018,71**

I dati illustrati sono riportati nella pagina web raggiungibile all'indirizzo:

- http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/coordinamento-sportelli

Alla fine del 2019 questa la fotografia dell'avanzamento della ricostruzione privata nei comuni del cratere in termini cantieri e ripristino agibilità degli immobili privati:

Totale Cantieri Chiusi	
2659	
Totale Cantieri Attivi	
664	
Centro Storico-PdR	Fuori Centro Storico
463*	201

*__408__ riferibili alla procedura parametrica **MIC.**

Totale Immobili Tornati Agibili		
6.674**		
Prime Ab.	Seconde Ab.	Altri Usi
2.779	3.150	745

____ escludendo i 9.689 interventi realizzati su abitazioni con esito di agibilità A.

3.4 GESTIONE FONDI

L'USRC esegue il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata ex. art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, ed effettua un controllo costante dell'andamento della ricostruzione, consentendo di definire i fabbisogni economici futuri e di programmare quindi lo stanziamento delle risorse da parte degli organi centrali.

Attraverso il monitoraggio sono definiti i fabbisogni finanziari per la ricostruzione privata dei 56 comuni del cratere, con la precipua finalità di garantire una ricostruzione senza soluzione di continuità attraverso la corretta allocazione delle risorse disponibili, coprendo l'intero territorio del cratere in maniera omogenea ed efficiente.

Il monitoraggio, realizzato interamente on-line con l'aggiornamento della Banca Dati dell'Emergenza (BDE), è inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato sul sito www.usrc.it.

La concessione di contributi, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al **31/12/2019**, segnala un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di **1.606 milioni di euro** (1.812 M€ includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Da gennaio 2015 il Settore ricostruzione privata dell'USRC cura l'attività di assegnazione e trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni del Cratere. Nell'intento di assicurare una più efficace allocazione delle risorse, le Delibere CIPE 23/2014 e 22/2015 hanno infatti attribuito all'USRC il compito di assegnare le risorse per la ricostruzione privata ai Comuni del Cratere che abbiano integralmente impegnato le risorse precedentemente attribuite a copertura delle nuove istruttorie positivamente concluse e prive di copertura. L'USRC ha quindi adottato una procedura di assegnazione delle risorse che prevede l'accertamento dei requisiti sia di carattere economico, per verificare l'utilizzo delle assegnazioni pregresse, sia di carattere tecnico, per accertare l'immediata cantierabilità dell'intervento. Il vantaggio della procedura è quello di assegnare le risorse ad interventi che troveranno immediata attuazione, garantendo un efficiente utilizzo di risorse pubbliche. Al **31/12/2019** l'USRC ha assegnato complessivamente **849 M€**, di cui trasferiti **661 M€**.

	Assegnazioni USRC	Utilizzi USRC
A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC	**€ 1.193.853.630,95**	
B. Totale utilizzi USRC Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni del cratere		**€ 849.196.860,10**
C. Totale Disponibile Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Cratere		**€ 344.656.770,85**

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 53 Comuni del Cratere e rappresentano circa il 58% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

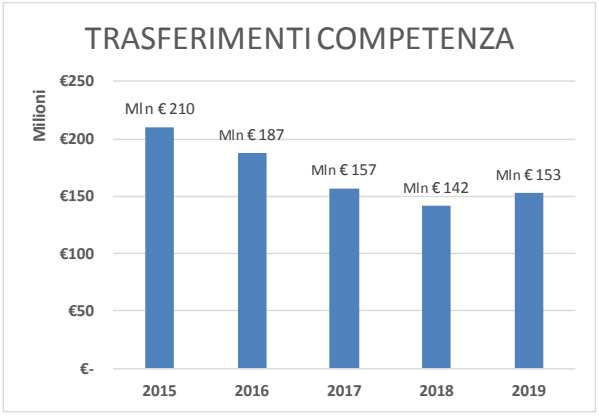

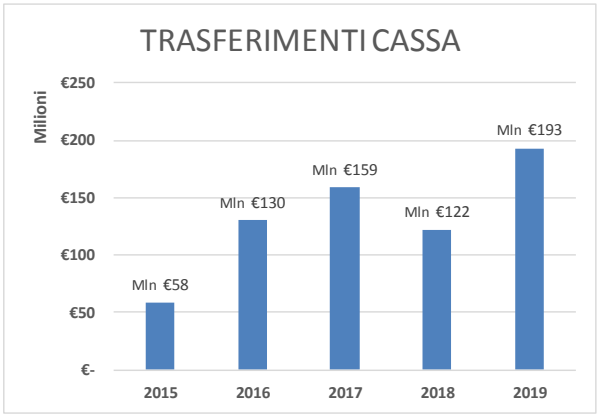

http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/gestione-fondi-comuni-del-cratere

Nel corso del **2019** sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 193.072.352,46** a 48 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati finanziamenti a 41 comuni per complessivi **€ 152.662.876,20.** Si riporta di seguito il dettaglio fondi ricostruzione privata cratere per singolo comune.

AO	COMUNE	ASSEGNAZIONE FONDI			EROGAZIONE FONDI		
			IMPORTO (€)	VARIAZIONE ULTIMO REPORT		IMPORTO (€)	VARIAZIONE ULTIMO REPORT
2	COMUNE DI BARETE	0	€ -	€ -	1	€ 2.123.632,47	€ -
2	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	0	€ -	€ -	0	€ -	€ -
2	COMUNE DI CAMPOTOSTO	0	€ -	€ -	0	€ -	€ -
2	COMUNE DI CAPITIGNANO	0	€ -	€ -	1	€ 944.087,75	€ 944.087,75
2	COMUNE DI MONTEREALE	4	€ 5.419.379,71	€ 1.703.315,77	1	€ 3.287.728,79	€ -
2	COMUNE DI PIZZOLI	4	€ 3.544.540,25	€ 224.404,28	2	€ 4.098.799,70	€ -
2	COMUNE DI SCOPPITO	1	€ 2.134.760,59	€ -	2	€ 4.100.428,86	€ -
2	COMUNE DI TORNIMPARTE	0	€ -	€ -	0	€ -	€ -
3	COMUNE DI ARSITA	1	€ 123.495,74	€ -	1	€ 2.360.633,25	€ -
3	COMUNE DI CASTELLI	1	€ 89.880,17	€ -	1	€ 333.208,66	€ -
3	COMUNE DI COLLEDARA	0	€ -	€ -	1	€ 539.604,27	€ -
3	COMUNE DI FANO ADRIANO	0	€ -	€ -	0	€ -	€ -
3	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	1	€ 2.080.122,91	€ -	1	€ 1.712.035,47	€ -
3	COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA	0	€ -	€ -	0	€ -	€ -
3	COMUNE DI PIETRACAMELA	0	€ -	€ -	0	€ -	€ -
3	COMUNE DI TOSSICIA	1	€ 549.600,74	€ -	0	€ -	€ -
4	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE	2	€ 1.016.828,84	€ -	1	€ 1.883.054,14	€ -
4	COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO	1	€ 2.690.045,94	€ -	2	€ 4.879.399,08	€ -
4	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	3	€ 7.916.779,37	€ -	2	€ 5.607.907,38	€ 2.140.986,85
5	COMUNE DI BRITTOLI	0	€ -	€ -	1	€ 655.707,32	€ -
5	COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO	2	€ 2.895.031,88	€ 894.145,58	2	€ 4.253.065,20	€ -
5	COMUNE DI CAPESTRANO	3	€ 1.256.487,44	€ -	2	€ 3.768.384,32	€ -
5	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	1	€ 1.161.841,76	€ -	1	€ 1.599.213,49	€ -
5	COMUNE DI CUGNOLI	1	€ 125.088,53	€ 125.088,53	1	€ 86.650,59	€ -
5	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	0	€ -	€ -	1	€ 2.623.548,73	€ -
5	COMUNE DI OFENA	2	€ 1.239.236,62	€ -	3	€ 3.761.376,86	€ 423.126,15
5	COMUNE DI POPOLI	2	€ 3.353.676,85	€ -	4	€ 5.114.872,95	€ -
5	COMUNE DI TORRE DE' PASSERI	2	€ 2.433.186,47	€ -	1	€ 2.682.459,94	€ -
6	COMUNE DI CAPORCIANO	2	€ 3.169.858,00	€ -	2	€ 5.282.844,84	€ -
6	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO	0	€ -	€ -	1	€ 741.533,89	€ -
6	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO	1	€ 1.870.649,46	€ -	1	€ 492.645,31	€ 492.645,31
6	COMUNE DI NAVELLI	1	€ 2.517.657,28	€ -	2	€ 6.601.202,72	€ 3.142.550,63
6	COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA	3	€ 4.782.563,78	€ 93.728,64	1	€ 3.858.373,40	€ -
6	COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE	2	€ 7.801.252,90	€ -	1	€ 2.890.329,63	€ -
7	COMUNE DI BUGNARA	1	€ 9.271,93	€ -	1	€ 215.250,79	€ -
7	COMUNE DI CASTEL DI IERI	2	€ 1.912.614,37	€ -	1	€ 1.092.511,45	€ -
7	COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO	2	€ 765.557,08	€ -	2	€ 5.475.152,64	€ -
7	COMUNE DI COCULLO	1	€ 784.835,98	€ -	1	€ 768.367,86	€ 768.367,86
7	COMUNE DI COLLARMELE	0	€ -	€ -	0	€ -	€ -
7	COMUNE DI GAGLIANO ATERNO	1	€ 745.616,88	€ -	1	€ 489.934,33	€ -
7	COMUNE DI GORIANO SICOLI	2	€ 3.718.704,51	€ -	1	€ 2.241.595,98	€ -
8	COMUNE DI ACCIANO	2	€ 757.646,84	€ -	2	€ 4.990.444,97	€ -
8	COMUNE DI BARISCIANO	3	€ 6.250.190,69	€ -	2	€ 11.932.014,09	€ -
8	COMUNE DI FAGNANO ALTO	4	€ 8.933.103,74	€ -	2	€ 7.430.026,64	€ -
8	COMUNE DI FONTECCHIO	2	€ 2.224.275,80	€ -	2	€ 9.774.305,02	€ -
8	COMUNE DI FOSSA	3	€ 5.642.927,21	€ -	2	€ 7.007.679,27	€ 3.146.440,52
8	COMUNE DI OCRE	0	€ -	€ -	1	€ 2.848.687,48	€ -
8	COMUNE DI POGGIO PICENZE	2	€ 3.512.576,93	€ -	1	€ 3.491.496,15	€ 3.491.496,15
8	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI	6	€ 16.579.695,87	€ 2.283.779,39	3	€ 16.552.804,34	€ 5.826.437,27
8	COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE	2	€ 6.502.491,18	€ -	2	€ 8.868.106,40	€ 3.605.568,53
8	COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI	1	€ 2.219.900,65	€ -	2	€ 5.863.611,44	€ -
8	COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO	3	€ 4.498.719,38	€ -	1	€ 6.351.586,97	€ -
9	COMUNE DI LUCOLI	4	€ 15.288.203,32	€ 2.841.832,26	1	€ 5.845.269,17	€ -
9	COMUNE DI OVINDOLI	0	€ -	€ -	2	€ 4.272.889,02	€ 2.516.378,63
9	COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO	1	€ 3.656.560,57	€ 3.656.560,57	1	€ 3.644.318,31	€ -
9	COMUNE DI ROCCA DI MEZZO	5	€ 10.488.018,04	€ -	2	€ 7.633.571,13	€ -
	TOTALE	**88**	**€ 152.662.876,20**	**€ 11.822.855,02**	**73**	**€ 193.072.352,46**	**€ 26.498.085,65**

3.5 TRASPARENZA

L'attività di gestione dati svolta dal Settore Ricostruzione privata dell'USRC è volta prevalentemente alla standardizzazione delle basi dati utilizzate presso gli Sportelli Decentrati (ex UTR) con la finalità di uniformare il procedimento amministrativo di istruttoria delle richieste di contributo e degli stati avanzamento lavori.

E' stato predisposto dall'USRC, ed è completamente in uso, uno strumento unico per gli Sportelli Decentrati, a costo di sviluppo nullo, che consente la conoscenza temporale, storica e interrogabile in tempo reale della produttività degli Sportelli Decentrati, da intendersi come tutte quelle azioni aggiuntive rispetto alla ammissione a contributo. Lo strumento predisposto, peraltro, ha dato da subito indicazioni su alcune criticità sui procedimenti amministrativi e di gestione dei carichi lavorativi permettendo azioni volte ad aumentare l'efficacia del processo di ricostruzione. La potenzialità del database unico ha permesso altresì la **pubblicazione online accessibile senza restrizioni** sul sito www.usrc.it e su quello mic.usrc.it dello **stato delle istruttorie delle richieste di contributo e degli stati avanzamento lavori**.

La pagina è raggiungibile all'indirizzo:

- http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-della-pratica

L'attività di monitoraggio e gestione dati si completa attraverso l'utilizzo di una tecnologia GIS (Sistema Informativo Geografico), che consente di geolocalizzare su mappa i dati del monitoraggio della ricostruzione privata nei 56 Comuni del cratere. L'attività svolta da uno specifico gruppo di lavoro del settore Ricostruzione Privata è identificabile nella raccolta presso i singoli comuni e gli Sportelli Decentrati (ex UTR) di dati cartacei relativi ai contributi concessi ed agli interventi effettuati ed in corso di realizzazione con conseguente trasposizione degli stessi su cartografia georeferenziata. I dati raccolti e implementati in un database GIS vengono pubblicati sul web attraverso delle mappe navigabili su una piattaforma Web-Gis, accessibile sul sito dell'USRC. Questa attività ha la **finalità** di rendere disponibili le informazioni relative alla ricostruzione privata a tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione, e più in generale, a tutti i soggetti interessati, attraverso il web e sfruttando le potenzialità della geolocalizzazione dei dati tramite GIS, al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione ai processi della ricostruzione.

3.6 TRASPARENZA – CONTRATTI

Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione operano una attività di acquisizione dei contratti tra privati stipulati ai sensi dell'art. 67-quater comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ai fini della successiva trasmissione degli stessi ai Comuni interessati.

Il comma 1 dell'art. 11 del D.L. 78/2015 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125 pone in capo ai soggetti "committenti" l'onere di trasmettere agli Uffici Speciali per la Ricostruzione copia della documentazione inerente i detti contratti tra privati, garantendone la regolarità formale.

A dicembre 2019 la situazione dei "contratti" è la seguente.

Indicatore	Numero	Importo
Utenti Registrati	773	-
Pratiche Interessate	1.566	-
Contratti Aperti	4.440	1.596.486.839,16 Euro
di cui Protocollati	4.055	1.492.918.405,97 Euro
di cui da Protocollare	385	103.568.433,19 Euro
PEC Inviate ai Comuni	3.893	-
Allegati trasmessi	19.011	-
Comuni Interessati	108	-

4 RICOSTRUZIONE PRIVATA "FUORI CRATERE"

L'USRC è competente per i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere, ovvero dei Comuni non ricadenti nel cratere sismico ma che comunque hanno riportato danni aventi nesso di causalità con il sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39;

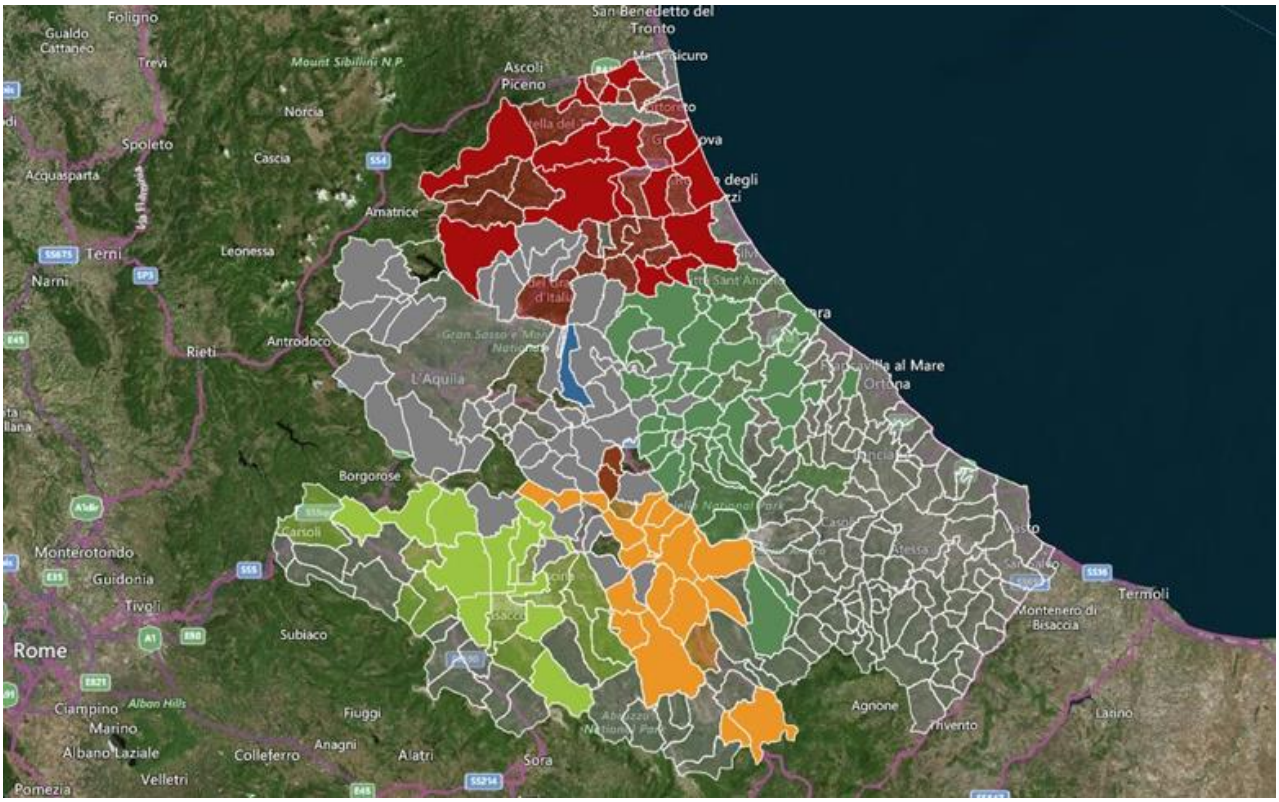

I Comuni ricadenti nella fattispecie risultano 114, di cui 34 nella provincia dell'Aquila, 32 nella provincia di Teramo, 42 nella provincia di Pescara e 6 nella provincia di Chieti. Le risorse per la Ricostruzione Privata, stanziate dalla Delibera CIPE 95/2012 risultano circa 17 milioni; seguiti dai 10 milioni della Delibera CIPE 43/2012; le assegnazioni della Delibera CIPE 135/2012, 55 milioni di euro per tre anni (2013 - 2015) ai quali si sommano le annualità della Delibera CIPE 50/2013 pari 5,62 milioni l'anno dal 2014 al 2019 e i 32 milioni assegnati in via definitiva con la delibera CIPE 23 del 01/08/2014. La Delibera CIPE 22/2015 ha disposto l'assegnazione in via definitiva in favore dei comuni "fuori cratere" di ulteriori 132 milioni. In seguito si sono aggiunte le risorse stanziate dalla delibera CIPE 113/2015 per ulteriori 30 milioni di euro. Con la pubblicazione della Delibera CIPE 33/2019 alle risorse a disposizione si sono aggiunti ulteriori 40milioni €.

Analogamente a quanto attuato per il cratere già con la delibera CIPE 22/2015, *"….le risorse sono ripartite, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, tra i singoli Comuni dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC), a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente, e a copertura degli importi riconosciuti in esito alle medesime istruttorie, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite…."*.

I contributi ammessi per la ricostruzione privata dei comuni Fuori Cratere, dal 2009 ad oggi, ammontano a **430 milioni** di euro, di cui **83 milioni ammessi con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti (2009-2012), mentre** i fondi complessivamente **stanziati sul canale del contributo diretto**, ammontano ad oggi a circa **374 milioni di euro,** di questi, sono stati **concessi con decreto sindacale** contributi per **321 milioni di euro**; quelli finora ammessi a contributo dagli Uffici competenti sono risultano **347 milioni**.

Di seguito l'andamento delle **concessioni rispetto agli stanziamenti** nel tempo sul CANALE DEL CONTRIBUTO DIRETTO:

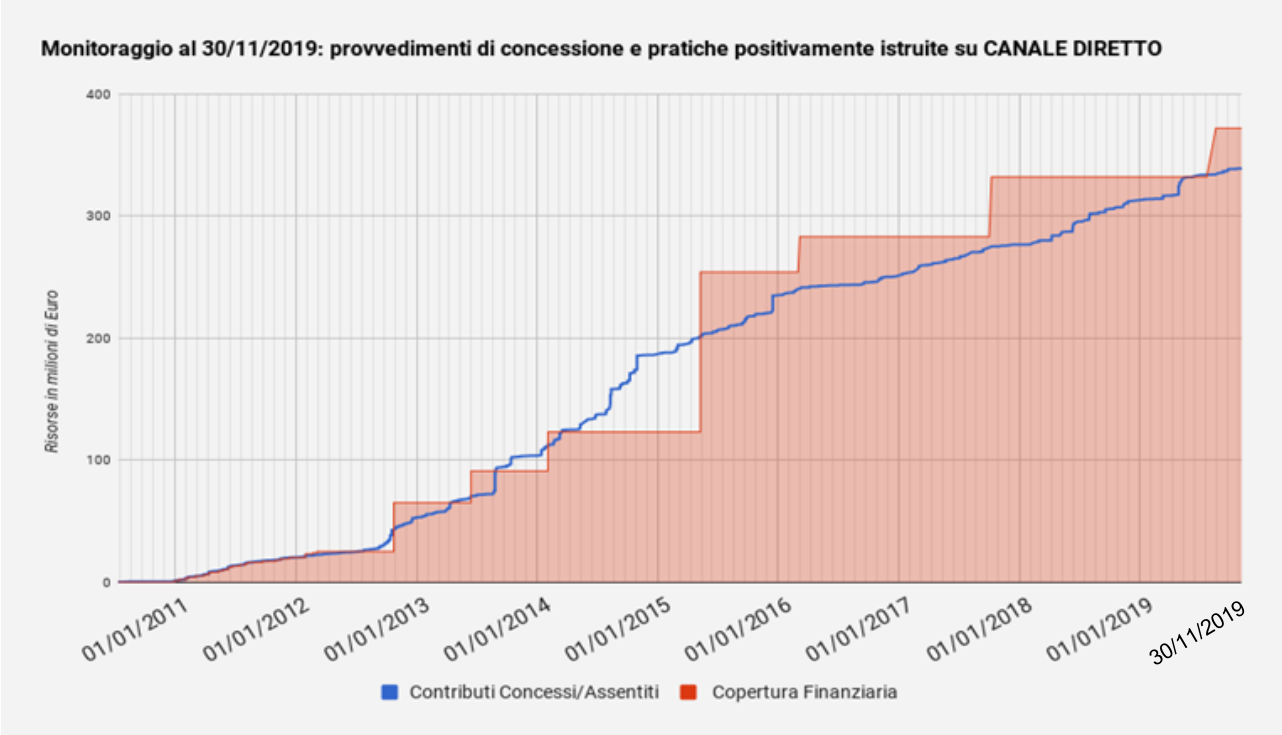

Analogamente a quanto avviene per i Comuni del Cratere, l'USRC assegna le risorse ai singoli comuni per i soli interventi immediatamente attuabili e solo nel caso in cui i Comuni abbiano integralmente impegnato le risorse precedentemente assegnate. La nuova procedura, avviata nel 2015, ha portato questo Ufficio all'assegnazione per competenza di oltre **302 milioni di euro**.

Lo stato di avanzamento della ricostruzione privata fuori cratere è sintetizzato nella seguente tabella.

AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI COMUNI FUORI CRATERE

AO	IMPORTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE AL 31/12/2019	IMPORTO INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO	% AMMESSO	DI CUI:	
				IMPORTI AMMESSI CON CONTRIBUTO USRC	% AMMESSO CON CONTRIBUTO USRC
AO 3	€ 218.594.180,07	€ 156.430.251,30	72%	€ 101.729.207,11	65%
AO 4	€ 45.913.566,11	€ 32.348.125,54	70%	€ 23.648.773,02	73%
AO 5	€ 160.574.206,29	€ 64.346.309,53	40%	€ 41.933.226,30	65%
AO 6	€ 29.900.860,11	€ 11.587.458,66	39%	€ 9.605.454,83	83%
AO 7	€ 265.725.302,49	€ 151.128.353,23	57%	€ 115.566.226,32	76%
AO 9	€ 43.218.746,30	€ 14.744.163,36	34%	€ 9.723.461,96	66%
TOTALE	€ 763.926.861,37	€ 430.584.661,62	56%	€ 302.206.349,54	70%

Di seguito, invece, si riporta il dettaglio per singolo comune:

AO	COMUNE	IMPORTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE AL 31/12/2019	IMPORTO INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO	% AMMESSO	di cui:	
					IMPORTI AMMESSI CON CONTRIBUTO USRC	% AMMESSO CON CONTRIBUTO USRC
AO3	Ancarano	€ 1.703.256,00	€ 744.691,29	44%	€ 186.758,18	25%
AO3	Atri	€ 766.099,29	€ 550.276,70	72%	€ 190.164,82	35%
AO3	Basciano	€ 5.844.008,77	€ 5.044.941,53	86%	€ 3.085.430,61	61%
AO3	Bellante	€ 3.281.769,64	€ 1.344.567,91	41%	€ 286.861,82	21%
AO3	Bisenti	€ 38.223.784,03	€ 37.807.731,25	99%	€ 27.876.144,74	74%
AO3	Campli	€ 4.118.794,36	€ 1.807.059,26	44%	€ 1.167.620,15	65%
AO3	Canzano	€ 7.006.791,70	€ 1.340.851,20	19%	€ 657.103,48	49%
AO3	Castel Castagna	€ 9.126.502,67	€ 7.575.520,78	83%	€ 4.974.955,25	66%
AO3	Castellalto	€ 1.798.716,63	€ 1.061.115,13	59%	€ 149.965,86	14%
AO3	Castiglione Messer Raimondo	€ 11.596.490,04	€ 10.611.371,32	92%	€ 4.396.965,02	41%
AO3	Castilenti	€ 1.568.943,99	€ 1.017.021,59	65%	€ 727.767,97	72%
AO3	Cellino Attanasio	€ 1.970.866,53	€ 1.002.276,13	51%	€ 278.887,72	28%
AO3	Cermignano	€ 12.842.460,77	€ 12.041.074,71	94%	€ 5.067.203,63	42%
AO3	Civitella del Tronto	€ 5.636.503,42	€ 783.674,07	14%	€ 379.790,92	48%
AO3	Controguerra	€ 2.085.706,97	€ 390.280,39	19%	€ 358.287,48	92%
AO3	Corropoli	€ 739.193,90	€ 739.193,89	100%	€ 739.193,89	100%
AO3	Cortino	€ 4.410.594,19	€ 3.431.041,42	78%	€ 3.152.520,85	92%
AO3	Crognaleto	€ 13.436.124,07	€ 10.114.127,85	75%	€ 2.620.952,22	26%
AO3	Giulianova	€ 83.685,60	€ 51.094,07	61%	€ 51.094,07	100%
AO3	Isola del Gran Sasso d'Italia	€ 35.842.024,70	€ 30.774.599,53	86%	€ 28.204.967,34	92%
AO3	Montefino	€ 2.478.350,45	€ 2.439.455,47	98%	€ 491.517,31	20%
AO3	Morro d'Oro	€ 108.904,98	€ 108.755,29	100%	€ -	0%
AO3	Mosciano Sant'Angelo	€ 582.556,60	€ 542.517,24	93%	€ 191.617,24	35%
AO3	Notaresco	€ 453.123,91	€ 209.480,79	46%	€ 197.363,93	94%
AO3	Rocca Santa Maria	€ 516.626,55	€ 331.905,32	64%	€ 92.278,03	28%
AO3	Roseto degli Abruzzi	€ 506.989,97	€ -	0%	€ -	0%
AO3	Sant'Egidio alla Vibrata	€ 746.765,29	€ 312.744,99	42%	€ 34.601,72	11%
AO3	Teramo	€ 31.864.548,86	€ 18.573.610,62	58%	€ 12.745.907,30	69%
AO3	Torano Nuovo	€ 189.641,94	€ 189.641,94	100%	€ 189.641,94	100%
AO3	Torricella Sicura	€ 11.431.902,01	€ 4.652.154,02	41%	€ 2.961.823,56	64%
AO3	Tortoreto	€ 45.084,58	€ 10.000,00	22%	€ 10.000,00	100%
AO3	Valle Castellana	€ 7.587.367,66	€ 827.475,60	11%	€ 261.820,06	32%
	TOTALE AREA OMOGENEA 3	€ 218.594.180	€ 156.430.251	72%	€ 101.729.207	65%

AO	COMUNE	IMPORTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE AL 31/12/2019	IMPORTO INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO	% AMMESSO	di cui:	
					IMPORTI AMMESSI CON CONTRIBUTO USRC	% AMMESSO CON CONTRIBUTO USRC
AO4	Anversa degli Abruzzi	€ 19.001.306,82	€ 18.175.230,56	96%	€ 10.910.913,80	60%
AO4	Calascio	€ 26.912.259,29	€ 14.172.894,98	53%	€ 12.737.859,22	90%
	TOTALE AREA OMOGENEA 4	**€ 45.913.566**	**€ 32.348.126**	**70%**	**€ 23.648.773**	**73%**
AO5	Abbateggio	€ 671.662,33	€ 293.594,79	44%	€ 49.416,02	17%
AO5	Alanno	€ 8.257.289,22	€ 5.294.852,04	64%	€ 1.555.668,45	29%
AO5	Bolognano	€ 1.929.941,98	€ 814.625,91	42%	€ 555.946,74	68%
AO5	Caramanico Terme	€ 86.123,16	€ 64.769,90	75%	€ 35.219,82	54%
AO5	Carpineto della Nora	€ 2.424.999,10	€ 1.184.982,46	49%	€ 362.749,29	31%
AO5	Castiglione a Casauria	€ 14.188.680,17	€ 4.313.544,84	30%	€ 3.899.803,09	90%
AO5	Catignano	€ 7.243.751,92	€ 1.084.525,49	15%	€ 296.767,98	27%
AO5	Cepagatti	€ 90.031,88	€ 90.000,00	100%	€ 80.000,00	89%
AO5	Chieti	€ 6.216.726,29	€ 638.778,05	10%	€ 164.597,44	26%
AO5	Citta' Sant'Angelo	€ 473.304,46	€ 473.304,46	100%	€ 311.923,89	66%
AO5	Civitaquana	€ 7.768.036,82	€ 5.172.082,21	67%	€ 4.379.548,43	85%
AO5	Collecorvino	€ 5.455.906,42	€ 5.449.451,90	100%	€ 5.286.289,19	97%
AO5	Corvara	€ 4.032.407,32	€ 762.642,43	19%	€ 455.522,69	60%
AO5	Elice	€ 1.923.431,27	€ 1.795.493,09	93%	€ 1.372.616,94	76%
AO5	Farindola	€ 3.081.369,61	€ 1.572.138,85	51%	€ 664.095,13	42%
AO5	Guardiagrele	€ 39.857,93	€ 19.841,00	50%	€ -	0%
AO5	Lettomanoppello	€ 1.117.899,93	€ 732.176,62	65%	€ 161.846,91	22%
AO5	Lettopalena	€ 792.999,97	€ 414.839,15	52%	€ 337.903,16	81%
AO5	Loreto Aprutino	€ 6.788.991,62	€ 2.497.108,00	37%	€ 800.646,86	32%
AO5	Manoppello	€ 8.803.618,55	€ 6.326.837,91	72%	€ 4.420.558,85	70%
AO5	Montesilvano	€ 179.791,12	€ -	0%	€ -	0%
AO5	Moscufo	€ 25.895,00	€ 25.895,00	100%	€ -	0%
AO5	Nocciano	€ 1.355.148,15	€ 288.846,24	21%	€ 252.865,15	88%
AO5	Palena	€ 186.290,11	€ -	0%	€ -	0%
AO5	Penne	€ 18.032.914,16	€ 4.231.104,54	23%	€ 1.625.949,68	38%
AO5	Pescara	€ 6.763.817,92	€ 1.944.694,62	29%	€ 1.944.694,62	100%
AO5	Pescosansonesco	€ 1.425.976,40	€ 831.365,38	58%	€ 681.950,22	82%
AO5	Pianella	€ 1.062.201,87	€ 869.900,74	82%	€ 12.299,81	1%
AO5	Picciano	€ 2.039.454,94	€ 1.577.857,70	77%	€ 1.171.703,38	74%
AO5	Pietranico	€ 3.952.161,30	€ 1.675.149,83	42%	€ 932.817,90	56%
AO5	Roccamorice	€ 302.427,48	€ 295.275,17	98%	€ -	0%
AO5	Rosciano	€ 1.026.970,65	€ 1.006.992,82	98%	€ 261.527,93	26%
AO5	San Giovanni Teatino	€ 97.788,13	€ 78.230,50	80%	€ 28.371,11	36%
AO5	San Martino sulla Marrucina	€ 80.000,00	€ 50.172,49	63%	€ 54.640,37	109%
AO5	San Valentino in Abruzzo Citeriore	€ 952.505,87	€ 643.608,90	68%	€ 467.432,37	73%
AO5	Sant'Eufemia a Maiella	€ 1.065.461,07	€ 796.010,92	75%	€ 663.442,81	83%
AO5	Scafa	€ 1.295.609,38	€ 520.777,98	40%	€ 492.760,02	95%
AO5	Tocco da Casauria	€ 34.189.496,35	€ 8.387.902,90	25%	€ 6.763.390,40	81%
AO5	Tollo	€ 114.076,97	€ 53.974,02	47%	€ 53.974,02	100%
AO5	Turrivalignani	€ 1.519.832,89	€ 489.449,46	32%	€ 472.053,64	96%
AO5	Vicoli	€ 2.160.483,56	€ 401.340,47	19%	€ 215.864,90	54%
AO5	Villa Celiera	€ 1.358.873,02	€ 1.182.170,75	87%	€ 646.367,09	55%
	TOTALE AREA OMOGENEA 5	**€ 160.574.206**	**€ 64.346.310**	**40%**	**€ 41.933.226**	**65%**
AO6	Collepietro	€ 7.049.543,91	€ 3.143.432,86	45%	€ 2.232.441,15	71%
AO6	San Benedetto in Perillis	€ 22.851.316,20	€ 8.444.025,80	37%	€ 7.373.013,68	87%
	TOTALE AREA OMOGENEA 6	**€ 29.900.860**	**€ 11.587.459**	**39%**	**€ 9.605.455**	**83%**
AO7	Cansano	€ 2.874.254,90	€ 2.287.340,54	80%	€ 817.341,12	36%
AO7	Castel di Sangro	€ 125.583,42	€ -	0%	€ -	0%
AO7	Corfinio	€ 9.947.814,90	€ 6.426.647,41	65%	€ 6.122.198,49	95%
AO7	Introdacqua	€ 4.855.640,69	€ 2.836.664,76	58%	€ 2.593.739,08	91%
AO7	Molina Aterno	€ 3.634.005,94	€ 1.871.704,54	52%	€ 1.465.645,05	78%
AO7	Pacentro	€ 3.033.084,43	€ 1.911.428,58	63%	€ 1.416.775,47	74%
AO7	Pettorano sul Gizio	€ 2.418.641,98	€ 2.270.562,62	94%	€ 836.370,52	37%
AO7	Pratola Peligna	€ 44.891.099,75	€ 14.698.477,73	33%	€ 13.906.461,08	95%
AO7	Prezza	€ 7.533.574,85	€ 1.454.458,26	19%	€ 1.279.739,70	88%
AO7	Raiano	€ 59.551.244,99	€ 39.152.534,06	66%	€ 35.369.112,51	90%
AO7	Rocca Pia	€ 207.019,28	€ 203.214,50	98%	€ 162.483,31	80%
AO7	Roccacasale	€ 1.473.443,56	€ -	0%	€ -	0%
AO7	Scanno	€ 2.572.592,95	€ 553.233,10	22%	€ 427.079,54	77%
AO7	Secinaro	€ 2.127.315,23	€ 808.013,67	38%	€ 453.281,80	56%
AO7	Sulmona	€ 68.260.140,85	€ 37.961.138,11	56%	€ 22.803.697,81	60%
AO7	Villalago	€ 9.208,18	€ 9.208,18	100%	€ 9.208,18	100%
AO7	Vittorito	€ 52.210.636,59	€ 38.683.727,17	74%	€ 27.903.092,66	72%
	TOTALE AREA OMOGENEA 7	**€ 265.725.302**	**€ 151.128.353**	**57%**	**€ 115.566.226**	**76%**
AO9	Aielli	€ 8.844.721,12	€ 2.013.838,07	23%	€ 1.712.139,01	85%
AO9	Avezzano	€ 1.686.149,14	€ 499.634,22	30%	€ 282.656,78	57%
AO9	Bisegna	€ 182.908,64	€ 181.993,27	99%	€ 172.878,64	95%
AO9	Celano	€ 23.698.072,46	€ 7.645.540,96	32%	€ 3.476.524,87	45%
AO9	Cerchio	€ 8.000,00	€ 8.000,00	100%	€ -	0%
AO9	Magliano de' Marsi	€ 2.757.486,36	€ 2.134.123,36	77%	€ 1.788.138,43	84%
AO9	Massa d'Albe	€ 963.786,98	€ 183.034,32	19%	€ 33.034,32	18%
AO9	Ortona dei Marsi	€ 1.587.643,23	€ 1.291.700,54	81%	€ 1.066.232,41	83%
AO9	Ortucchio	€ 90.518,92	€ -	0%	€ -	0%
AO9	Pescina	€ 301.394,86	€ 254.141,53	84%	€ 58.226,31	23%
AO9	San Benedetto dei Marsi	€ 2.524.682,65	€ 119.635,00	5%	€ 921.109,10	770%
AO9	Sante Marie	€ 117.983,14	€ -	0%	€ -	0%
AO9	Trasacco	€ 212.522,09	€ 212.522,09	100%	€ 212.522,09	100%
AO9	Villavallelonga	€ 242.876,71	€ 200.000,00	82%	€ -	0%
	TOTALE AREA OMOGENEA 9	**€ 43.218.746**	**€ 14.744.163**	**34%**	**€ 9.723.462**	**66%**

A far data dal 2014, la Delibera CIPE 1/2014 ha previsto che *"Al fine di garantire uniformità nei processi amministrativi e nelle valutazioni che si concludono con la concessione dei contributi per la ricostruzione dell'edilizia privata, anche i Comuni fuori dal cratere sismico si avvarranno, per l'istruttoria delle pratiche volte alla concessione dei detti contributi, degli Uffici territoriali della ricostruzione dei Comuni del cratere – coordinati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere – con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.* I Comuni hanno aderito agli Sportelli Decentrati USRC *"di frontiera",* passando dalle 28 adesioni del 2013 alle 75 del 2018, nelle province di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Questo processo ha portato all'interno degli Sportelli Decentrati USRC **1.107 pratiche** (di cui 296 evase), per un importo complessivamente richiesto di circa **270 milioni di euro** (di cui ca 85 milioni € ammessi a contributo).
Di seguito il dettaglio per area omogenea.

SP	nrPratiche ACQUISITE SPORTELLO	IMPORTO RICHIESTO	NrPratiche RICONOSCIUTO POSITIVO	IMPORTO RICONOSCIUTO POSITIVO al 31/12/2018
SP Dec 3	232	€ 30.614.226,00	61	€ 8.731.088,00
SP Dec 4	47	€ 21.805.728,00	39	€ 13.494.849,00
SP Dec 5	439	€ 84.063.269,00	80	€ 16.226.101,00
SP Dec 6	40	€ 19.873.389,00	28	€ 8.933.980,00
SP Dec 7	214	€ 91.042.371,00	53	€ 32.780.693,00
SP Dec 9	135	€ 22.475.847,00	35	€ 4.778.634,00
	1107	**€ 269.874.830,00**	**296**	**€ 84.945.345,00**

Dal 1° luglio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione sono soppressi (co. 32 art. 32-bis L.n.172/2017). Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131/2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.
Allo stato attuale, a seguito delle modifiche normative intervenute con la L.172/2017 è in corso il processo di riorganizzazione dell'USRC, che coinvolge in particolar modo la ricostruzione privata dei Comuni fuori cratere già convenzionati con alcuni Comuni sede degli Sportelli Decentrati per lo svolgimento delle istruttorie per la verifica di ammissibilità a contributo. Il personale originariamente dedicato a tale attività contrattualizzato dai Comuni sede di UTR non può essere più assunto nelle forme in cui ha operato fino al 2018, per il mancato stanziamento della copertura finanziaria. Da allora, si è dovuto attendere il DL 18 aprile 2019, n. 32 - *c.d. sblocca cantieri* – che ha stanziato i fondi all'USRC necessari per contrattualizzare nuovo personale dedicato a tali attività. Da allora sono state reclutate nel 2019 nove consulenti esperti per le istruttorie, nominati 4 responsabili del procedimento tra i dipendenti USRC, e contrattualizzate 4 figure interinali, con le quali è stata così consentita la ripresa delle attività istruttorie (pratiche e SAL) con

l'assegnazione di 370 pratiche su 750 giacenti, e l'avvio di ca 200 delle 750, per complessivi 65 mil€ di pratiche avviate su 145 mil€ totali in attesa di ammissione.

Di seguito il dettaglio per singola area omogenea.

RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI COMUNI FUORI CRATERE pratiche assegnate/avviate da USRC post 31/12/2018 *(chiusura attività Sportelli)*										
AREA OMOGENEA	NR PRATICHE	IMPORTO	AVVIATE SPORTELLO IN ATTESA D'INTEGRAZIONE	IMPORTO	ASSEGNATE TECNICI USRC	IMPORTO	AVVIATE USRC	IMPORTO	DA ASSEGNARE/AVVIARE	IMPORTO
AO3	169	18.762.385,07 €	20	2.257.399,77 €	83	11.970.163,95 €	15	2.297.589,92 €	86	6.792.221,12 €
AO4	9	4.321.985,33 €	4	1.250.465,26 €	5	3.071.520,07 €	3	1.809.964,39 €	4	1.250.465,26 €
AO5	353	58.587.825,47 €	32	7.067.936,81 €	199	39.129.494,69 €	115	28.154.800,32 €	154	19.458.330,78 €
AO6	17	12.472.516,74 €	1	82.025,02 €	9	9.560.811,66 €	9	9.560.811,66 €	8	2.911.705,08 €
AO7	117	39.597.482,95 €	19	6.220.634,17 €	67	22.637.755,23 €	52	19.818.593,74 €	50	16.959.727,72 €
AO9	85	11.216.474,02 €	77	7.515.676,80 €	7	3.323.325,56 €	7	3.323.325,56 €	78	7.893.148,46 €
	750	144.958.669,58 €	153	24.394.137,83 €	370	89.693.071,16 €	201	64.965.085,59 €	380	55.265.598,42 €

Di seguito il dettaglio pratiche avviate per ogni singolo comune:

AREA OMOGENEA	COMUNE	AVVIATE USRC	IMPORTO
AO3	ATRI	1	188.222,60 €
AO3	CANZANO	2	303.574,30 €
AO3	CELLINO ATTANASIO	1	80.000,00 €
AO3	NOTARESCO	2	158.743,92 €
AO3	TERAMO	6	472.715,91 €
AO3	VALLE CASTELLANA	3	1.094.333,19 €
AO4	CALASCIO	3	1.809.964,39 €
AO5	ALANNO	8	614.341,36 €
AO5	BOLOGNANO	8	695.532,75 €
AO5	CARPINETO DELLA NORA	2	307.342,50 €
AO5	CASTIGLIONE A CASAURIA	5	5.277.933,51 €
AO5	CATIGNANO	18	2.791.301,15 €
AO5	CORVARA	9	1.427.013,56 €
AO5	FARA FILIORUM PETRI	1	207.822,00 €
AO5	FARINDOLA	4	527.501,26 €
AO5	LETTOMANOPPELLO	2	207.225,81 €
AO5	LORETO APRUTINO	6	502.037,50 €
AO5	NOCCIANO	2	755.835,55 €
AO5	PALENA	1	13.613,38 €
AO5	PENNE	24	5.180.586,66 €
AO5	PIETRANICO	1	134.782,98 €
AO5	SCAFA	7	406.954,51 €
AO5	TOCCO DA CASAURIA	11	8.518.130,78 €
AO5	TURRIVALIGNANI	1	42.219,50 €
AO5	VICOLI	5	544.625,56 €
AO6	COLLEPIETRO	1	1.010.900,44 €
AO6	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	8	8.549.911,22 €
AO7	CANSANO	1	464.762,84 €
AO7	CORFINIO	1	601.657,69 €
AO7	INTRODACQUA	8	533.746,91 €
AO7	MOLINA ATERNO	1	49.985,23 €
AO7	PACENTRO	4	141.164,95 €
AO7	PREZZA	5	2.047.385,08 €
AO7	RAIANO	8	8.911.823,52 €
AO7	SECINARO	2	607.854,34 €
AO7	SULMONA	21	3.174.786,37 €
AO7	VITTORITO	1	3.285.426,81 €
AO9	AIELLI	2	2.779.542,26 €
AO9	AVEZZANO	1	227.639,37 €
AO9	MASSA D'ALBE	2	94.426,11 €
AO9	SAN BENEDETTO DEI MARSI	2	221.717,82 €
		201	64.965.085,59 €

Per quanta riguarda l'istruttoria dei SAL ereditati da USRC, ad oggi le richieste di liquidazione gestite dall'USRC risultano le seguenti:

RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI COMUNI FUORI CRATERE stati avanzamneto lavori assegnate/avviate da USRC post 31/12/2018 *(chiusura attività Sportelli)*						
AREA OMOGENEA	**NR SAL**	**LIQUIDATI**	**IMPORTO**	**IN ATTESA D'INTEGRAZIONE**	**IN ISTRUTTORIA INTEGRAZIONE**	**IN ISTRUTTORIA**
AO3	30	10	1.091.861,81 €	3	5	12
AO4	10	2	473.452,23 €	0	4	4
AO5	31	13	1.430.866,20 €	1	3	14
AO6	12	4	650.560,93 €	1	2	5
AO7	19	9	766.838,40 €	2	1	7
AO9	22	7	1.039.879,47 €	1	6	8
	124	45	5.453.459,04 €	8	21	50

Nell'ambito dei processi di ricostruzione, anche per i comuni Fuori Cratere l'USRC effettua il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Le abitazioni per le quali è stata ripristinata l'agibilità ad oggi risultano 1.819 su un totale di circa 3.610 abitazioni inagibili; e sono attualmente aperti 582 cantieri.

Infine, analogamente a quanto avviene per la ricostruzione privata dei comuni del cratere, l'USRC esegue il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata ex. art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012. Il monitoraggio, realizzato interamente on-line con l'aggiornamento della Banca Dati dell'Emergenza (BDE), è inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato sul sito www.usrc.it.

Al **31/12/2019** l'USRC ha assegnato complessivamente **302 M€,** di cui trasferiti **220 M€**.

	Assegnazioni USRC	**Utilizzi USRC**
A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC	**€ 346.770.424,74**	
B. Totale utilizzi USRC Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni Fuori Cratere		**€ 302.206.349,47**
C. Totale Disponibile Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Fuori Cratere		**€ 44.831.193,68** **(comprensivi residui gestioni precedenti)**

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 114 Comuni del Fuori Cratere e rappresentano circa il 90% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

Nel corso del **2019** sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 40.976.771,43** a 52 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati finanziamenti a 24 comuni per complessivi **€ 43.464.881,61.** Si riporta di seguito il dettaglio fondi ricostruzione privata fuori cratere per singolo comune.

	COMUNE	ASSEGNAZIONE FONDI			EROGAZIONE FONDI		
			IMPORTO (€)	VARIAZIONE ULTIMO REPORT		IMPORTO (€)	VARIAZIONE ULTIMO REPORT
	COMUNE DI AIELLI	1	€ 1.438.579,78	€ -	1	€ 405.840,23	€ -
	COMUNE DI ALANNO	0	€ -	€ -	1	€ 117.408,34	€ -
	COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI	0	€ -	€ -	3	€ 1.090.625,03	€ -
	COMUNE DI ATRI	0	€ -	€ -	1	€ 7.067,32	€ -
	COMUNE DI AVEZZANO	0	€ -	€ -	1	€ 62.780,24	€ -
	COMUNE DI BASCIANO	1	€ 99.923,83	€ -	1	€ 293.640,48	€ -
	COMUNE DI BELLANTE	1	€ 135.785,32	€ -	1	€ 66.034,11	€ -
	COMUNE DI BISEGNA	0	€ -	€ -	1	€ 18.214,15	€ -
	COMUNE DI BISENTI	1	€ 9.224.992,49	€ -	3	€ 5.908.974,58	€ -
	COMUNE DI BOLOGNANO	1	€ 7.883,66	€ -	1	€ 41.575,65	€ -
	COMUNE DI CALASCIO	1	€ 742.391,29	€ -	1	€ 1.997.134,75	€ -
	COMUNE DI CAMPLI	1	€ 177.237,09	€ -	2	€ 277.480,37	€ 146.596,89
	COMUNE DI CANZANO	1	€ 27.099,36	€ -	1	€ 150.536,72	€ -
	COMUNE DI CASTEL CASTAGNA	2	€ 1.036.824,89	€ 956.847,88	0	€ -	€ -
	COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA	1	€ 160.887,58	€ -	0	€ -	€ -
	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	2	€ 1.798.309,24	€ -	2	€ 664.711,92	€ 585.402,71
	COMUNE DI CASTILENTI	0	€ -	€ -	1	€ 20.509,28	€ -
	COMUNE DI CATIGNANO	1	€ 22.260,37	€ -	1	€ 17.075,61	€ -
	COMUNE DI CELANO	0	€ -	€ -	1	€ 324.074,28	€ -
	COMUNE DI CELLINO ATTANASIO	1	€ 63.716,86	€ -	0	€ -	€ -
	COMUNE DI CEPAGATTI	0	€ -	€ -	1	€ 23.270,67	€ -
	COMUNE DI CERMIGNANO	0	€ -	€ -	2	€ 605.555,20	€ -
	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	0	€ -	€ -	1	€ 73.622,23	€ -
	COMUNE DI CIVITAQUANA	0	€ -	€ -	1	€ 788.367,64	€ -
	COMUNE DI COLLECORVINO	1	€ 4.932.043,63	€ -	2	€ 1.577.248,27	€ -
	COMUNE DI CONTROGUERRA	1	€ 5.206,39	€ -	2	€ 182.726,61	€ -
	COMUNE DI CORFINIO	1	€ 349.093,42	€ -	2	€ 417.129,00	€ -
	COMUNE DI CORTINO	0	€ -	€ -	1	€ 645.891,21	€ -
	COMUNE DI ELICE	0	€ -	€ -	1	€ 112.971,88	€ -
	COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI	0	€ -	€ -	0	€ -	€ -
	COMUNE DI FARINDOLA	0	€ -	€ -	2	€ 124.381,44	€ 65.506,77
	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	1	€ 2.462.765,52	€ -	2	€ 4.638.212,18	€ 2.344.036,00
	COMUNE DI LETTOPALENA	1	€ 308.053,66	€ -	0	€ -	€ -
	COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI	0	€ -	€ -	2	€ 1.026.719,88	€ 549.223,89
	COMUNE DI MANOPPELLO	0	€ -	€ -	1	€ 347.269,03	€ -
	COMUNE DI MONTEFINO	0	€ -	€ -	1	€ 53.619,22	€ 53.619,22
	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	0	€ -	€ -	1	€ 69.374,70	€ -
	COMUNE DI PACENTRO	0	€ -	€ -	1	€ 161.751,48	€ -
	COMUNE DI PENNE	0	€ -	€ -	1	€ 181.838,99	€ 181.838,99
	COMUNE DI PESCARA	1	€ 1.912.968,33	€ -	1	€ 28.855,68	€ -
	COMUNE DI PICCIANO	1	€ 281.480,68	€ -	1	€ 208.859,18	€ -
	COMUNE DI PIETRANICO	0	€ -	€ -	1	€ 116.273,01	€ -
	COMUNE DI PRATOLA PELIGNA	3	€ 3.935.261,96	€ -	1	€ 880.077,89	€ -
	COMUNE DI RAIANO	2	€ 1.051.988,76	€ -	2	€ 4.851.572,97	€ 1.998.269,71
	COMUNE DI ROSCIANO	0	€ -	€ -	1	€ 21.708,94	€ 21.708,94
	COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS	3	€ 2.522.793,61	€ -	3	€ 2.576.687,57	€ -
	COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA	0	€ -	€ -	2	€ 118.696,52	€ 47.928,01
	COMUNE DI SCANNO	0	€ -	€ -	1	€ 85.503,58	€ -
	COMUNE DI SULMONA	3	€ 3.840.358,10	€ 1.873.458,50	1	€ 952.964,44	€ -
	COMUNE DI TERAMO	1	€ 900.627,06	€ -	1	€ 1.665.543,31	€ -
	COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA	0	€ -	€ -	2	€ 975.381,25	€ -
	COMUNE DI TORANO NUOVO	0	€ -	€ -	1	€ 56.892,58	€ -
	COMUNE DI TORRICELLA SICURA	1	€ 95.608,73	€ -	1	€ 285.760,98	€ -
	COMUNE DI TORTORETO	1	€ 10.000,00	€ -	1	€ 10.000,00	€ -
	COMUNE DI VICOLI	0	€ -	€ -	2	€ 124.281,40	€ -
	COMUNE DI VILLA CELIERA	0	€ -	€ -	1	€ 58.441,44	€ 58.441,44
	COMUNE DI VITTORITO	2	€ 5.920.740,00	€ -	2	€ 5.465.638,00	€ -
	TOTALE	**38**	**€ 43.464.881,61**	**€ 2.830.306,38**	**72**	**€ 40.976.771,43**	**€ 6.052.572,57**

5 RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Nel rispetto del riparto di competenze previsto nella gestione ordinaria, l'USRC cura la programmazione delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica, effettua il trasferimento delle somme e cura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi così come stabilito dal decreto del MEF del 20/10/2012.

In primo luogo, nel 2013 è stata definita la **Programmazione triennale della Ricostruzione Pubblica (2013 - 2015)**, finanziata dalla delibera CIPE 135/2012, per un importo complessivo di **126,45 milioni di euro,** così distribuiti:

- **76.7 milioni di euro** destinati ad interventi di ricostruzione pubblica relativi a *Case Comunali, Infrastrutture, Reti, Edilizia Residenziale Pubblica, Centri di Aggregazione, Edilizia Cimiteriale*;
- **49.8 milioni di euro** destinati all'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica di *reti servizi* e *spazi pubblici* all'interno dei Piani di Ricostruzione e alla *messa in sicurezza del sottosuolo interessato da cavità naturali e antropiche* che inficiano la ricostruzione pubblica e privata.

Il documento riepilogativo, disponibile nella sezione dedicata del sito www.usrc.it all'indirizzo http://www.usrc.it/index.php/attivita/ricostruzione-pubblica/programmazione-2013-2015, indica gli interventi di competenza dei Comuni del cratere.

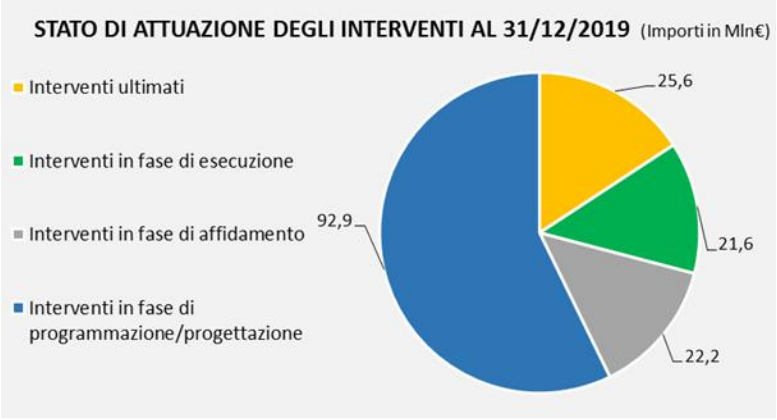

Sono ad oggi **186 i progetti finanziati in via definitiva**, per complessivi **69,4 mln€**, che rappresentano complessivamente oltre il 60% degli interventi programmati.

Di questi:

- **92** interventi sono ultimati o in fase di collaudo, per un importo pari a **25,6 mln€**;
- **36** interventi con lavori in corso, per un importo pari a **21,6 mln€**;
- **52** interventi per i quali è in corso l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, per un importo pari a **22,2 mln€.**

Risultano inoltre **123 interventi programmati**, con una copertura finanziaria di complessivi **92,9 mln€**.

Per l'attuazione degli interventi afferenti alla **Programmazione triennale della Ricostruzione Pubblica**, sono stati trasferiti ai Comuni per il pagamento dei lavori eseguiti **€ 40.755.488,61**.

Alcuni interventi ultimati finanziati con la deliberazione CIPE 135/2012:

Comune di **Barisciano (AQ)**
Municipio € 1.692.000,00

Comune di **Villa Sant'Angelo (AQ)**
Municipio € 293.431,00

Comune di **Civitella Casanova (PE)**
Municipio € 876.895,00

Comune di **Carapelle Calvisio (AQ)**
Municipio € 398.887,00

Comune di **San Pio delle Camere (AQ)**
Municipio € 1.149.743,00

Comune di **Montereale (AQ)**
Scuola Media € 1.919.033,46

La **Delibera CIPE 48/2016** ha assegnato risorse per garantire la continuità della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo. In attesa della definizione e dell'andata a regime dei Programmi pluriennali di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione, è stato approvato un "Piano Stralcio", *una tantum*, per velocizzare i processi di ricostruzione dei territori interessati. In particolare, il CIPE con la suddetta delibera:

- ha definito gli indirizzi, i criteri e le modalità per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi Piani annuali di attuazione; al fine di razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica, così da conseguire adeguati livelli di coordinamento, efficienza ed efficacia degli interventi stessi, in linea con quanto disposto dal decreto-legge n. 78/2015;
- ha approvato e assegnato risorse per la realizzazione del Piano Stralcio, disponendo, in particolare, l'assegnazione dell'importo complessivo di 57.417.829,28 euro, a valere sulle disponibilità delle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per l'anno 2016.

In particolare, sono stati finanziati nei comuni del Cratere i seguenti interventi per **€ 14.518.905,01**:

Intervento	Stazione Appaltante	Importo	
Completamento Castello Piccolomini-casa Comunale. **Comune di Capestrano**	Provveditorato Interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna	€ 554.970,00	
Completamento intervento per riparazione e ripristino dell'edificio Comunale Polivalente Palazzo Tinozzi. **Comune di Cugnoli**	Provincia di Pescara	€ 896.360,23	
Palazzo Muzi, II Stralcio. **Comune di Fontecchio**	Provveditorato Interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna	€ 4.752.204,00	
Ristrutturazione dell'ex Convento di Sant'Angelo d'Ocre. **Comune di Ocre**	Provveditorato Interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna	€ 4.157.104,00	

Completamento ex scuola elementare da destinare a Casa Comunale. **Comune di San Demetrio ne' Vestini**	Provveditorato Interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna	€ 1.994.768,00	
Programmazione, esecuzione e analisi delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche e progettazione preliminare delle opere di messa in sicurezza delle cavità sotterranee. **Comuni di Fagnano Alto, Barisciano, Navelli, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini.**	Provveditorato Interregionale OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna	€ 2.163.498,78	

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018 la **Delibera CIPE 28 febbraio 2018 n. 24** *"Sisma Abruzzo 2009 – assegnazione di risorse al settore di ricostruzione pubblica "Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali"*.

Il Comitato ha approvato il Piano annuale 2018, predisposto dalla Struttura di missione in collaborazione con gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativo al Settore di ricostruzione pubblica *"Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali"*, assegnando l'importo complessivo di euro 81.685.696,42, di cui euro 60.388.383,79 all'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila ed **euro 21.297.312,63** all'**Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.**

Il Piano Annuale ha individuato 64 interventi – 24 nel comune dell'Aquila, **21** negli altri comuni del **cratere** e **14** nei comuni **fuori cratere** sismico – per il ripristino di sedi istituzionali e altri edifici strategici, strutture ricreative e sportive, edilizia cimiteriale, nonché chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel corso del **2019** sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 8.812.449,58** a 46 soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica e sono stati assegnati finanziamenti a 32 comuni per interventi pubblici pari a **€ 17.226.101,72.** Si riporta di seguito il dettaglio fondi OOPP per singolo comune.

RICOSTRUZIONE OOPP – ASSEGNAZIONI ED EROGAZIONI - DETTAGLIO PER COMUNE

AO	COMUNE	ASSEGNAZIONE FONDI			EROGAZIONE FONDI		
			IMPORTO (€)	VARIAZIONE ULTIMO REPORT		IMPORTO (€)	VARIAZIONE ULTIMO REPORT
2	COMUNE DI BARETE	1	€ 1.160.000,00	€ -	2	€ 152.936,97	€ -
2	COMUNE DI CAPITIGNANO	1	€ 97.500,00	€ -	1	€ 2.283,84	€ -
2	COMUNE DI SCOPPITO	2	€ 240.000,00	€ -	3	€ 174.025,42	€ -
2	COMUNE DI TORNIMPARTE	0	€ -	€ -	1	€ 1.494,50	€ -
3	COMUNE DI ARSITA	0	€ -	€ -	2	€ 27.330,01	€ -
3	COMUNE DI CASTELLI	0	€ -	€ -	2	€ 124.997,48	€ 96.259,16
3	COMUNE DI COLLEDARA	0	€ -	€ -	2	€ 106.733,60	€ -
3	COMUNE DI FANO ADRIANO	0	€ -	€ -	1	€ 1.268,80	€ -
3	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	4	€ 230.556,18	€ 50.280,07	2	€ 2.801,74	€ -
3	COMUNE DI TOSSICIA	1	€ 38.806,15	€ -	0	€ -	€ -
4	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE	1	€ 2.390.000,00	€ -	1	€ 32.803,65	€ -
4	COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO	0	€ -	€ -	5	€ 241.056,95	€ -
5	COMUNE DI BRITTOLI	1	€ 344.687,00	€ -	5	€ 329.160,76	€ -
5	COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO	1	€ 23.634,00	€ -	1	€ 35.257,55	€ -
5	COMUNE DI CAPESTRANO	2	€ 342.585,20	€ -	1	€ 52.470,02	€ 52.470,02
5	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	4	€ 1.371.261,95	€ -	5	€ 228.623,03	€ -
5	COMUNE DI CUGNOLI	3	€ 386.000,00	€ 286.000,00	0	€ -	€ -
5	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	2	€ 655.430,26	€ 28.521,02	6	€ 509.398,99	€ 9.936,73
5	COMUNE DI OFENA	1	€ 800.000,00	€ -	0	€ -	€ -
5	COMUNE DI POPOLI	0	€ -	€ -	2	€ 494.667,80	€ -
6	COMUNE DI CAPORCIANO	2	€ 101.327,82	€ -	2	€ 134.241,78	€ 106.497,07
6	COMUNE DI NAVELLI	2	€ 335.000,00	€ -	4	€ 779.483,30	€ -
6	COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA	2	€ 50.171,70	€ -	6	€ 184.755,16	€ -
6	COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE	2	€ 1.186.742,81	€ -	9	€ 848.598,21	€ -
6	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO	1	€ 1.785.103,10	€ -	2	€ 139.611,38	€ -
7	COMUNE DI BUGNARA	0	€ -	€ -	2	€ 269.776,20	€ 97.038,07
7	COMUNE DI CASTEL DI IERI	3	€ 942.361,11	€ -	1	€ 25.890,00	€ 25.890,00
7	COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO	1	€ 131.515,36	€ 131.515,36	2	€ 97.440,64	€ -
7	COMUNE DI COCULLO	0	€ -	€ -	2	€ 31.370,13	€ -
7	COMUNE DI COLLARMELE	1	€ 49.933,67	€ -	4	€ 142.564,82	€ -
7	COMUNE DI GAGLIANO ATERNO	1	€ 36.836,00	€ -	1	€ 105.045,10	€ -
7	COMUNE DI GORIANO SICOLI	1	€ 43.600,00	€ -	1	€ 31.014,81	€ -
8	COMUNE DI ACCIANO	1	€ 417.000,00	€ -	2	€ 147.658,76	€ -
8	COMUNE DI BARISCIANO	2	€ 494.361,44	€ 195.865,44	2	€ 899.990,19	€ -
8	COMUNE DI FONTECCHIO	1	€ 100.000,00	€ -	4	€ 109.972,43	€ -
8	COMUNE DI FOSSA	0	€ -	€ -	2	€ 86.069,75	€ -
8	COMUNE DI OCRE	1	€ 500.000,00	€ -	4	€ 186.978,63	€ 47.112,17
8	COMUNE DI POGGIO PICENZE	1	€ 196.577,79	€ -	3	€ 123.613,21	€ -
8	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI	5	€ 483.233,11	€ 16.451,37	11	€ 863.256,99	€ 49.930,85
8	COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE	0	€ -	€ -	1	€ 198.540,10	€ -
8	COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI	1	€ 37.414,39	€ 37.414,39	1	€ 34.577,67	€ -
8	COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO	3	€ 1.104.774,68	€ 313.337,33	8	€ 410.842,43	€ -
9	COMUNE DI LUCOLI	0	€ -	€ -	2	€ 81.405,09	€ -
9	COMUNE DI OVINDOLI	1	€ 1.149.688,00	€ -	1	€ 52.108,00	€ -
FC	COMUNE DI CALASCIO	0	€ -	€ -	2	€ 65.273,34	€ -
FC	COMUNE DI CORFINIO	0	€ -	€ -	1	€ 66.061,34	€ -
FC	COMUNE DI RAIANO	0	€ -	€ -	2	€ 129.946,84	€ -
FC	COMUNE DI ROCCACASALE	0	€ -	€ -	2	€ 44.835,47	€ -
FC	COMUNE DI VITTORITO	0	€ -	€ -	1	€ 4.216,70	€ 4.216,70
	TOTALE	**56**	**€ 17.226.101,72**	**€ 1.059.384,98**	**127**	**€ 8.812.449,58**	**€ 489.350,77**

6 EDILIZIA SCOLASTICA

Con Decreto DiSET n. 48 del 14 marzo 2013, sono state trasferite all'USRC le competenze per l'attuazione del Piano denominato **"Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza"**, finalizzato alla riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009, per tutte le scuole della Regione Abruzzo ad eccezione di quelli ricadenti nel Comune di L'Aquila, per una somma di **€ 155.787.593,30**.

Le competenze riguardano la conclusione delle procedure per il secondo programma stralcio, quasi completamente avviato nel 2011 dal Commissario Delegato per la Ricostruzione, e l'avvio del terzo programma stralcio.

Con Delibera CIPE 85/2013 è stata approvata la rimodulazione del Piano, predisposta dall'USRC su proposta delle Amministrazioni interessate, che ha aggiornato e modificato l'elenco delle scuole finanziate lasciando inalterate le assegnazioni di fondi a ciascuna Amministrazione beneficiaria.

Gli interventi previsti riguardano la **riparazione**, il **miglioramento sismico** e, in alcuni casi, la **costruzione di nuovi edifici scolastici** coinvolgendo oltre **150 edifici**, **4 province** e **96 comuni**, e quasi **30.000 studenti** abruzzesi.

Con la **Delibera CIPE n.77 del 6 agosto 2015** sono state assegnate risorse pari a **€ 6.237.211,00** destinate a interventi nei comuni del cratere e fuori del cratere. La **Deliberazione del CIPE n. 48/2016** ha assegnato ulteriori fondi pari ad **€ 8.342.067,76**.

Con **Delibera CIPE n. 110/2017** è stato approvato il Piano annuale 2018 per l'istruzione primaria e secondaria e sono stati assegnati complessivamente € 24.234.547,06 per un totale di 46 interventi, 29 dei quali già interessati dal Piano "Scuole d'Abruzzo-Il Futuro in Sicurezza", eccetto quelli ricadenti sul territorio comunale dell'Aquila, individuando come Soggetto competente e responsabile il MIUR. Successivamente la **Delibera n. CIPE n. 32/2019** ha modificato le precedenti Delibere n. 48/2016 e n. 110/2017 assegnando al MIUR la competenza della programmazione del Settore ed agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, nell'ambito territoriale di propria competenza, la responsabilità di attuazione del Piano annuale.

I requisiti degli interventi ammissibili a finanziamento (tra i quali, il nesso di causalità con il sisma, la funzionalità scolastica, il raggiungimento di un indicatore di rischio sismico almeno pari a 0.65) sono individuati nel **"Disciplinare relativo agli interventi di cui al D.C.D. 89/2011"**, e nelle **"Linee guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell'allegato al D.C.D. n. 89/2011"**, predisposti dall'USRC per fornire chiare indicazioni ai soggetti attuatori (Province e Comuni).

ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI

Comune di Ovindoli
Scuola materna ed elementare

Adeguamento sismico dell'edificio scolastico e sostituzione edilizia della palestra - € 1.475.000,00

Comune di Montereale
Scuola media

Intervento di sostituzione edilizia
€ 1.919.033,46

Comune di Vittorito
Scuola elementare

Intervento di sostituzione edilizia
€ 1.008.000,00

Comune di Raiano
Scuola elementare

Intervento di sostituzione edilizia
€ 3.160.000,00

Sulla base dei criteri e delle procedure definiti dall'USRC nel 2013, ad oggi sono stati **approvati 98 interventi per oltre 96 milioni di euro, immediatamente cantierabili, e sono state trasferite agli enti attuatori risorse per 66,6 milioni di euro.**

Dei **98** interventi approvati, **57** hanno concluso i lavori, **28** cantieri sono in corso e **13** stanno espletando le procedure di gara.

Gli interventi riguardano edifici che hanno manifestato un'elevata vulnerabilità sismica e sono finalizzati al raggiungimento del massimo livello di sicurezza conseguibile con il finanziamento disponibile; per quasi la metà di essi è prevista la sostituzione dei vecchi fabbricati con nuovi edifici scolastici.

Nel corso del **2019** sono stati complessivamente trasferiti a 27 soggetti attuatori **€ 12.636.213,55** per l'attuazione degli interventi e sono stati assegnati finanziamenti a 5 soggetti attuatori pari a **€ 4.160.718,11.**

Si riporta di seguito la tabella dei fondi USRC per l'edilizia scolastica attribuiti ai singoli comuni.

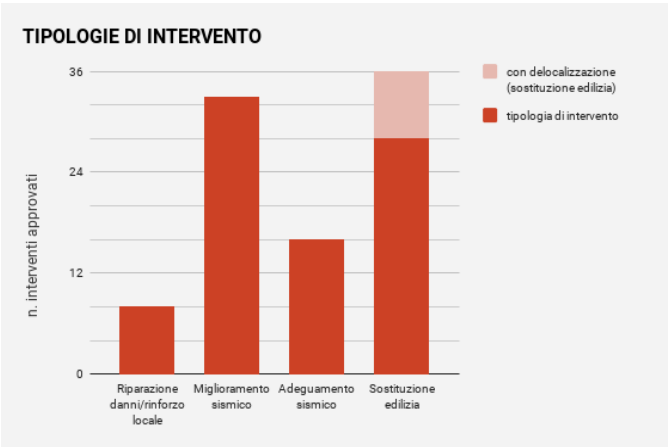

AO	COMUNE	ASSEGNAZIONE FONDI			EROGAZIONE FONDI		
		N.	IMPORTO (€)	VARIAZIONE ULTIMO REPORT	N.	IMPORTO (€)	VARIAZIONE ULTIMO REPORT
	COMUNE DI PACENTRO	0	€ -	€ -	1	€ 594.987,65	€ -
	COMUNE DI LECCE NEI MARSI	0	€ -	€ -	1	€ 161.000,00	€ -
	PROVINCIA DI PESCARA	0	€ -	€ -	2	€ 402.817,83	€ -
	COMUNE DI LORETO APRUTINO	0	€ -	€ -	1	€ 40.648,65	€ -
	COMUNE DI CELLINO ATTANASIO	0	€ -	€ -	1	€ 230.354,22	€ -
	COMUNE DI PIANELLA	0	€ -	€ -	2	€ 236.320,56	€ -
	COMUNE DI CATIGNANO	0	€ -	€ -	1	€ 21.590,90	€ -
	COMUNE DI AVEZZANO	0	€ -	€ -	7	€ 5.079.879,45	€ 186.544,86
	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	1	€ 993.066,11	€ -	2	€ 384.836,04	€ -
	PROVINCIA DI TERAMO	0	€ -	€ -	4	€ 1.270.655,04	€ -
	COMUNE DI ORICOLA	0	€ -	€ -	1	€ 77.773,70	€ -
	COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI	0	€ -	€ -	1	€ 148.429,04	€ -
	COMUNE DI CARSOLI	0	€ -	€ -	1	€ 890.691,94	€ -
	CASTELVECCHIO SUBEQUO	0	€ -	€ -	1	€ 38.458,94	€ -
	COMUNE DI ROCCA DI BOTTE	0	€ -	€ -	1	€ 233.828,66	€ -
	COMUNE DI SAN VALENTINO IN A. C.	1	€ 50.000,00	€ -	1	€ 45.182,30	€ -
	COMUNE DI SULMONA	1	€ 87.652,00	€ -	1	€ 34.885,50	€ 34.885,50
	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO	0	€ -	€ -	2	€ 904.697,87	€ 188.091,20
	COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI	0	€ -	€ -	1	€ 360.908,14	€ -
	COMUNE DI CAMPLI	0	€ -	€ -	1	€ 225.518,47	€ -
	COMUNE DI BUGNARA	0	€ -	€ -	1	€ 112.952,31	€ -
	COMUNE DI CELANO	1	€ 2.950.000,00	€ -	0	€ -	€ -
	COMUNE DI NAVELLI	0	€ -	€ -	1	€ 6.718,19	€ -
	COMUNE DI CASTILENTI	0	€ -	€ -	1	€ 351.313,77	€ -
	COMUNE DI RAIANO	0	€ -	€ -	1	€ 452.418,87	€ -
	COMUNE DI SCAFA	0	€ -	€ -	1	€ 55.657,82	€ -
	COMUNE DI VITTORITO	1	€ 80.000,00	€ 80.000,00	0	€ -	€ -
	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI	0	€ -	€ -	2	€ 246.275,68	€ 246.275,68
	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	0	€ -	€ -	1	€ 27.412,01	€ 27.412,01
	TOTALE	**5**	**€ 4.160.718,11**	**€ 80.000,00**	**41**	**€ 12.636.213,55**	**€ 683.209,25**

Scuole inaugurate nel 2019

Comune di Avezzano - *Scuola elementare "M. Pomilio"* - Sostituzione edilizia con delocalizzazione

Comune di Magliano De Marsi - Scuola elementare e media - Sostituzione edilizia con delocalizzazione

Comune di Avezzano - Scuola materna in via De Gasperi – Sostituzione edilizia

L'U.S.R.C. ha contribuito a diffondere presso le amministrazioni competenti le **indicazioni dettate dalle Linee guida del MIUR**, attraverso incontri, materiale informativo. Le nuove scuole sono state progettate e realizzate con l'idea di rinnovare gli spazi dedicati alla didattica, pensati in maniera più fluida e flessibile, e con un nuovo rapporto con il territorio; la scuola, infatti, è concepita come «*centro civico*», luogo aperto al territorio e al servizio della comunità oltre gli orari scolastici, acquisendo una nuova identità.

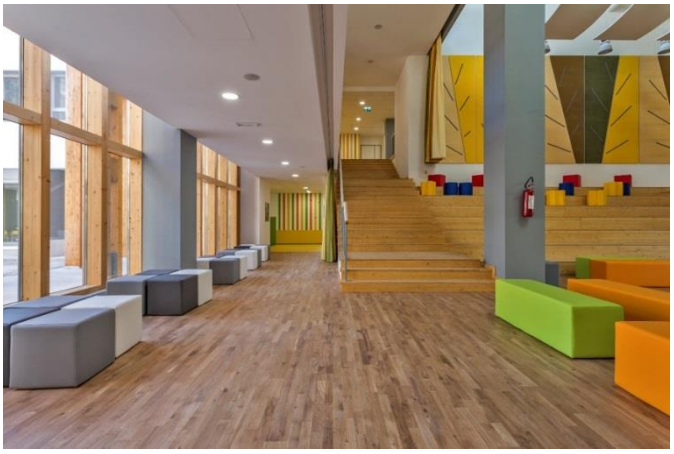

Agorà (spazio centrale) della nuova Scuola elementare di Celano

L'Ufficio ha inoltre provveduto alla copertura economica delle spese necessarie alla **sistemazione provvisoria degli studenti** (mediante affitto di strutture alternative, adeguamento di locali di proprietà dell'amministrazione, affitto di moduli prefabbricati…), necessaria a garantire la continuità didattica durante l'esecuzione degli interventi, ed ha definito i criteri di ripartizione delle somme disponibili alle singoli amministrazioni richiedenti, in funzione del numero degli alunni e dell'entità dei lavori da effettuare.

7 SVILUPPO DEL TERRITORIO

La L. 134/2012 individua tra le finalità della gestione ordinaria della ricostruzione quella di assicurare l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (art.67-ter, co.1) ed assegna all'USRC la competenza anche in ordine allo sviluppo dei territori (art.67-ter, co.2).

Allo scopo, **l'art. 11, co. 12, del D.L. n. 78/2015**, ha destinato una quota (**fino al 4%**) delle risorse finanziarie stanziate per la ricostruzione al **Programma di sviluppo RESTART**, predisposto della SMAPT – Struttura di Missione APT (ex DPCM 1 giugno 2014) ed approvato con **Delibera CIPE n. 49/2016**, con una dotazione finanziaria pari a **219,7 mln€**, per interventi da attuarsi nel territorio del Cratere sismico abruzzese. Tali risorse sono aggiuntive a quelle già assegnate allo sviluppo con **Delibera CIPE n. 135/2012**, pari a **100 mln€**.

Con successive **delibere CIPE n. 70/2017, 115/2017, 25/2018, 56/2018, 20/2019, 54/2019**, sono stati approvati ulteriori interventi del Programma di sviluppo RESTART ed assegnate ulteriori risorse per l'attuazione degli interventi.

Nella Tabella che segue è riportato lo stato di avanzamento del Programma per ciascuna delle Priorità o Ambiti tematici:

RIEPILOGO PROGRAMMA SVILUPPO (DELIBERA CIPE N. 49/2016 + DELIBERA CIPE N. 135/2012)

PRIORITA' - AMBITI TEMATICI RESTART	RIPARTO FINANZIARIO / DOTAZIONE PRIORITA'	INCIDENZA SUL TOTALE PROGRAMMA	TOTALE RISORSE APPROVATE	% RISORSE APPROVATE SU DOTAZIONE PRIORITA'	RISORSE RESIDUE	% RISORSE RESIDUE SU DOTAZIONE PRIORITA'
	mln€	%	mln€	%	mln€	%
A - Sistema imprenditoriale e produttivo	130,1	41%	89,2	69%	40,9	31%
B - Turismo e ambiente	80,3	25%	47,0	59%	33,3	41%
C - Cultura	14,8	6%	14,8	100%	0,0	0%
D - Alta formazione	21,8	4%	14,7	67%	7,1	33%
E - Ricerca e innovazione tecnologica	58,9	20%	53,8	78%	5,1	22%
F - Agenda digitale	9,4	2%	6,8	72%	2,6	28%
G- Governance, monitoraggio e valutazione del programma di Sviluppo	4,4	2%	4,4	100%	0,0	0%
TOTALE	319,7	100%	230,7	72%	89,0	28%

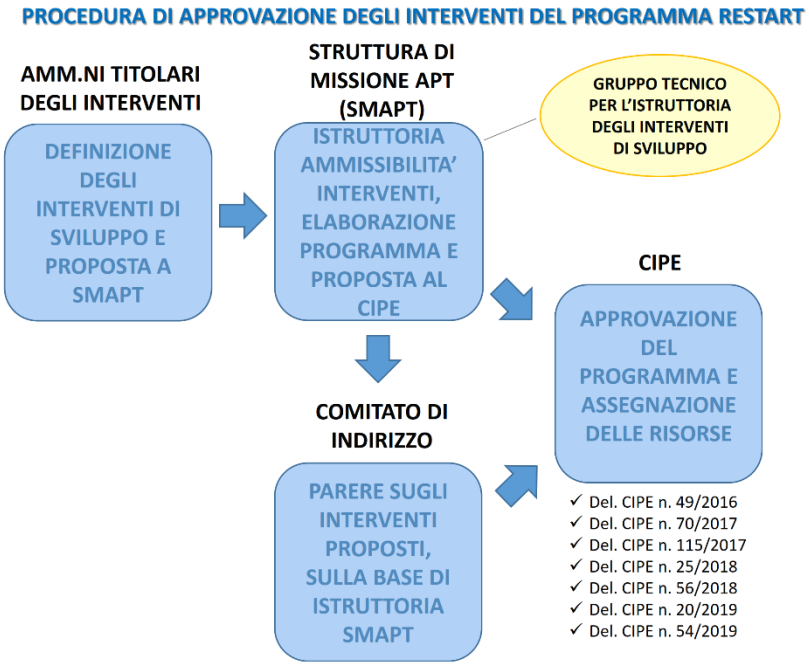

Nell'ambito della procedura di approvazione degli interventi del programma RESTART, l'USRC è componente del **Gruppo tecnico per l'istruttoria degli interventi di sviluppo**, competente alla valutazione delle proposte di intervento presentate dalle Amministrazioni Titolari, a supporto della SMAPT – Struttura di Missione APT (ex DPCM 1 giugno 2014), e fa parte del **Comitato di Indirizzo**, nella persona del Titolare.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, l'USRC è inoltre competente, in fase di attuazione del programma, al **trasferimento delle risorse destinate agli interventi di RESTART a titolarità dei Comuni del Cratere sismico**, ad esclusione di L'Aquila, previa istruttoria positiva da parte della SMAPT e trasferimento delle relative risorse da parte del MEF – Dipartimento del Tesoro.

Nel corso dell'anno 2019, l'USRC ha effettuato il trasferimento di risorse per un importo complessivo pari a **€ 191.275,44**, destinate ai seguenti interventi del Programma RESTART, entrambi ricadenti nella Priorità D – Alta formazione:

- ✓ *"Potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico"*, a titolarità del Comune di Scoppito;
- ✓ *"Wayne in Abruzzo"*, a titolarità del Comune di Gagliano Aterno.

Nel corso dell'anno 2019 l'USRC ha inoltre affiancato le attività condotte dai Comuni del Cratere e Formez PA (che fornisce assistenza tecnica alla SMAPT per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi del Programma di sviluppo) per la predisposizione, da parte delle Aree omogenee del Cratere, dei PIT – Progetti Integrati per il Turismo, a valere sulle risorse disponibili per la Priorità B – Turismo e Ambiente, per i quali è attualmente in corso di espletamento l'iter istruttorio propedeutico all'approvazione da parte del CIPE.

In tema di valorizzazione turistica del territorio, l'USRC, attraverso l'attivazione di n.2 stage curriculari nell'ambito del Master di II livello *"Gestione e valorizzazione dei centri storici minori, Ambiente Cultura e Territorio, azioni integrate"* con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ha realizzato un quadro di

area vasta delle risorse turistiche del territorio del Cratere, composto dall'analisi dei principali tematismi/valori e dalla sintesi degli stessi in una visione guida, da poter rendere disponibile ai Comuni del Cratere quale strumento a supporto delle decisioni e delle proposte di intervento in materia di sviluppo del territorio.

E' stata in ultimo resa disponibile una sezione del sito internet istituzionale dell'USRC contenente l'informativa in ordine allo stato di attuazione del Programma RESTART:
http://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/programma-di-sviluppo-restart

8 GESTIONE DELLA CONTABILITA' SPECIALE

L'USRC gestisce i movimenti contabili dalle previsioni di entrata/spesa alla registrazione contabile delle entrate ed uscite effettive, emettendo mandati di pagamento, registrando ordinativi di incasso ed ottemperando ai dettami della rendicontazione ex L. 1992, n. 225 e ss. mm.ii.

A far data dall'aprile 2013, sono stati eseguiti **n. 8543** mandati di pagamento per un totale **€ 1.079.252.172,82** (dato al **20/12/2019**).

Di questi, nel 2019 sono stati eseguiti **n° 1349** mandati di pagamento per complessivi **€ 269.679.959,27.**

Per il dettaglio si veda il sito http://www.usrc.it/ammtrasparente.aspx

Di seguito alcune delle principali attività di gestione fondi dell'USRC oltre quelli della ricostruzione privata, OOPP, ed edilizia scolastica:

A)SPESE OBBLIGATORIE

L'Area Amministrativo-Contabile dell'USRC esegue l'istruttoria delle rendicontazioni effettuate dai Comuni sul portale di interscambio AVEIANET dove gli stessi possono compilare le schede relative alle diverse tipologie di spesa (CAS, LOCAZIONE TEMPORANEA ALLOGGI, TRASLOCO E DPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO) al fine di richiedere il trasferimento dei fondi.

Nel 2019 è stato trasferito per le spese obbligatorie (contributo di autonoma sistemazione, locazione temporanea di alloggi ad uso abitativo, trasloco e deposito temporaneo del mobilio), in favore dei Comuni del Cratere e Fuori Cratere un importo totale pari ad euro **2.131.641,12** così suddiviso:

- **€ 1.503.419,52** per contributo di autonoma sistemazione;

- **€ 40.926,00** per locazione temporanea alloggi ad uso abitativo;
- **€ 587.295,60** per trasloco e deposito temporaneo del mobilio.

Si riportano gli importi del contributo di autonoma sistemazione erogati per le diverse annualità:

- Contributo di autonoma sistemazione – annualità 2014: € 5.000,00;
- Contributo di autonoma sistemazione – annualità 2015: € 12.000,00;
- Contributo di autonoma sistemazione – annualità 2016: € 112.757,32;
- Contributo di autonoma sistemazione – annualità 2017: € 275.860,93;
- Contributo di autonoma sistemazione – annualità 2018: € 1.097.801,27.

Si precisa che per l'annualità 2019 non è stato previsto il finanziamento del contributo di autonoma sistemazione.

Di seguito il dettaglio per singolo comune e annualità:

TABELLA 1 – CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE

IMPORTI EROGATI NELL'ANNO 2019						
SOGGETTO BENEFICIARIO	**annualità 2014**	**annualità 2015**	**annualità 2016**	**annualità 2017**	**annualità 2018**	**TOTALE**
COMUNE DI ACCIANO					€ 11.982,80	€ 11.982,80
COMUNE DI BASCIANO					€ 10.400,00	€ 10.400,00
COMUNE DI BELLANTE				€ 600,00	€ 7.200,00	€ 7.800,00
COMUNE DI BISENTI					€ 18.009,68	€ 18.009,68
COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO					€ 223.150,00	€ 223.150,00
COMUNE DI CAGNANO AMITERNO				€ 10.000,00		€ 10.000,00
COMUNE DI CANZANO				€ 2.400,00	€ 12.000,00	€ 14.400,00
COMUNE DI CAPESTRANO					€ 37.000,00	€ 37.000,00
COMUNE DI CAPORCIANO				€ 193,55	€ 4.773,33	€ 4.966,88
COMUNE DI CASTEL CASTAGNA	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 2.580,65			€ 19.580,65
COMUNE DI CASTEL DEL MONTE					€ 23.763,33	€ 23.763,33
COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA					€ 29.400,00	€ 29.400,00
COMUNE DI CELANO				€ 133.174,19		€ 133.174,19
COMUNE DI COLLEPIETRO				€ 6.000,00		€ 6.000,00
COMUNE DI CORFINIO				€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 14.400,00
COMUNE DI CUGNOLI					€ 7.133,33	€ 7.133,33
COMUNE DI GAGLIANO ATERNO			€ 2.200,00	€ 10.800,00	€ 1.533,33	€ 14.533,33
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA			€ 61.076,67	€ 45.822,35	€ 38.220,00	€ 145.119,02
COMUNE DI LORETO APRUTINO					€ 15.733,33	€ 15.733,33
COMUNE DI MANOPPELLO				€ 2.276,00	€ 14.161,66	€ 16.437,66
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO					€ 30.000,00	€ 30.000,00
COMUNE DI OCRE					€ 16.800,00	€ 16.800,00
COMUNE DI OFENA					€ 5.600,00	€ 5.600,00
COMUNE DI PIETRANICO					€ 12.100,00	€ 12.100,00
COMUNE DI POPOLI					€ 196.041,70	€ 196.041,70
COMUNE DI PRATOLA PELIGNA				€ 24.320,00	€ 52.100,00	€ 76.420,00
COMUNE DI PREZZA					€ 14.000,00	€ 14.000,00
COMUNE DI RAIANO				€ 19.074,84	€ 50.112,25	€ 69.187,09
COMUNE DI ROCCA DI MEZZO					€ 36.066,00	€ 36.066,00
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI					€ 3.200,00	€ 3.200,00
COMUNE DI SULMONA					€ 86.183,87	€ 86.183,87
COMUNE DI TERAMO					€ 24.000,00	€ 24.000,00
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA					€ 22.500,00	€ 22.500,00
COMUNE DI TORRE DE' PASSERI					€ 46.000,00	€ 46.000,00
COMUNE DI VITTORITO			€ 46.900,00	€ 14.000,00	€ 41.436,66	€ 102.336,66
TOTALE	**€ 5.000,00**	**€ 12.000,00**	**€ 112.757,32**	**€ 275.860,93**	**€ 1.097.801,27**	**€ 1.503.419,52**

TABELLA 2 – LOCAZIONE TEMPORANEA ALLOGGI AD USO ABITATIVO

IMPORTI EROGATI NELL'ANNO 2019			
SOGGETTO BENEFICIARIO	**annualità 2016**	**annualità 2017**	**TOTALE**
COMUNE DI CANZANO		€ 1.600,00	€ 1.600,00
COMUNE DI MANOPPELLO		€ 76,00	€ 76,00
COMUNE DI MONTEREALE		€ 4.800,00	€ 4.800,00
COMUNE DI OVINDOLI		€ 1.100,00	€ 1.100,00
COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO	€ 8.800,00		€ 8.800,00
COMUNE DI SULMONA	€ 2.350,00	€ 22.200,00	€ 24.550,00
TOTALE	**€ 11.150,00**	**€ 29.776,00**	**€ 40.926,00**

TABELLA 3 – TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO

IMPORTI EROGATI NELL'ANNO 2019						
SOGGETTO BENEFICIARIO	**annualità 2015**	**annualità 2016**	**annualità 2017**	**annualità 2018**	**annualità 2019**	**TOTALE**
COMUNE DI ACCIANO				€ 4.294,40	€ 2.000,00	€ 6.294,40
COMUNE DI BARISCIANO				€ 26.906,10	€ 11.559,60	€ 38.465,70
COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO			€ 1.571,00	€ 18.109,00		€ 19.680,00
COMUNE DI CAPESTRANO			€ 2.878,20	€ 23.110,20		€ 25.988,40
COMUNE DI CAPITIGNANO				€ 622,20		€ 622,20
COMUNE DI CAPORCIANO				€ 9.760,00		€ 9.760,00
COMUNE DI CASTEL DEL MONTE				€ 65.672,64	€ 15.115,80	€ 80.788,44
COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO				€ 2.500,00		€ 2.500,00
COMUNE DI FONTECCHIO				€ 1.220,00		€ 1.220,00
COMUNE DI FOSSA				€ 2.000,00		€ 2.000,00
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA					€ 5.000,00	€ 5.000,00
COMUNE DI LUCOLI	€ 2.941,06	€ 4.758,00	€ 37.891,49	€ 142.389,46		€ 187.980,01
COMUNE DI MANOPPELLO				€ 5.245,07		€ 5.245,07
COMUNE DI MONTEREALE				€ 15.663,77		€ 15.663,77
COMUNE DI NAVELLI				€ 5.551,00		€ 5.551,00
COMUNE DI OVINDOLI				€ 3.062,20		€ 3.062,20
COMUNE DI PIZZOLI				€ 5.787,50	€ 450,00	€ 6.237,50
COMUNE DI POGGIO PICENZE				€ 2.452,20	€ 951,60	€ 3.403,80
COMUNE DI POPOLI				€ 11.870,60		€ 11.870,60
COMUNE DI RAIANO				€ 7.196,00		€ 7.196,00
COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO			€ 13.001,40	€ 22.279,00		€ 35.280,40
COMUNE DI ROCCA DI MEZZO			€ 6.847,00	€ 26.451,01	€ 6.700,00	€ 39.998,01
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI				€ 20.253,60	€ 6.145,60	€ 26.399,20
COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE					€ 3.152,00	€ 3.152,00
COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO				€ 793,00	€ 427,00	€ 1.220,00
COMUNE DI SCOPPITO				€ 5.002,00		€ 5.002,00
COMUNE DI SULMONA		€ 15.128,00	€ 11.772,90	€ 4.514,00		€ 31.414,90
COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO				€ 1.800,00	€ 4.500,00	€ 6.300,00
TOTALE	**€ 2.941,06**	**€ 19.886,00**	**€ 73.961,99**	**€ 434.504,95**	**€ 56.001,60**	**€ 587.295,60**

B) co.co.co.

Nel 2019 è stato trasferito dall'USRC ai comuni del cratere, a seguito di n. 101 protocolli corrispondenti a richieste ed integrazioni, per i co.co.co. comuni del cratere ed in anticipazione per quelli fuori cratere € 1.477.779,33 ripartiti come segue:

- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2016 euro 15.000,00
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2017 euro 195.908,00
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2018 euro 721.553,00
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2019 euro 206.100,00
- co.co.co. UTR comuni fuori cratere – competenza anno 2018 euro 239.218,33

C) VIDEOSORVEGLIANZA

Nel 2019 sono stati erogati fondi per il finanziamento del "Safe Community – Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico" per un importo complessivo pari ad euro **425.462,66** come riportato in tabella:

SOGGETTO BENEFICIARIO	Importo	
COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	€	32.000,00
COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO	€	31.866,40
COMUNE DI SCOPPITO	€	31.840,00
COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	€	30.960,00
COMUNE DI TOSSICIA	€	28.972,00
COMUNE DI BRITTOLI	€	16.235,76
COMUNE DI TORNIMPARTE	€	32.000,00
COMUNE DI POPOLI	€	6.667,00
COMUNE DI TORRE DE' PASSERI	€	7.800,00
COMUNE DI MONTEREALE	€	32.000,00
COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO	€	7.966,60
COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	€	7.767,47
COMUNE DI PIZZOLI	€	7.998,32
COMUNE DI COLLEDARA	€	38.878,90
COMUNE DI CASTELLI	€	32.000,00
COMUNE DI OVINDOLI	€	34.400,00
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	€	32.000,00
COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	€	7.553,01
COMUNE DI CUGNOLI	€	6.557,20
TOTALE	**€**	**425.462,66**
